

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 3****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	16	de	Marzo	de	2022
--------	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONVENIO Y/O CONTRATO número:	2276 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2021
Objeto del CONVENIO:	“CONTRATAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO MONTECARLO EN ELMUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO TOLIMA”.
Interventor:	N/A
Supervisor:	ING. YESID ESTEBAN DUARTE MESA
Valor inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO:	CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 52.153.927,17)
CONTRATISTA:	CONSORCIO P&O 2021 RL- SANTIAGO PERDOMO OZUNA C.C. 1.110.579.524
Duración inicial del CONTRATO:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
Duración Total del CONTRATO:	CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO, SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA DEL 03 DE MARZO DE 2022
Fecha de Legalización:	05 de enero del 2022
Acta de Inicio:	18 de febrero del 2022
Modificatoria N° 1	03 de marzo del 2022
Estado actual contrato	Finalizado – En liquidación
CDP Inicial N°:	4996 del 21 de diciembre del 2021
RP Inicial N°:	14638 del 29 de diciembre del 2021

A. ESTADO A LA FECHA: A LA FECHA ESTA TERMINADO.

B. META A IMPACTAR: CP2MP13 “Escenarios Construidos y/o mejorados para la integración social, la recreación y el deporte”

C. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL:

- La fecha de inicio del Contrato es el día 18 de febrero del 2022.
- No se ha realizado ningún desembolso, en revisión el acta de recibo para proceder a liquidar.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN



D. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- El mejoramiento del salón comunal se ha realizado el 100% Mejoramiento de baños, cambio de piso 1 y 2 piso, manteniendo de fachada, realización de cocina y cubierta.

E. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

<u>% EJECUCION:</u>	<u>100%</u>
----------------------------	--------------------

F. REGISTRO FOTOGRAFICO:

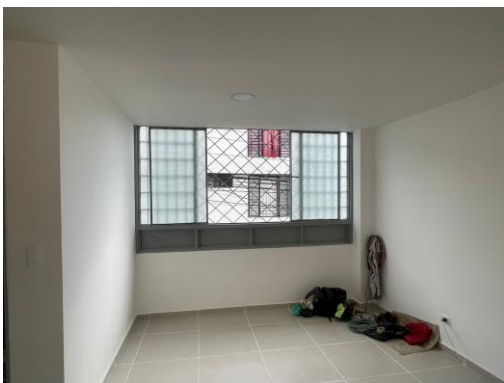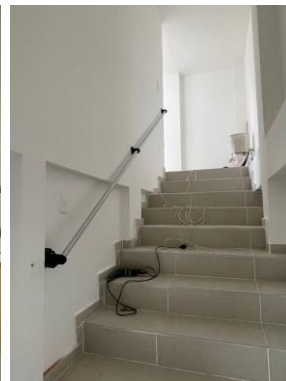



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN

El presente informe se emite el día 16 de marzo de 2022 para detallar el impacto de metas del CONTRATO N° 2276 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.


ING. YESID ESTEBAN DUARTE MESA
Supervisor - Director de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y Hábitat


ARQ. DIANA MARIA GUERRERO CAMACHO
Apoyo a la Supervisión - Dirección de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
