

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 7****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	16	de	Noviembre	de	2022
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
CONVENIO Y/O CONTRATO número:	1772 DEL 26 DE AGOSTO DE 2021
Objeto del CONVENIO: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE GUAMO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO “REMODELACIÓN DEL PARQUE SIMÓN BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE GUAMO-TOLIMA”	
Interventor:	CONSORCIO CONSULTORES E INTERVENTORES CONSTRU&NGENIERIA
Supervisor:	ING. DAIRO MAURICIO GÓMEZ FLORIAN
Valor inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO:	\$ 1.726.891.514 - MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE, distribuidos de la siguiente manera: La Gobernación del Tolima aportará la suma de: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$ 1.449.725.426) M/CTE y el Municipio de Guamo aportará la suma de: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 277.166.088) M/CTE.
Valor Adición:	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 345.585.304) M/CT distribuidos de la siguiente manera: La Gobernación del Tolima aportará la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS (\$ 293.747.508) y el Municipio de Guamo aportará la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$51.837.796) M/CTE
Valor Final del CONVENIO Y/O CONTRATO:	DOS MIL SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 2.072.476.818), distribuidos de la siguiente manera: La Gobernación del Tolima aportará la suma de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$ 1.743.472.934) y el Municipio de Guamo aportará la suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$329.003.884) M/CTE.
COOPERANTE:	MUNICIPIO DE GUAMO - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Duración inicial del CONVENIO Y/O CONTRATO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO	
Duración Total del CONVENIO Y/O CONTRATO: TRESCIENTOS DIECISEIS (316) DÍAS CALENDARIO, SEGÚN ACTA DE PRORROGA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
Fecha de Legalización:	06 de Septiembre de 2021
Acta de Inicio:	06 de Septiembre de 2021
Suspensión N° 1	29 de Diciembre de 2021



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN

Reinicio N° 1	25 de Abril de 2022
Prórroga N° 1	27 de Abril de 2022
Adición N° 1	01 de Junio de 2022
Prórroga N° 2	09 de Septiembre de 2022
Estado actual contrato	Terminado
CDP Inicial N°:	3548 del 18 de Agosto de 2021
RP Inicial N°:	9226 del 27 de Agosto de 2021
CDP Adición 2022 N°:	2979 y 2980 del 03 de Mayo de 2022
RP Adición 2022 N°:	5962 y 5969 del 13 de Junio de 2022

A. ESTADO A LA FECHA: *EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA TERMINADO.*

B. META A IMPACTAR: CP2MP13 “Escenarios construidos y/o mejorados para la integración social, la recreación y el deporte.”

C. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL:

1. Se perfeccionó el convenio con fecha 06 de septiembre de 2021.
2. La fecha de inicio del Convenio fue el día 06 de septiembre del 2021.
3. Se adjudicó el contrato de obra por medio de proceso licitatorio de selección objetiva por parte del municipio del Guamo adjudicando el contrato al Consorcio Parque Bolívar IC de fecha 30 de septiembre de 2021.
4. Se realizó el proceso de legalización del contrato de obra y se esperó el tiempo de la adjudicación de la interventoría.
5. Se realizó la legalización del contrato de interventoría de fecha 20 de noviembre de 2021.
6. Se realizó acta de inicio de obra e interventoría de fecha 22 de noviembre de 2021.
7. Se ha realizado el desembolso del 50% de los aportes iniciales de la Gobernación del Tolima por un valor de \$ 724.862.713.
8. Se realizó suspensión de fecha 29 de diciembre de 2021 de acuerdo a solicitud presentada por el municipio referente a la realización de unos ajustes técnicos requeridos.
9. Se hace acta de reinicio de fecha 25 de abril de 2022 dado a que se superaron las causas que generaron la suspensión y el municipio informó las modificaciones mediante acta de comité 3 y posterior balance de mayores y menor cantidades e ítems no previstos mediante acta modificatoria N°2.
10. Se realizó prórroga N° 1 por un plazo de 136 días calendario de fecha 27 de abril de 2022 para un total de 256 días calendario.
11. Se realizó adición en valor al convenio de fecha 01 de junio de 2022 por valor de \$ 345.585.304 en donde la Gobernación aportó \$ 293.747.508 y el municipio del Guamo \$ 51.837.796.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN

12. Se realizó prórroga N° 2 por un plazo de 60 días calendario de fecha 09 de septiembre de 2022 para un total de 316 días calendario.

13. Se da por terminada la ejecución del convenio mediante acta de terminación de fecha 15 de noviembre de 2022, pendiente de que el municipio allegue toda la documentación respectiva para la liquidación del mismo.

D. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

- Se ha ejecutado la remodelación del parque principal.

E. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

<u>% EJECUCION:</u>	<u>100 %</u>
---------------------	--------------

F. REGISTRO FOTOGRAFICO:







GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN

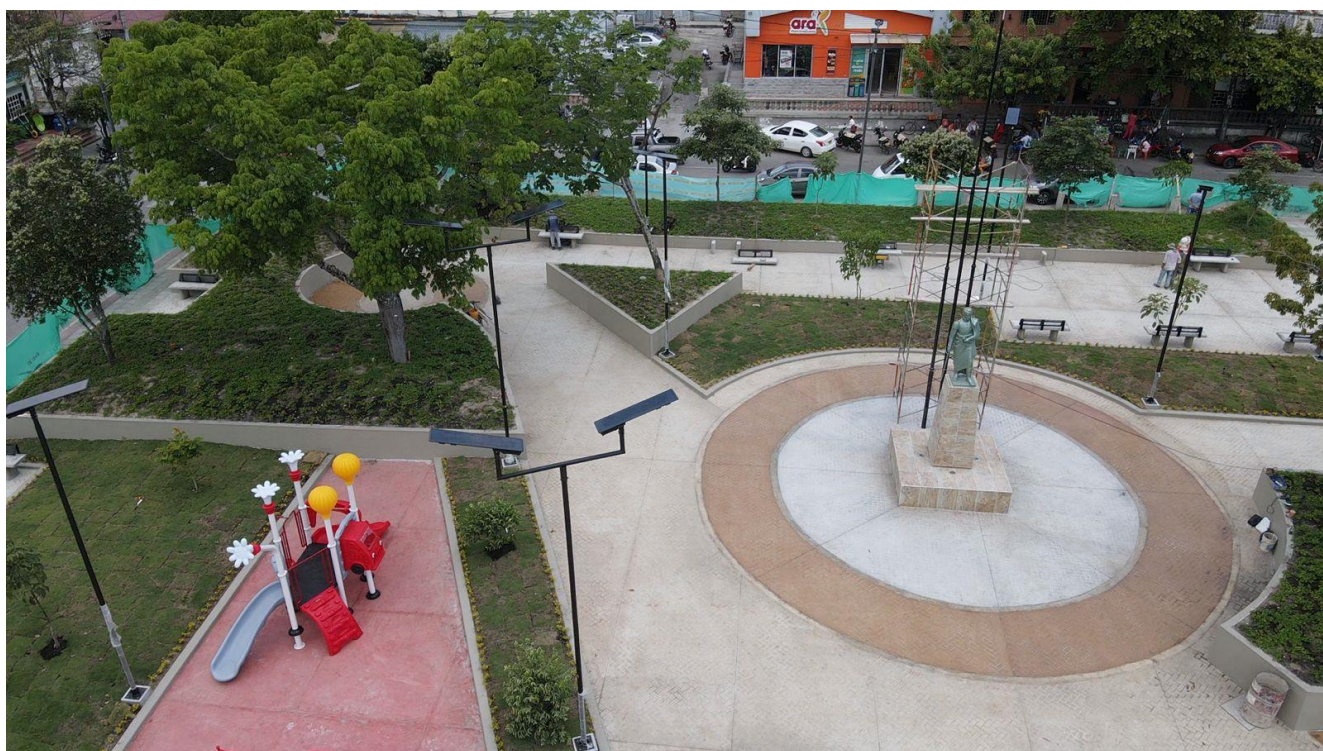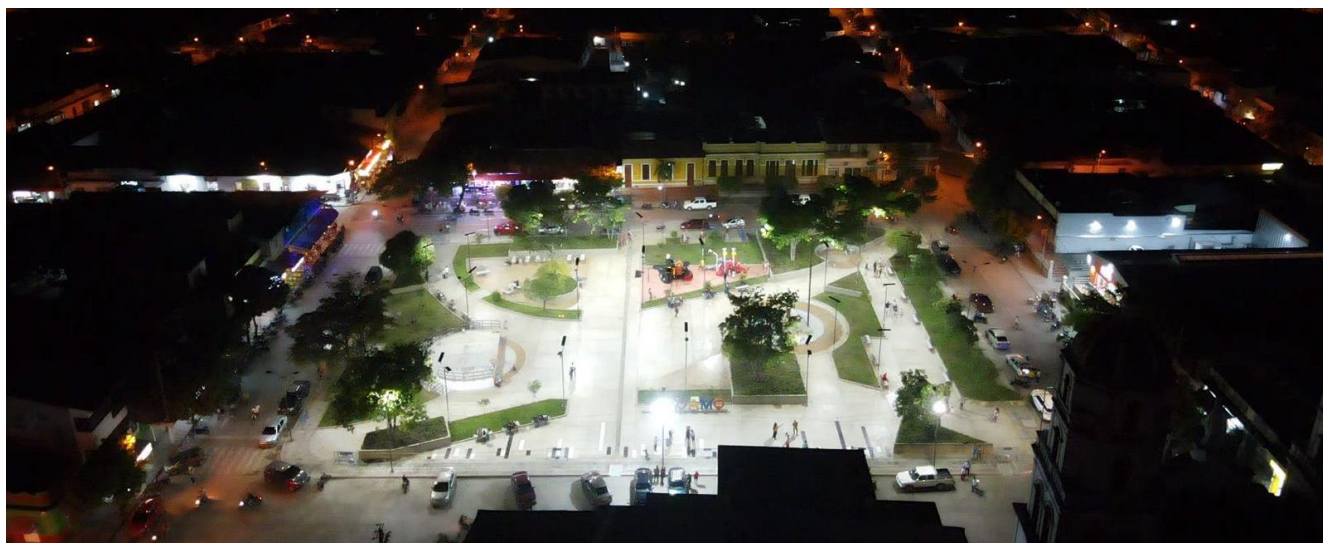




GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 5 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN

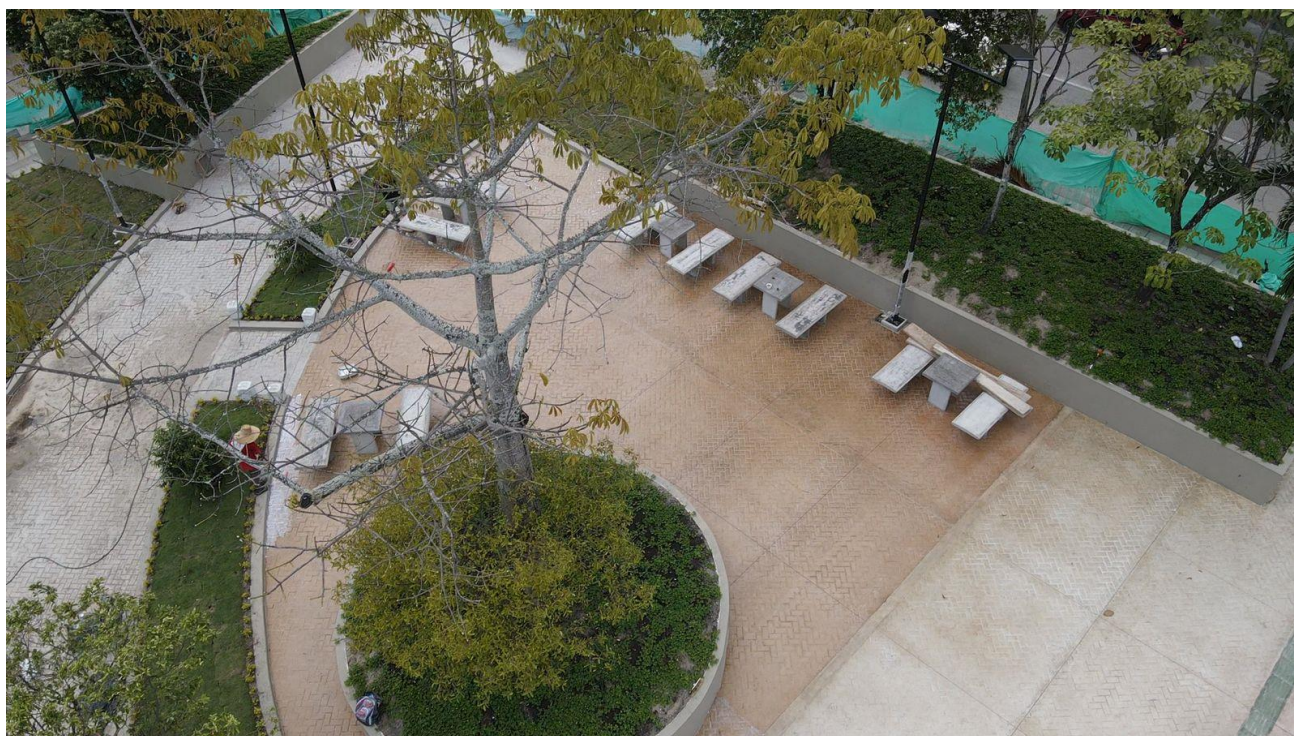



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 7

INFORME DE SUPERVISIÓN



El presente informe se emite el día 16 de noviembre de 2022 para detallar el impacto de metas del CONVENIO N° 1772 DEL 26 DE AGOSTO DE 2021.

ING. DAIRO MAURICIO GÓMEZ FLORIAN
Supervisor - Director de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y Hábitat

ARQ. CRISTIAN CAMILO PICÓN GUERRA
Apoyo a la Supervisión - Dirección de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
