

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 1 de 5
	INFORME DEL PROCESO	

Fecha	26	de	noviembre	de	2024
--------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Tipo de contrato	CONTRATO DE OBRA
Numero	3123 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
Contratante	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Contratista	CONSORCIO ARADO 2023
Objeto	CONTRATAR LA REMODELACIÓN, ADECUACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO EL ARADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Plazo inicial del contrato:	60 DÍAS CALENDARIO
Prórrogas o adiciones:	30 DÍAS CALENDARIO
Plazo total del contrato, incluidas las adiciones	90 DÍAS CALENDARIO
Días ejecutados:	90 DÍAS CALENDARIO
Valor inicial del convenio:	\$ 676.370.590
Valor Adiciones:	\$ 104.034.542,36
Valor final del contrato:	\$ 780.405.132,36
Fecha de legalización	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de iniciación	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
Acta de Suspensión 1	29 DE DICIEMBRE DE 2023
Acta de Prorroga a la Suspensión 1	22 DE ENERO DE 2024
Acta de Reinicio 1	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de terminación	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
Estado actual contrato	TERMINADO
Ejecución física	100 %

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA		
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		Pág. 2 de 5
	INFORME DEL PROCESO		

El presente informe del proceso tiene como finalidad realizar un resumen de la trazabilidad del contrato mencionado además de informar que el mismo cumplió satisfactoriamente con su ejecución y se encuentra en estado Terminado al 100% como se evidencia en el registro fotográfico adjunto a continuación:



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 3 de 5
	INFORME DEL PROCESO	

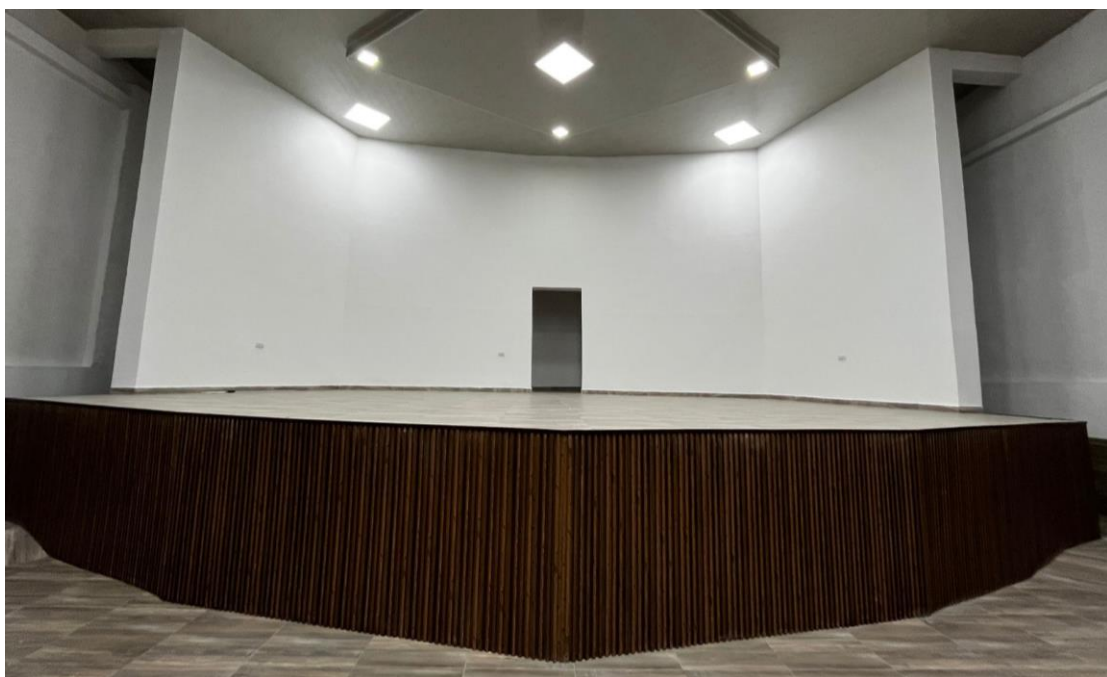




GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 5

INFORME DEL PROCESO

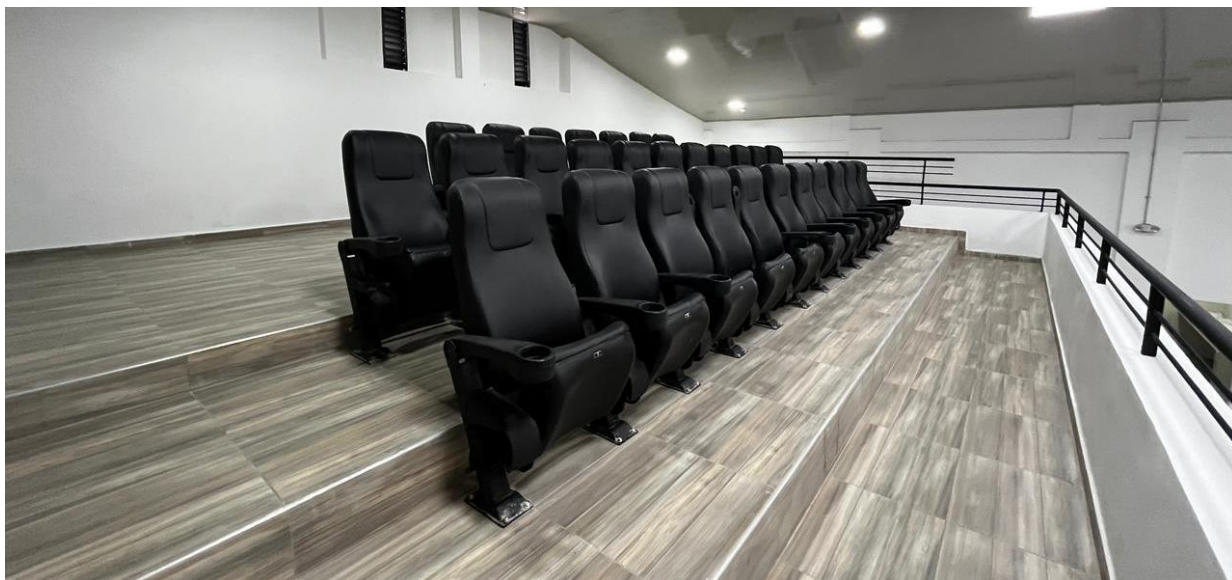

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 5 de 5
	INFORME DEL PROCESO	



Firma 

Nombre JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
