

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	
Código de la meta:	P1S19MP37
Nombre de la meta:	Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima
Indicador de producto:	Número de hospitales construidos
Tipo de Indicador:	Acumulado
Meta del Cuatrienio:	3

B. Información Específica de la Meta

META PROGRAMADA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
0.8	0.6	0.2	0.8

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (18/06/2026) (Corresponde al momento en el que se diligencia el formato único de cargue)

Periodo de Reporte: (Enero - Junio)

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	
CONTRATO / CONVENIO	x
ACTA	
INFORME	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	Evidencia Fotográfica

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	110763
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	83.956
	RURAL	20.989
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	7.189
	(6 – 11 AÑOS)	7.380
	(12-17 AÑOS)	15.714
	(18 A 28 AÑOS)	20.680
	(29 A 59 AÑOS)	41.062
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	12.920
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR FEMENINA	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO Y REINCORPORADOS	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: Fortalecimiento de la red de prestación de servicios y atención primaria en salud en el departamento del Tolima BPIN 20250000035817.
2.	Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la dependencia, no recursos de inversión. Cofinanciar y fortalecer la red pública del Departamento en Proyectos de Dotación biomédica, equipos industriales, ambulancias (TAB, TAM, Unidades Medico Odontológicas y tecnología de la Información y comunicación. Apoyo y fortalecimiento a los hospitales, HOSPITAL CENTRO ESE DE PLANADAS TOLIMA La inversión en este programa para la construcción y dotación del nuevo Hospital

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	Centro E.S.E del municipio de planadas- Tolima. Con un valor de inversión 38.978.851.714 en base a la resolución número 2278 del 2023 “mejoramiento de la capacidad instalada asociada a la prestación de servicios de salud nacional” con un valor de anticipo de obra 40% \$ 14.432. 909.218 CONTRATO No. 338 DEL 23 DE JULIO DE 2024 OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. CONTRATO No. 395 DEL 03 DE AGOSTO DE 2024 OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Se realiza seguimiento y asistencia técnica para su ejecución a la fecha del 10 de junio del 2026. En base al último comité técnico, y al corte del 7 de junio, se tiene un porcentaje de programación en obra de 56.22% contra un porcentaje de ejecución en obra del 52.90%, las actividades en que se está reflejando este porcentaje de atrasos son en el bloque 1 o fase 1, en el capítulo de mampostería, todavía se tiene un porcentaje atrasado, ese capítulo ya está programado al 100%, sin embargo, están todavía por terminar unos dinteles y unos metros lineales de mampostería en el bloque 1. Se tiene porcentaje de atraso en pisos y bases, pisos y acabados, igual se tiene ejecución, sin embargo, la programación continúa por encima y el atraso significativo en la red de climatización, red eléctrica en la parte de acometida, transferencias. En el bloque 2 se está generando un atraso en la mampostería. HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA ESE DE CHAPARRAL TOLIMA El proyecto para la construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista ESE de Chaparral, Tolima, se encuentra actualmente en fase de ejecución bajo la supervisión de la Secretaría de Salud del Tolima como entidad ejecutora. Para el desarrollo del proyecto se suscribieron los respectivos contratos de obra e interventoría. CONTRATOP 2631 DE 2025 “CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA CÓDIGO 2022000060023” CON VALOR DE \$ 82.725.665.350,17 Y CON ACTA DE INICIO DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2025 Y TIEMPO DE EJECUCION DE 24 MESES CONTRAT 3301 DEL 2025 “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA, CÓDIGO BPIN 2022000060023” CON UN VALOR DE \$ 4.488.896.730,40 Y CON ACTA DE INICIO DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2025 Y TIEMPO DE EJECUCION DE 24 MESES

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	Durante el mes de mayo, las actividades correspondientes presentaron un avance superior a lo programado, alcanzando un avance físico acumulado del 27.14% frente a un programado del 25.04%, equivalente a una inversión ejecutada acumulada de \$ 22,455,022,835.49. Las actividades fundamentales de este periodo — Suministro e instalación de estructura, acero de refuerzo y mampostería — se han desarrollado de manera continua, permitiendo habilitar progresivamente los frentes necesarios para el avance estructural. Durante este periodo se consolidaron actividades fundamentales como la construcción vigas y columnas estructurales y fundiciones de placa aligerada. En términos generales, el proyecto mantiene un comportamiento acorde con la programación establecida en el cronograma contractual, sin evidenciar atrasos significativos en las actividades que hacen parte de la ruta crítica. El desarrollo simultáneo de diferentes frentes de trabajo ha permitido optimizar los tiempos de ejecución y garantizar la continuidad del proceso constructivo. HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO – TOLIMA CONTRATO DE OBRA 071 DEL 17 DE ABRIL DE 2026 Y ACTA DE INICIO DEL 12 DE JUNIO DE 2026 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO – TOLIMA POR FASES. RIOBLANCO. CONTRATO DE INTERVENTORIA 067 DEL 10 DE ABRIL DE 2026 Y ACTA DE INICIO 12 DE JUNIO DE 2026 CONSTRUCCIÓN DE NUEVO HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO – TOLIMA POR FASES. RIOBLANCO. Durante el último corte de obra, las actividades correspondientes presentaron un avance superior a lo programado, alcanzando un avance físico acumulado del 3.0 % frente a un programado del 3.0 %. Las actividades fundamentales de este corte, fueron el replanteo topográfico y nivelación del terreno, mediante equipos de precisión debidamente calibrados, permitiendo materializar en campo los ejes de referencia del proyecto. definir alineamientos, cotas y localización exacta de los elementos estructurales contemplados en los diseños. La interventoría constató la correcta implantación de los ejes de control, condición indispensable para garantizar la precisión geométrica de las obras futuras y minimizar desviaciones constructivas. Finalmente, se adelantaron las actividades preliminares para la construcción de los muros de contención contemplados en el proyecto, incluyendo excavaciones de conformación, definición de alineamientos, verificación de niveles y preparación de las áreas destinadas a la cimentación de dichas estructuras con el respectivo retiro de material local. Estas obras resultan fundamentales para garantizar la estabilidad

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
	geotécnica del terreno intervenido, controlar empujes laterales del suelo y asegurar las condiciones de seguridad y durabilidad requeridas para la infraestructura hospitalaria.

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Planadas	CONSTRUCCION	\$ 38.978.851.714
chaparral	CONSTRUCCION	\$ 82.725.665.350,17
Rio blanco	CONSTRUCCION	\$ 25.395.049.087
TOTAL EJECUTADO		\$ 147.099.566.151

*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

EVIDENCIAS: Numero de proceso en el SECOP

MUNICIPIO	NUMERO DEL PROCESO
Planadas	IP001-2024- IP003-2024
chaparral	LPO-026-2025
Rio blanco	CP 009 -2026


MUNICIPIO	URLProceso
Planadas	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6100525&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6349891&isFromPublicArea=True&isModal=False
chaparral	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8135097&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Rio blanco	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10074550&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Se deben adjuntar las **evidencias** que respaldan las actividades reportadas. Estos archivos son

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 6 de 9
FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA			Vigente desde: 08/04/2026

el soporte técnico que demuestra el cumplimiento físico de la meta de producto.

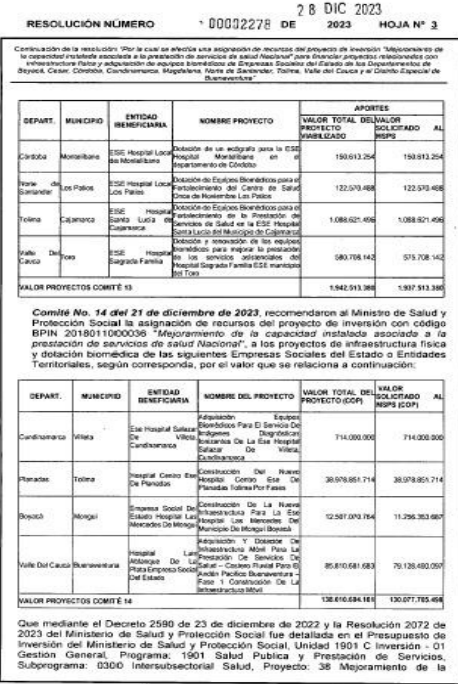 Ilustración 1. Resolución de asignación de recursos 2278	 Ilustración 2. Resolución de asignación de recursos 2278

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 7 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



ACTA DE REUNIÓN

Comité de Obra



Tema o Asunto:

CONTRATO DE OBRA N° 369 de 2024

Acta Numero:

79

Fecha:

Junio 10 de 2026

Hora:

8:00 a.m.

Lugar:

Virtual

Nombre y cargo de quien organiza la reunión:

CONSORCIO INTERPLANADAS – Arq. Marcela Acosta directora de interventoría

Asistidos en:

CONSORCIO INTERPLANADAS

1. ORDEN DEL DIA

1. Lectura Acta anterior

2. Revisión de aspectos técnicos

3. Varios

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Asociaciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, cumplido, No cumplido)
Entrega programaciones semanales, envío link Inq. Rios para la próxima reunión	CONSORCIO HOSPITALARIO 2024 CONSORCIO INTERPLANADAS	Todos los sábados	CUMPLIDO EN EJECUCIÓN
Intervención pisos urgentes (CEAT)	HOSPITAL CENTRO PLANADAS	Pendiente	Coordinación con el Inq. Rios
Revisión programación compras y suministros	CONSORCIO HOSPITALARIO 2024 CONSORCIO INTERPLANADAS	Todos los sábados	CUMPLIDO EN EJECUCIÓN
Balance presupuestal con inclusión de NP's	CONSORCIO HOSPITALARIO 2024 CONSORCIO INTERPLANADAS	Se continúa revisando	EN EJECUCIÓN
Complementación información ventaneria y puertas, incluida fachada en vidrio	CONSORCIO HOSPITALARIO 2024 CONSORCIO INTERPLANADAS	01-06-2026 06-06-2026	EN EJECUCIÓN
Respuesta oficio interventoría sobre costos de la subestación eléctrica de acuerdo con reunión de especialistas	CONSORCIO HOSPITALARIO 2024 CONSORCIO INTERPLANADAS	09-06-2026	INCUMPLIDO
Mesa de trabajo especialista HVAC	CONSORCIO HOSPITALARIO 2024 CONSORCIO INTERPLANADAS	09-06-2026 13-06-2026	En ejecución
Documentación equipos especiales y biomédicos	HOSPITAL CENTRO PLANADAS	Por definir	

2.2 Desarrollo de la reunión

Se da inicio al comité de obra siendo las 8:01 am.

Acta de Comité No. 33

Pág. 4 de 7



ACTA DE REUNIÓN

Comité de Obra



La arquitecta Marcela Acosta, directora de interventoría, expresa que el acta de comité de obra No. 78 fue enviado para revisión y al no tener observaciones se da por aprobada.

Se inicia con la revisión de los compromisos adquiridos en el comité anterior en lo referente a la entrega de las programaciones semanales y envío de link al Inq. Rios, se realizó la reunión el sábado a las 10:00 am con la presencia del Inq. Rios.

Con relación al segundo compromiso la intervención pisos urgentes, todavía no se ha podido coordinar con el Inq. Rios para esta intervención.

El siguiente compromiso se refiere a la revisión de la programación de compras y suministros, explica la Arq. Marcela que se va revisando todos los sábados con la programación semanal.

El compromiso relacionado con la presentación del balance presupuestal con inclusión de NP's comenta la Arq. Marcela que, se continúa revisando, como ya se ha explicado, el ajuste del sistema HVAC pesa en el balance, se está a la espera de la reunión entre los especialistas del constructor e interventoría, no se ha podido coordinar el día.

El siguiente compromiso hace referencia a la complementación información ventaneria y puertas incluida la fachada de vidrio, la Arq. Marcela comenta que, se han realizado mesas de trabajo, pero todavía falta la entrega por parte del constructor de la última información sobre ventaneria.

Se continúa con el compromiso de la respuesta al oficio de la interventoría sobre costos de la subestación eléctrica de acuerdo con reunión de especialistas, el compromiso era para el día de ayer y no se cumplió.

El siguiente compromiso se refiere a mesa de trabajo especialista HVAC, como se informó antes, se está a la espera de la coordinación de esta mesa entre los especialistas del constructor e interventoría.

El último compromiso se refiere a la entrega de la documentación de equipos especiales y biomédicos por parte de la entidad, está por definir esta fecha de entrega. Preguntó la Arq. Marcela si se tienen comentarios u observaciones sobre los compromisos, interviene el Arq. Luis Carlos, ellos tienen una observación con respecto al tema de la subestación eléctrica de los costos y le dice que para poder terminar los mismos están pendientes de la respuesta respecto al tema de la factibilidad con el punto de conexión porque difiere la factibilidad que se expidió a lo que se necesita en terreno, entonces requieren la respuesta a la comunicación, la Arq. Marcela le pregunta si se refiere a lo del poste, a lo cual el Arq. Luis Carlos responde que sí, y eso les cambia, obviamente, porque todos los costos vienen desde allá desde el principio. La Arq. Marcela comenta que próximamente luego del comité tiene una reunión con el especialista de la interventoría, el Inq. Jesús para tocar ese tema y dar respuesta.

Se continúa con el control de programación, la Arq. Marcela le da la palabra a la Inq. Alejandra, quien presenta el control de programación, la Inq. Alejandra toma la palabra comentando que con la fecha de corte del 7 de junio correspondiente a la semana que terminó, interviene el Inq. Rios solicitando ver la desviación en días que se presenta, la Inq. Alejandra le responde que son 12.13 días, continúa la Inq. Alejandra, se tiene un porcentaje de programación en obra de 56.22% contra un porcentaje de ejecución en obra del 62.50%, las actividades en que se está reflejando este porcentaje de atraso son en el bloque 1 o fase 1, en el capítulo de mampostería, todavía se tiene un porcentaje atrasado, ese capítulo va está preparado al 100%, sin embargo, están todavía por terminar unos detalles y unos metros lineales de mampostería en el bloque 1. Se tiene porcentaje de atraso en pisos y bases, pisos y acabados, igual se tiene ejecución, sin embargo, la programación continúa por encima y el atraso significativo en la red de climatización, red eléctrica en la parte de acometida, transferencias. En el bloque 2 se está generando un atraso en la mampostería.

Acta de Comité No. 33

Pág. 3 de 7

Ilustración 3. Acta número 79 de comité

Ilustración 4. Acta número 79 de comité



Ilustración 5. Avance de obra planadas



Ilustración 6 Avance de obra planadas

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 8 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



Ilustración 7. Avance de obra planadas

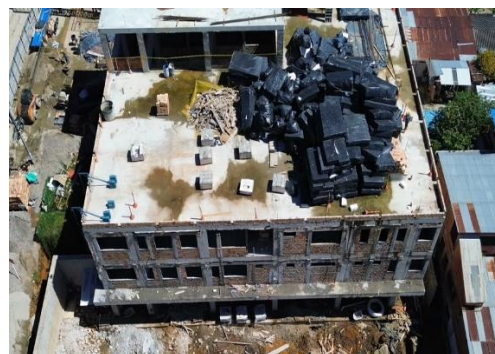


Ilustración 8. Avance de obra planadas



Ilustración 9. Avance de obra chaparral



Ilustración 10. Avance de obra chaparral

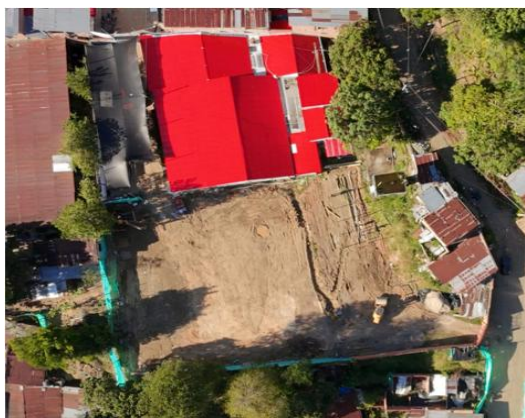


Ilustración 11. Avance de obra rioblanco




Ilustración 12. Avance de obra rioblanco

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 9 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Cordialmente,



Directora Desarrollo de Servicios y Calidad de la Prestación

Elaborado: Gabriel Fernandez – Leonardo Perdomo

Revisado y Reportado por: Miguel Muñoz

Cargado por: Miguel Muñoz

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02
