

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 1 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

GRADO DE RESPONSABILIDAD	
Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.	

Fecha:	12	de	DICIEMBRE	de	2019
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
CONVENIO número:	2119 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017
Objeto del CONVENIO: “CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADOR DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA S.A E.S.P LA CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA LA ITALIA DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”	
Interventor:	N/A
Supervisor:	SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS Delegada Mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019
Valor inicial del CONVENIO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS (\$396.951.087.00)
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P
Duración inicial del CONVENIO: CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO	
CDP N° :	4602, 4603, 4604 Y 4605 del 21 de septiembre de 2017
RP N°:	9823, 9824, 9827 y 9829 del 10 de Noviembre de 2017
Fecha de Legalización:	14 de noviembre del 2017
Acta de Inicio:	04 de diciembre de 2017
Fecha de Terminación inicial:	22 de enero de 2018

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

Acta de Suspensión N° 01:	21 de diciembre de 2017
Acta de Reinicio N° 01:	14 de febrero de 2018
Acta de Suspensión N° 02:	14 de febrero de 2018
Acta de Reinicio N° 02:	02 de mayo de 2018
Acta de Suspensión N° 03:	17 de mayo de 2018
Acta de Reinicio N° 03:	26 de diciembre de 2018
Acta de Suspensión N° 04:	10 de enero de 2019
Acta de Reinicio N° 04:	15 de octubre de 2019
Fecha de Terminación:	17 de octubre de 2019

A. ESTADO A LA FECHA: TERMINADO

se suscribe acta de terminación una vez agotado el plazo contractual, para iniciar trámite de recibo final y liquidación del contrato

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL (Documentos en la carpeta de supervisor):

1. El día 09 de Noviembre de 2017, se celebra contrato interadministrativo N° 2119 entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y el contratista, la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A. E.S.P, quienes firman son ANDRES FABIAN HURTADO Secretaria de Infraestructura y Hábitat- Ordenador del Gasto – Ejecutor, LUIS ARTURO ORTIZ LUNA Supervisor y JOSE ADRIAN MONROY TAFUR Gerente General EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
2. De conformidad con la Cláusula Decima Segunda-SUPERVISIÓN del contrato, se asignó como supervisor al profesional LUIS ARTURO ORTIZ, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.
3. Las Pólizas 17 GU045406 fue expedida el día 09 de noviembre de 2017.
4. El Registro Presupuestal N° 9823, 9244, 9827 y 9829 fueron expedidos el 10 de noviembre de 2017.
5. Que el certificado de legalización expedido por la Dirección de Contratación tiene como fecha de legalización el día 14 de noviembre de 2017.
6. Se suscribe Acta de inicio, de fecha 04 de diciembre de 2017, entre EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P., a partir

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 3 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

de la fecha, quedando como fecha de terminación 22 de enero de 2018. Se actualizan las pólizas, incluido el Acta de Inicio.

7. Mediante oficio del 06 de diciembre de 2017, se remite a la dirección de contratación, con asunto: documentos para segundo pago anticipado del contrato 2119 de 2017. Anexo lo siguiente: informe de supervisión, seguridad social y parafiscal, factura, certificado cuenta bancaria, RUT.
8. Se suscribe acta de Suspensión N°1 de fecha 21 de diciembre de 2017, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
9. Mediante resolución N° 00033 del 01 de febrero de 2018, se resuelve reasignar como supervisor del convenio N° 1064 de 2014, al Administrador Público LUIS ARTURO ORTIZ LUNA.
10. Se suscribe Acta de Reinicio N°1, de fecha 14 de febrero de 2018, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P, por motivo de que el cooperante solicita el reinicio del contrato 2119 de 2017, mediante oficio del 14/02/2018.
11. Se suscribe Acta de Suspensión N°2, de fecha 14 de febrero de 2018, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P, por motivo de que el cooperante solicita suspensión del contrato 2119 de 2017, mediante oficio del 14/02/2018.
12. Se suscribe Acta de Reinicio N°2, de fecha 2 de mayo de 2018, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P., por motivo de que el cooperante solicita el reinicio del contrato 2119 de 2017, mediante oficio del 2/05/2018.
13. Se suscribe Acta de Suspensión N°3, de fecha 17 de mayo de 2018, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P., por motivo de que el cooperante solicita suspensión del contrato 2119 de 2017, mediante oficio del 17/05/2018.
14. Mediante oficio del 07 de junio de 2018, se remite a la dirección de contratación, con asunto: documentos para segundo pago anticipado del contrato 2119 de 2017. Anexo lo siguiente: informe de supervisión, seguridad social y parafiscal, factura, certificado cuenta bancaria, RUT, pólizas actualizadas, informe de avance de obra.
15. Mediante Resolución N°00257 del 01/08/2018, se designó como supervisor del convenio al profesional, LUIS ARTURO ORTIZ LUNA.
16. Se suscribe Acta de Reinicio N°3, de fecha 26 de diciembre de 2018, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P., por motivo de que el cooperante solicita el reinicio del contrato 2119 de 2017, mediante oficio del 20/12/2018.
17. Se suscribe Acta de Suspensión N°4, de fecha 10 de enero de 2019, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 4 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

S.A E.S.P., por motivo de que el cooperante solicita suspensión del contrato 2119 de 2017, mediante oficio del 10/01/2019.

18. Mediante oficio del 20 de marzo de 2019, el director de hábitat, remite a Egetsa S.A E.S.P, solicitud de Reinicio del contrato, ya que a la fecha Egetsa, no ha determinado si se han superado o no las circunstancias que conllevaron a que el contrato se encuentre suspendido por más de un año.

19. Que mediante Resolución N° 0137 del 14 de Marzo de 2019, se reasigna la supervisión a LUIS ARTURO ORTIZ LUNA.

20. Que mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019, se reasigna la supervisión a la Ingeniera Sandra Milena Muñoz Mosos.

21. Mediante informe de fecha 29 de julio de 2019, la supervisora, deja constancia de la trazabilidad encontrada en las carpetas, y el estado en que se recibe el convenio.

22. Se remite oficio del 15 de agosto de 2019, a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: Reinicio de contratos interadministrativos N°2119 de 2017, 1503 de 2018 y 1969 de 2017.

23. Se suscribe Acta de Reinicio N°4, de fecha 15 de octubre de 2019, entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P., por motivo de que el cooperante solicita el reinicio del contrato 2119 de 2017, mediante oficio del 01/10/2019, teniendo en cuenta que el memorando de revisión de la instalación de la conexión fue emitido el 23 de septiembre de 2019, por parte del operador de red CELSIA.

24. Se suscribe Acta de Terminación del Contrato Interadministrativo, de fecha 17 de octubre de 2019, entre Secretaría de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima y la Empresa Generadora de Energía del Tolima S.A. E.S.P “EGETSA”

25. Mediante oficio del 21 de octubre del 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación, se adjunta Acta Original de Reinicio No 4 el cual consta de 3 folios.

26. Mediante oficio del 14 de noviembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Financiera de Tesorería Nayibe Álvarez, en la cual se solicita cuenta Bancaria rendimientos financieros de fuentes de financiaciones directas de los siguientes contratos interadministrativos No 1969 del 2017, No 2119 del 2017 y No 1503 de 2018.

27. 20 de noviembre de 2019 se reciben datos financieros reintegro de rendimientos y saldo no ejecutado del convenio 2119 vigencia 2017. DFT No 094 de 2019

28. Mediante oficio del 25 de noviembre de 2019 de La Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Gerente María Azucena Ramírez Sandoval de la Empresa Generadora de Energía del Tolima “EGETSA S.A. E.S.P”, por medio del cual se realiza solicitud documentos para el proceso de liquidación del contrato interadministrativo No 2119 del 9 de noviembre de 2017

29. Mediante oficio del 28 de noviembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Gerente María Azucena Ramírez Sandoval de la Empresa Generadora de Energía del Tolima “EGETSA S.A. E.S.P”, por medio del cual se realiza citación a la reunión para continuar con el

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 5 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

procesos de liquidación de los contratos interadministrativos No 1969 de 2017, No 2119 de 2017 y No 1503 de 2018.

30. Mediante oficio del 11 de diciembre de 2019 de la empresa “EGETSA” por medio del cual se entrega de 76 folios

Informe final de la supervisora por parte de EGETSA del contrato No 2119 de 2017

Informe interventoría realizado por el ingeniero Miguel Raúl Calderón Villanueva

Certificados de lo paz y Salvo de los contratos Derivados EGT-048-2017, CONTRATO EGT-053 DE 2017, CONTRATO EGT-017 DE 2018

Acta de cantidades de obras ejecutadas

Paz y salvo firmado por la comunidad

Dictamen de inspección y verificación

Memorando de revisión de la instalación de la conexión 144-19

Planos record

Registro fotográfico

Certificado del interventor sobre cumplimiento de las normas de seguridad industrial en la obra

Certificado del interventor donde se indica que el personal conto con la dotación con forme a la ley, durante la ejecución de la obra

Certificado de paz y salvo de SENA, ICBF, entre otros, de los contratos derivados

Certificado de paz y salvo en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de EGETSA

Certificado de rendimientos financieros de la cuenta 1666-0005-7862

Factura No 734

RUT

Certificación cuenta Bancaria

No fueron entregados las Pólizas actualizadas y el informe financiero del contrato.

31. Mediante oficio del 11 de diciembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación Paola Arbeláez Arenas, por medio de la cual se adjuntan documentos para actualizar información de las carpetas del contrato interadministrativo No 2119 del 2017

32.- Mediante oficio del 11 de diciembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora Financiera de Tesorería Nayibe Álvarez Vargas, por medio del cual se solicita el certificado de aportes de rendimientos financieros de los contratos interadministrativos No 1969 del 7 de noviembre de 017 y No 21919 del 9 de noviembre de 2017. Al cual se le anexaron copia consignación rendimientos financieros del contrato interadministrativo No 1969 y No 2119 del 2017

33. Mediante oficio del 12 de diciembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación Paola Arbeláez Arenas, por medio de la cual se adjuntan documentos para actualizar información de las carpetas del contrato interadministrativo No 2119 del 2017.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 6 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

C. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

Se terminó las obras y procesos de certificaciones

D. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:


% EJECUCION:	100%
--------------	------

Nota: El porcentaje de ejecución que se describe corresponde al indicado por Egetsa mediante Informes finales de supervisión e interventoría

✓ **Meta:** 29 Viviendas

Se instalaron 29 cuentas residenciales con equipo de medida directa según acta de estabilidad de obra y memorandos de revisión de la instalación de la conexión N°144-19

E. REGISTRO FOTOGRAFICO:

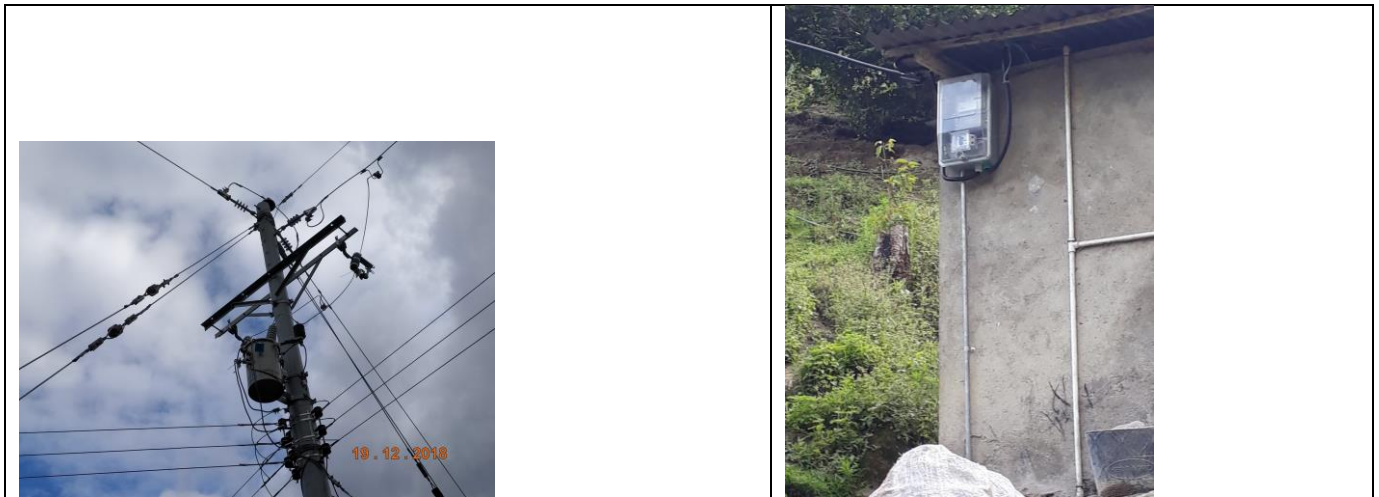

F. ACTIVIDADES PENDIENTES O POR REALIZAR:

Pendiente completar documentación por parte del contratista EGETSA solicitada mediante oficio del 25 de noviembre de 2019, para iniciar el proceso de recibo final y liquidación del contrato 2119 de 2017, y proceder al último pago equivalente al 10%

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 7 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

G. BALANCE FINANCIERO- APOORTE DEL DEPARTAMENTO

Balance General del Convenio		Pagos realizados al COOPERANTE	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del convenio	\$396.951.087.00	Primer desembolso	\$198.475.543.50
Valor Adiciones si las hay			
Valor Total del Convenio	\$396.951.087.00	Segundo desembolso	\$158.780.474.80
Valor pagado	\$357.255.978.30		
Valor causado que no se ha pagado	\$ 39.695.108.70	Primer desembolso adicional	
Valor total ejecutado	\$357.255.978.30	Segundo desembolso adicional	
Saldo a Liberar	\$ 0,00	TOTAL	\$357.255.978.30

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral del presente informe.


SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS
 Supervisora - Contratista
