

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 1 de 8
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	12	de	DICIEMBRE	de	2019
---------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-------------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
Contrato número:	0614 DEL 14 DE MARZO DEL 2019
Objeto del contrato: "CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA S.A. E.S.P "CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS BRILLANTE, CASA VERDE Y LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
Interventor:	N/A
Supervisor:	SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS Delegada Mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019
Valor inicial del CONVENIO:	SEISCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$602.304.506)
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P EGETSA
Duración inicial del CONVENIO: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO	
CDP N° :	1774 DEL 26 DE FEBRERO DE 2019
RP N°:	3121 DEL 20 DE MARZO DE 2019
Fecha de Legalización:	26 DE MARZO DE 2019
Acta de Inicio:	27 DE MARZO DE 2019
Fecha de Terminación inicial:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 8
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

Acta de suspensión N°1:	05 DE ABRIL DE 2019
Acta de Reinicio N°1:	19 DE JUNIO DE 2019
Acta de suspensión N°2:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A. ESTADO A LA FECHA: SUSPENDIDO

Nota: Es objeto de suspensión debido a que por parte del contratista, en este caso LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA EGETSA S.A.E.S.P, se debe radicar ante el operador de red del Tolima CELSIA S.A E.S.P, las modificaciones y actualización del diseño del proyecto según replanteo realizado, esto con el fin que el operador lleve a cabo la revisión y aprobación de dichas modificaciones

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL (Documentos en la carpeta de supervisor):

1. El día 14 de Marzo de 2019 se celebra contrato interadministrativo N° 0614 entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y el contratista, la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A. E.S.P, quienes firman son DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO Secretaria de Infraestructura y Hábitat Ordenadora del Gasto – Ejecutora, FERNANDO AUGUSTO BONILLA Supervisor y MARIA AZUCENA RAMIREZ SANDOVAL Gerente General EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
2. Mediante Resolución N° 0137 del 14 de Marzo del 2019, de conformidad con la Cláusula Decima Segunda SUPERVISIÓN del contrato, se reasignó como supervisor al profesional LUIS ARTURO ORTIZ LUNA, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.
3. Las Pólizas N° 12-44-101180883 y N° 12-40-101041363 fueron expedidas el día 19 de Marzo de 2019.
4. El Registro Presupuestal N° 3121 fue expedido el 20 de Marzo de 2019.
5. Mediante Oficio del día 26 de Marzo del 2019 se solicita certificado de legalización del contrato interadministrativo 0614-19 con EGETSA S.A. E.S.P. Se anexan Pólizas y Registro Presupuestal.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 3 de 8
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

6. Que el certificado de legalización expedido por la Dirección de Contratación tiene como fecha de legalización el día 26 de Marzo de 2019.
7. Fijar como fecha de inicio del Contrato No. 0614 - 2019 cuyo objeto es CONTRATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGETSA S.A. E.S.P LA "CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS BRILLANTE, CASA VERDE Y LOS CAUCHOS DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" el día 27 de Marzo de 2019; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 22 de Septiembre de 2019.
8. Mediante Oficio del día 1 de Abril de 2019 se anexa la siguiente documentación para legalización del primer pago anticipado del contrato interadministrativo N° 0614-19 con EGETSA S.A. E.S.P: Informe de Supervisión y anexo, Acta de Inicio original, Seguridad Social y Parafiscal, Copia de la Factura, Certificado cuenta bancaria, Rut y Resolución de reasignación de Supervisión.
9. Se realizó un primer pago anticipado del 50%, mediante Orden de Pago N°3830 y Egreso del 05/04/2019.
10. Que mediante Acta de Suspensión No. 1, el plazo del contrato en mención fue suspendió a partir del 05 de Abril de 2019.
11. Que mediante Acta de Reinicio No. 1, el plazo del contrato en mención fue reanudado a partir del 19 de Junio de 2019
12. Mediante Oficio del 26 de Junio de 2019, la empresa EGETSA S.A. E.S.P envía propuestas mejoras al proyecto de electrificación rural, de red trenzada a red abierta.
13. Mediante oficio del 12 de julio de 2019, EGETSA S.A E.S.P, allegó informe de avance de obra, acta parcial de obra 50%, factura 711, Rut y certificación bancaria, con el fin de cobrar el 40% del contrato interadministrativo 612 de 2019.
14. Mediante Oficio del 12 de Julio de 2019, se radica en la Dirección de Contratación, documentos por parte del supervisor para segundo pago anticipado del contrato interadministrativo N° 0614-19 con EGETSA S.A. E.S.P: Informe de Supervisión y anexo, Seguridad Social y Parafiscal, Copia de la Factura, Acta parcial de obra e Informe de Avance de obra.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 4 de 8
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

15. Se realizó un segundo pago correspondiente al 40%, mediante Orden de Pago N° 10291 de fecha 16 de Julio de 2019 y Egreso del 19 de julio de 2019.
16. Que mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019, se reasigna la supervisión a la Ingeniera Sandra Milena Muñoz Mosos.
17. Que mediante Acta Modificatoria N°1, del 23 de julio de 2019, se realiza las modificaciones al presupuesto según menores o mayores cantidades e ítem no previstos.
18. Mediante informe de fecha 29 de julio de 2019, la supervisora, deja constancia de la trazabilidad encontrada en las carpetas, y el estado en que se recibe el convenio.
19. Mediante oficio del 30 de agosto de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: solicitud informe y documentos para cada contrato interadministrativo N°0612,0613 y 0614 de 2019.
20. Mediante oficio del 02 de septiembre 2019, se remite a la Secretaria de Planeación y Tic, con asunto: solicitud copia de las carpetas del proyecto: CONSTRUCCION PARA LA ELECTRIFICACION RURAL POR MEDIO DE REDES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
21. Se realiza mesa técnica el 06 de septiembre de 2019, con EGETSA e interventoría, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo de los contratos N°0612,0613 y 0614 de 2019.
22. Se realiza mesa técnica el 09 de septiembre de 2019, con interventorías, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo de los contratos N°0612,0613 y 0614 de 2019 e interventorías
23. Mediante oficio del 09 de septiembre de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: solicitud balances financieros, e información de datos del supervisor por parte de esa entidad.
24. Mediante oficio del 09 de septiembre de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: Citación Mesa Técnica el día 10/09/2019 para tratar temas de los contratos interadministrativos N°0612,0613 y 0614 de 2019, con compañía de CELSIA S.A E.S.
25. Se realiza mesa técnica el 10 de septiembre 2019, con Egetsa, interventorías y acompañamiento de personal de CELSIA, en las instalaciones de la secretaria de

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 5 de 8
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo de los contratos interadministrativos N°0612,0613 y 0614 de 2019.

26. Que mediante Acta de Suspensión No. 2, el plazo del contrato en mención fue suspendió a partir del 10 de Septiembre de 2019.
27. Mediante Acta de Reunión se realiza mesa técnica el 25 de septiembre de 2019, con EGETSA e interventoría, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo de los contratos interadministrativos N°0612 y 0614 de 2019.
28. Mediante oficio del 01 de octubre de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: Citación Mesa Técnica el día 03/10/2019 para tratar temas de los contratos interadministrativos N°0612,0613 y 0614 de 2019.
29. Mediante oficio del 15 de octubre de 2019 de EGETSA, envían soporte de actualización de póliza No 12-44-101180883 Cumplimiento de contrato, devolución de pagos anticipados, pago de salarios prestacionales sociales e indemnización laboral, estabilidad y calidad de obra. Póliza No12-40-101041363 responsabilidad civil extracontractual
30. Mediante oficio del 15 de noviembre del 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación Dr. Paola Arbeláez Arenas, por medio del cual se remite Actualización de Póliza Seguros del Estado SA Póliza No 12-44-101180883 RCE No 12-40-101041363 y oficio remitatorio del contratista (1 folio).
31. Mediante oficio del 11 de diciembre de 2019 de EGETSA por medio de la cual se anexa corrección de la póliza del contrato No 0614, la cual tiene por objeto” contratar entre el departamento del Tolima y la Empresa Generadora de Energía EGETSA S.A. E.S.P construcción de la electrificación rural de la red de media y baja tensión en las veredas El Brillante, Casa Verde y los Cauchos del municipio de Ataco en el Departamento del Tolima.
32. Mediante oficio del 12 de diciembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación Dra. Paola Arbeláez Arenas por medio del cual se remite la actualización de Póliza No 12-44-101180883 RCE No 12-40-101041363 y oficio remitatorio del contratista (1 folio).

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 6 de 8
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

C. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

Se construyo la red de media tensión y la red de baja tensión en las Veredas brillante, casa verde y los cauchos, y se realizaron las instalaciones internas en cada beneficiario. Hay que tener en cuenta que después de ejecutar el 100% de la obra se continua con la visita por parte del RETIE.

D. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	100%
--------------	------


Nota: El porcentaje de ejecución que se describe corresponde al indicado por egetsa mediante oficio con fecha 05 de septiembre de 2019, con anexo cd con informes detallados.

✓ **Meta:** 35 Viviendas, cuenta residenciales con equipo de medida

E. REGISTRO FOTOGRAFICO:



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 7 de 8
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

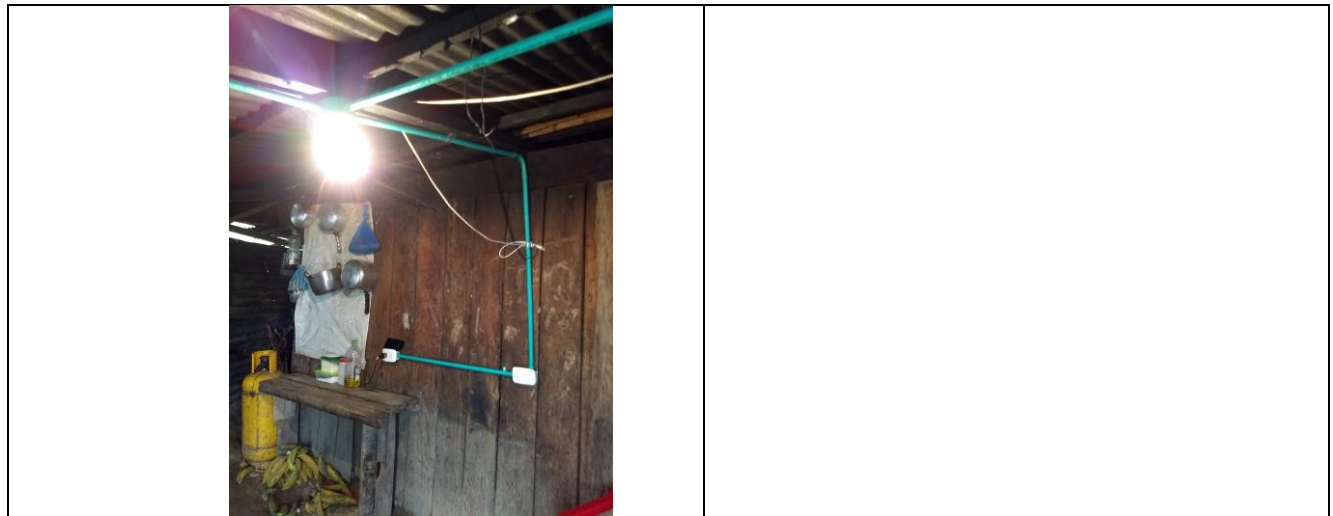

Nota: visita de obra-cotubre de 2019.

F. CRONOGRAMA:

TIEMPO QUE QUEDA POR EJECUTAR DESDE EL REINICIO N° 01 DE FECHA 19/06/2019

MES	19/JUNIO/2019	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	06/DICIEMBRE/2019
PROGRAMADO							
EJECUTADO							

G. ACTIVIDADES PENDIENTES O POR REALIZAR:

Una vez expedido el RETIE, se realiza el trámite ante el operador de red, en este caso CELSIA S.A E.S.P, para obtener el memorando de revisión de la instalación de la conexión.

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 8 de 8****INFORME ESTADO DEL PROCESO****H. BALANCE FINANCIERO- APOORTE DEL DEPARTAMENTO**

Balance General del Convenio		Pagos realizados al COOPERANTE	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del convenio	\$602.304.506,00	Primer Desembolso - Pago Anticipado (50%)	\$301.152.253,00
Valor Adiciones si las hay			
Valor Total del Convenio	\$602.304.506,00	Segundo desembolso –pago anticipado (40%)	\$240.921.802,40
Valor pagado	\$542.074.055,40		
Valor que no se ha pagado	\$60.230.450,60		
Valor total ejecutado	\$542.074.055,40		
Saldo a Liberar		TOTAL	\$542.074.055,40

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral del presente informe.

SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS
Supervisora- Contratista
