

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 1 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha:	12	de	DICIEMBRE	de	2019
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato número:	0612 DEL 14 DE MARZO DEL 2019
Objeto del contrato: “CONT RATAR ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y LA EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA EGE TSA SA E.S.P LA “CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION E N LA VEREDA MADROÑAL DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”	
Interventor:	N/A
Supervisor:	SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS Delegada Mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019
Valor inicial del CONVENIO:	(\$559.708.425) QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA DEL TOLIMA S.A E.S.P EGETSA
Duración inicial del CONVENIO: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO	
CDP N° :	1773 del 26 de febrero de 2019
RP N°:	2945 del 18 de marzo de 2019
Fecha de Legalización:	26 de marzo del 2019
Acta de Inicio:	27 de marzo del 2019
Fecha de Terminación inicial:	22 de septiembre de 2019
Acta de Suspensión N° 01:	09 de mayo de 2019
Acta de Reinicio N° 01:	01 de agosto de 2019



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 2 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

Fecha de Terminación:	15 de diciembre de 2019
Acta de suspensión N°1:	05 de abril de 2019
Acta de Reinicio N°1:	19 de junio de 2019
Acta de suspensión N°2:	10 de septiembre de 2019
Acta de Reinicio N°2:	15 de octubre de 2019
Acta de Suspension N°3:	09 de diciembre de 2019

A. ESTADO A LA FECHA: SUSPENSION

Es objeto de SUSPENSION, Teniendo en cuenta que la obra ya se encuentra terminada, y ya cuenta con la certificación RETIE , y Que fue expedido el memorando por parte del Operador de Red CELSIA, quedando pendiente únicamente la expedición de la legalización de los medidores y/o cuentas residenciales por parte del Operador de Red CELSIA

B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL (Documentos en la carpeta de supervisor):

1. Que el día 14 de Marzo de 2019 se firma el convenio interadministrativo 0612 entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y el contratista, la EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A. E.S.P, quienes firman son DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO Secretaria de Infraestructura y Hábitat Ordenadora del Gasto – Ejecutora, FERNANDO AUGUSTO BONILLA Supervisor y MARIA AZUCENA RAMIREZ SANDOVAL Gerente General EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A E.S.P.
2. Las pólizas N° 12-44101180884 y N°12-40101041364 fueron expedidas el 19 de Marzo de 2019.
3. Mediante oficio del 26 de Marzo de 2019 se realiza solicitud de certificado de legalización del contrato 0612, en la Dirección de Contratación, anexando las pólizas N° 12-44101180884 y REC-12-40101041363; además del registro presupuestal N°2945 del 18 Marzo de 2019
4. Que el día 26 de Marzo de 2019, por parte de la Directora de Contratación, se legaliza el convenio número 0612 del 14 de Marzo de 2019.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

5. Que el día 27 de Marzo de 2019, se suscribe el Acta de Inicio del convenio interadministrativo N° 0612 de 14 de Marzo de 2019, entre la Secretaria de Infraestructura y Hábitat, el Contratista EGETSA S.A E.S.P, y el Supervisor.
6. Mediante oficio del 01 de Abril de 2019, se radica en la Dirección de Contratación, documentos por parte del supervisor para primer pago anticipado del contrato 0612 con EGETSA S.A E.S.P. Anexando informe de supervisión, acta de inicio original, seguridad social y parafiscal, copia de la factura, certificado cuenta bancaria, Rut, resolución reasignación de supervisión.
7. Se realizó un primer pago anticipado del 50%, mediante Orden de Pago N°3821 y Egreso del 05/04/2019.
8. Que mediante Acta de Suspensión No. 1, el plazo del contrato en mención fue suspendió a partir del 05 de Abril de 2019.
9. Que mediante Acta de Reinicio No. 1, el plazo del contrato en mención fue reanudado a partir del 19 de Junio de 2019.
10. Egetsa allego con fecha de 27 de Junio de 2019 propuestas mejoras al proyecto de electrificación rural, de red trenzada a red abierta.
11. Mediante oficio del 12 de julio de 2019, EGETSA S.A E.S.P, allegó informe de avance de obra, acta parcial de obra 50%, factura 711, Rut y certificación bancaria, con el fin de cobrar el 40% del contrato interadministrativo 612 de 2019.
12. Mediante oficio del 12 de Julio de 2019, se radica en la Dirección de Contratación, documentos por parte del supervisor para segundo pago anticipado del contrato 0612 con EGETSA S.A E.S.P. Anexando informe de supervisión, seguridad social y parafiscal, copia de la factura, e informe de avance de obra.
13. Se realizó un segundo pago correspondiente al 40%, mediante Orden de Pago N° 10306 de fecha 16 de Julio de 2019 y Egreso del 19 de julio de 2019.
14. Que mediante Resolución N° 0403 del 22 de Julio de 2019, se reasigna la supervisión a la Ingeniera Sandra Milena Muñoz Mosos.
15. Que mediante Acta Modificatoria N°1, del 23 de julio de 2019, se realiza las modificaciones al presupuesto según menores o mayores cantidades e ítem no previstos.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

16. Mediante informe de fecha 29 de julio de 2019, la supervisora, deja constancia de la trazabilidad encontrada en las carpetas, y el estado en que se recibe el convenio.
17. Mediante oficio del 30 de agosto de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: solicitud informe y documentos para cada contrato interadministrativo N°0612,0613 y 0614 de 2019.
18. Mediante oficio del 02 de septiembre 2019, se remite a la Secretaria de Planeación y Tic, con asunto: solicitud copia de las carpetas del proyecto: CONSTRUCCION PARA LA ELECTRIFICACION RURAL POR MEDIO DE REDES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
19. Se realiza mesa técnica el 06 de septiembre de 2019, con EGETSA e interventoría, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo de los contratos N°0612,0613 y 0614 de 2019.
20. Mediante oficio del 5 de septiembre de 2019 de EGETSA, remite en 1cd informes de los contratos No612 , No 613 y No 614.
21. Mediante oficio del 06 de septiembre de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: Remitir observaciones realizadas por la interventoría a la obra que hace parte del contrato interadministrativo N°0612 de 2019, y solicitar su debida corrección.
22. Se realiza mesa técnica el 09 de septiembre de 2019, con interventorías, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo de los contratos N°0612,0613 y 0614 de 2019 e interventorías
23. Mediante oficio del 09 de septiembre de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: solicitud balances financieros, e información de datos del supervisor por parte de esa entidad.
24. Mediante oficio del 09 de septiembre de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: Citación Mesa Técnica el día 10/09/2019 para tratar temas de los contratos interadministrativos N°0612,0613 y 0614 de 2019, en compañía de CELSIA S.A E.S.
25. Se realiza mesa técnica el 10 de septiembre 2019, con Egetsa, interventorías y acompañamiento de personal de CELSIA, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo de los contratos interadministrativos N°0612,0613 y 0614 de 2019.
26. Que mediante Acta de Suspensión No. 2, el plazo del contrato en mención fue suspendió a partir del 10 de Septiembre de 2019.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 5 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

27. Se realiza mesa técnica el 25 de septiembre de 2019, con EGETSA e interventoría, en las instalaciones de la secretaria de infraestructura y hábitat, con asunto: seguimiento al desarrollo de los contratos interadministrativos N°0612 y 0614 de 2019.
28. Mediante oficio del 01 de octubre de 2019, se remite a EGETSA S.A E.S.P, con asunto: Citación Mesa Técnica el día 03/10/2019 para tratar temas de los contratos interadministrativos N°0612,0613 y 0614 de 2019.
29. Que mediante Acta de Reinicio No. 2, el plazo del contrato en mención fue reiniciado a partir del 15 de Octubre de 2019.
30. Que mediante oficio del 17 de octubre de 2019, se remite a la dirección de contratación, acta original de Reinicio N°2 del contrato 612 de 2019.
31. Informe de visita de obra del 30 de octubre de 2019, en compañía de la supervisión de egetsa e interventoría a la vereda madroñal de ataco
32. Mediante oficio del 1 de noviembre de 2019 de EGETSA, Pólizas de seguro de cumplimiento entidad estatal Decreto 1082 de 2015 (2 folios)
33. Mediante oficio del 15 de noviembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Directora de Contratación Paola Arbeláez Arenas, por medio del cual se remite la Actualización de Póliza Seguros del ESTADO S.A. Póliza No 12-44-101180884 RCE No 12-40-101041364 (2 folios) y Oficio remitatorio del contratista (1 folio)
34. Mediante oficio del 4 de diciembre de 2019 de la Secretaria de Infraestructura y Hábitat a la Gerente de la Empresa Generadora de Energía del Tolima EGETSA SA ESP, por medio del cual se solicita informe detallado del contrato interadministrativo suscrito entre la Gobernación del Tolima y EGETSA S.A ESP
35. Que mediante Acta de Suspensión No. 3, el plazo del contrato en mención fue suspendió a partir del 09 de diciembre de 2019.
36. Mediante oficio del 12 de diciembre del 2019 de EGETSA adjuntan respuesta dada a la interventoría del proyecto de electrificación rural de la vereda Madroñal 84 folios).

C.

ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:

Se construyo la red de media tensión y la red de baja tensión en la Vereda Madroñal, y se realizaron las instalaciones internas en cada beneficiario.




GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 7

INFORME ESTADO DEL PROCESO

D. REGISTRO FOTOGRAFICO:

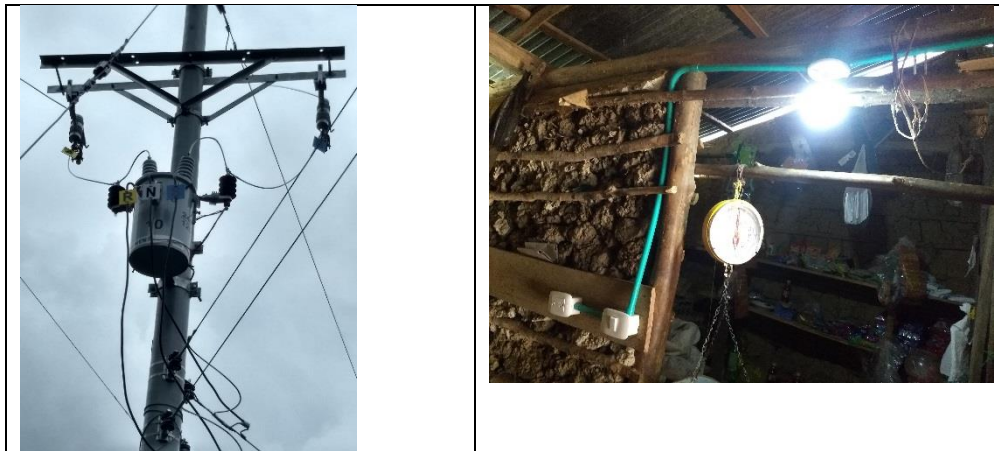

Visita de obra-octubre de 2019

E. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	100%
--------------	------

Nota: El porcentaje de ejecución que se describe corresponde al indicado por egetsa mediante oficio con fecha 06 de septiembre de 2019, con anexo cd con informes detallados.

✓ **Meta:** 48 viviendas – cuentas residenciales con equipo de medida

F. CRONOGRAMA:

TIEMPO QUE QUEDA POR EJECUTAR DESDE EL REINICIO N° 02 DE FECHA 15/10/2019

MES	09/OCTUBRE/2019	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	8/ENERO/2020
PROGRAMADO				
EJECUTADO				

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 7 de 7
	INFORME ESTADO DEL PROCESO	

G. ACTIVIDADES PENDIENTES O POR REALIZAR:

pendiente únicamente la expedición de la legalización de los medidores y/o cuentas residenciales por parte del Operador de Red CELSIA, para dar reinicio y proceder a tramite de recibo final e iniciar proceso de liquidacion

H. BALANCE FINANCIERO- APOORTE DEL DEPARTAMENTO

		Pagos realizados al COOPERANTE	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del convenio	\$559.708.425,00	Primer Desembolso - Pago Anticipado (50%)	\$279.854.212,50
Valor Adiciones si las hay			
Valor Total del Contrato	\$559.708.425,00	Segundo desembolso (40%)	\$223.883.370,00
Valor pagado	\$503.737.582,50		
Valor que no se ha pagado	\$55.970.842,50		
Valor total ejecutado			
Saldo a Liberar		TOTAL	\$503.737.582,50

Nota: Todos los documentos enunciados anteriormente hacen parte integral del presente informe.



SANDRA MILENA MUÑOZ MOSOS
Supervisora- Contratista
