

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT	
	INFORME DE SUPERVISION	Pág. 1 de 7


INFORME DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION					
Contrato 0613 del 14 de Marzo de 2017					
Fecha:	30	De	Mayo	De	2017

INFORMACIÓN GENERAL DE LASUPERVISION

Recopilación de las actividades de supervisión desarrolladas a la ejecución de obra en atención a la declaratoria de urgencia manifiesta del puente vehicular sobre el rio Chili y obras complementarias, en la vereda hatu viejo del municipio de Rovira departamento del Tolima.

LOCALIZACION

El puente se encuentra ubicado en el municipio de Rovira-Tolima en la vía que conduce al centro poblado de playa rica-Tolima a 12 km del casco urbano.

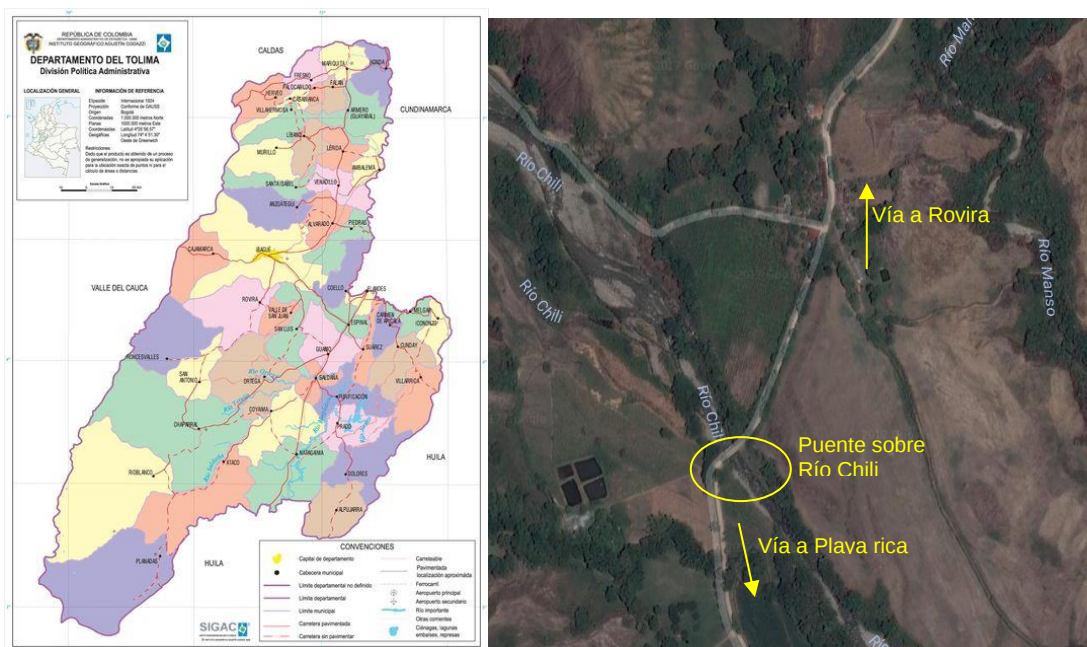

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
 Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
 Página Web: www.tolima.gov.co
 Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT	
	INFORME DE SUPERVISION	Pág. 2 de 7

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO NÚMERO:	0613 del 14 de Marzo de 2017		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA INTERVENCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO CHILI Y OBRAA COMPLEMENTARIAS UBICADAS EN LA VEREDA HATO VIEJO MUNICIPIO DE ROVIRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE ACUERDO A LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA		
SUPERVISOR:	LAUREN VANESA MARTINEZ CHAVEZ		
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.095.405.549	DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	90 Días calendario
PRORROGA No. 01	90 Días calendario	DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:	180 Días calendario
FECHA DE INICIO	26 de Enero de 2017	FECHA DE TERMINACION	24 de Julio de 2017

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

De acuerdo a las visitas realizadas se observa un avance en obra del 68%, y a la fecha ya se realizó el pago de la primera cuenta, la cual es de un 53,46% equivalente a \$1.120.128.606 con relación al valor total del contrato.

Los avances que a continuación serán mencionados son de acuerdo a la última visita realizada de fecha 28 de Abril de 2017.

Con el fin de encausar las aguas del río se ejecutaron actividades de excavación aguas arriba y abajo con ayuda de 2 máquinas excavadoras de oruga, de manera que se lograra proteger la margen derecha del puente por medio de construcción de jarillones de 2m de alto y 6m de ancho aproximadamente.

Las excavaciones varias en material conglomerado bajo agua se ejecutaron de acuerdo al avance de las excavaciones para los caisson, en el caisson uno (1) y dos (2) de acuerdo al plano se encuentran fundidos 6 anillos cada uno de 0,90m, En continuidad con los

Soluciones que transforman

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT	
	INFORME DE SUPERVISION	Pág. 3 de 7

caisson (1A) se encuentra 6 anillos fundidos, (1B) se encuentra 3 anillos fundidos, (2A) se encuentra 6 anillos fundidos Y (2B) se encuentra 4 anillos fundidos. La profundidad total de los caisson es de 8m y cada deberá tener 9 anillos. Para los caisson número tres (3) se fundieron 8 anillos y ya se fundió el caisson con los aceros respectivos y número cuatro (4) ya se encuentra fundido en su totalidad.

Continuamente se levanta la superestructura, con una altura total de 1m según planos y diseños; pero a consecuencia de que no se han hecho las vigas, ni el apoyo sobre el cual será descargada la superestructura se levanta la superestructura 60 cm mientras se terminan los apoyos.

Acto seguido se procedió a realizar el refuerzo de la estructura metálica mediante bastidor de arrostramiento y piezas de puentes modulares. Por otra parte se adecuaron los paneles para prolongación del puente cada uno de 3,048m; el día de la visita se encontraban unos paneles provisionales ya que se necesitaba llegar al terreno firme, a causa de que las bases sobre las cuales terminaría el puente aún no están terminadas y por ende no alcanzaba con los dos paneles solamente. El puente originalmente tenía una luz 36,58m y con los paneles de prolongación quedara la luz total de 42,67m.

Dentro del contrato se generó una prorroga en tiempo de noventa (90) días.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 2.095.405.548
Valor Adiciones si las hay	0
Valor Total del Contrato	\$ 2.095.405.548
Valor acta parcial No.1	\$1.120.128.606
Saldo del acto contractual	\$975.276.942

Soluciones que transforman



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Soluciones que transforman



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SUPERVISION

Pág. 5 de 7



Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SUPERVISION

Pág. 6 de 7



Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SUPERVISION

Pág. 7 de 7



LAUREN VANESA MARTINEZ C.
Ingeniera Civil

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima
