

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 1 de 3
	INFORME DEL PROCESO	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO	
Tipo de contrato	CONTRATO DE OBRA
Numero	0003 DEL 18 DE ENERO DEL 2021 (MEN-2020-109)
Contratante	GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.6727
Contratista	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A – NIT 830.056.149-0
Objeto	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 PANTALLA LED, EN EL ESTADIO MANUEL MURILLO TORO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Plazo inicial del convenio:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.
Prórrogas o adiciones:	NA
Plazo total del convenio, incluidas las adiciones	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.
Días ejecutados:	0
Valor inicial del convenio	DOS MIL VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MCTE (\$2.025.840.815,00)
Certificado disponibilidad presupuestal	CDP 449 DEL 15 DE ENERO DEL 2021
Registro presupuestal	RP 3005 DEL 23 DE MARZO DEL 2021
Fecha de legalización	03 de junio 2021
Fecha de iniciación	09 de junio 2021
Acta de Suspensión, Reinicio, Modificatorias, Adición de Plazo	Prorroga 1 - 06 de agosto del 2021 Adición de 24 días
Fecha de terminación	31 de agosto 2021
Estado actual contrato	En ejecución
Ejecución física	67%

1. RESUMEN ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividad realizada	Fecha	Descripción
Perfeccionamiento del convenio		03 de junio 2021 se entregan actualizadas las pólizas en contratación.
Acta de inicio		03 de junio del 2021

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT	Pág. 2 de 3
	INFORME DEL PROCESO	

Actividad realizada	Fecha	Descripción
Suscripción contrato interventoría		CONTRATO 0974 DEL 14 DE ABRIL DEL 2021
Acta de Terminación		01 de agosto del 2021
Adición		24 días
Nueva fecha de terminación		31 de agosto del 2021

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONTRATOS DERIVADOS OBRA E INTERVENTORÍA

Tipo de contrato	Interventoría
Numero	CONTRATO 0974 DEL 14 DE ABRIL DEL 2021
Contratante	GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.6727
Contratista	SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S NIT 900.215.779-7 RL. JAVIER ALFONSO RODRÍGUEZ AGUIRRE
Objeto	“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 PANTALLA LED, EN EL ESTADIO MANUEL MURILLO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
Estado	Acta de inicio el 19 de mayo del 2021 - En ejecución - revisión de la documentación técnica avalada para iniciar obra.
Plazo inicial del convenio:	90 DIAS CALENDARIO
Valor inicial del convenio	\$76.088.600

A. ESTADO A LA FECHA: EL PROCESO A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCION.


B. META A IMPACTAR: CP2MP13 “Escenarios Construidos y/o Mejorados para la integración Social, la recreación y el Deporte” Impacta un escenario deportivo por la de la instalación y puesta en marcha la pantalla LED PANTALLA LED, EN EL ESTADIO MANUEL MURILLO TORO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

% EJECUCION:	69%
---------------------	------------

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA		
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT		Pág. 3 de 3
	INFORME DEL PROCESO		

REGISTRO FOTOGRAFICO

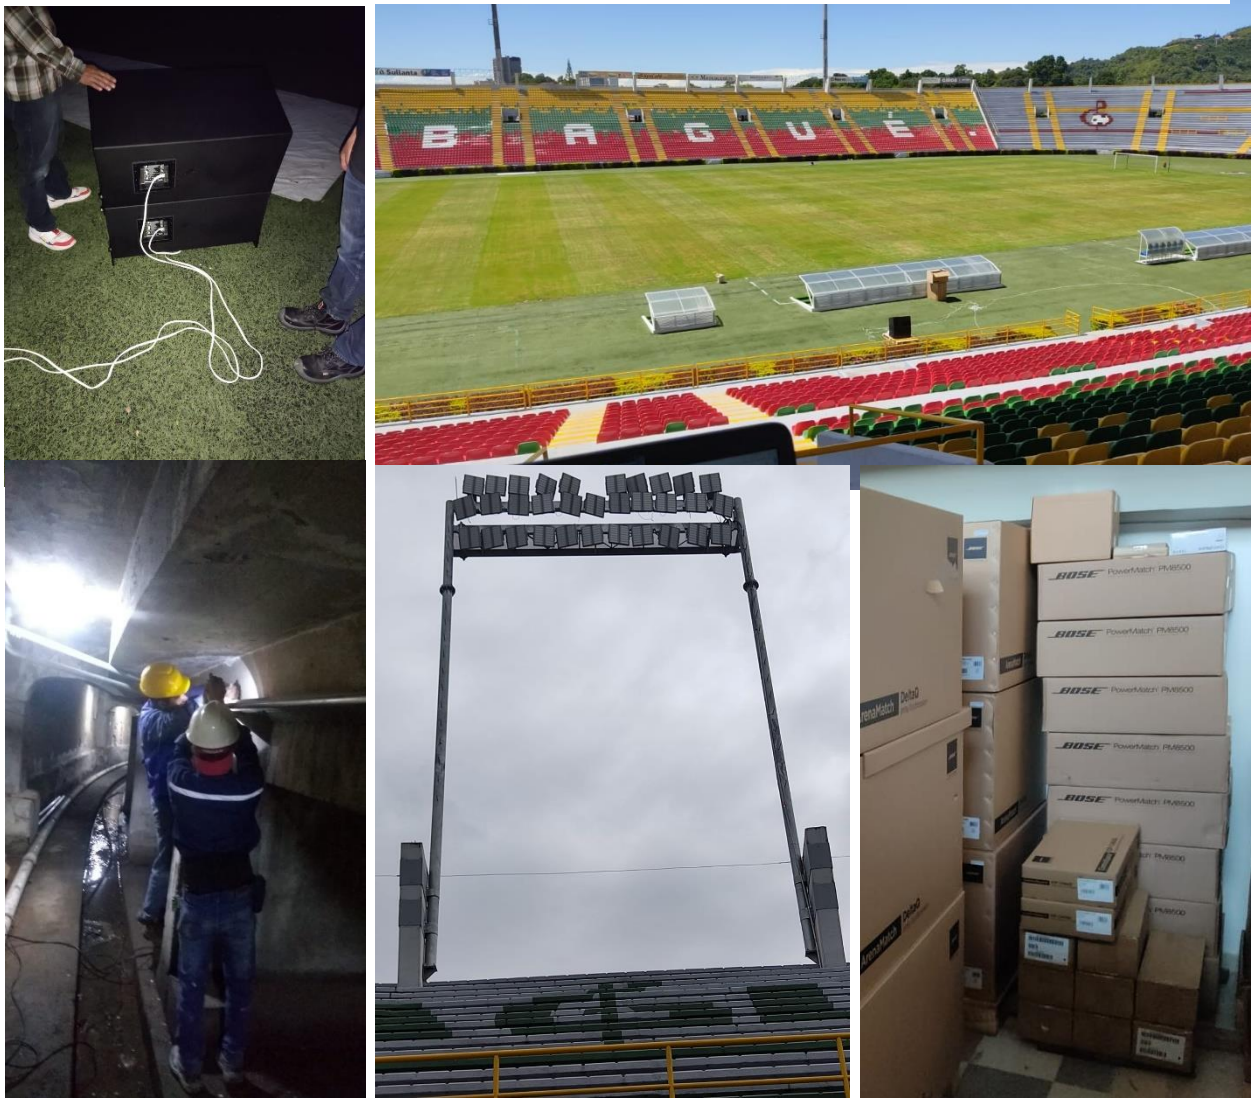


ARQ. DIANA MARIA GUERRERO CAMACHO
Supervisora Dirección de Hábitat
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
