

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P1S19MP37	Hospitales construidos con apoyo del gobierno nacional en el departamento del Tolima	Número de hospitales construidos	acumulado

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
1	0,06	3

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: (EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA)

Fecha del reporte: (04 Agosto 2025)

Periodo de reporte: (Abril – Julio 2025)

Tipo de soporte:

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	X
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	X
OTRO ¿CUÁL?	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	15.013
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	1
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDIGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Asesorar a ESEs y municipios del Departamento en formulación, evaluación y seguimiento de Proyectos de Infraestructura que se tramiten ante el gobierno nacional
2	Mediante proceso contractual numero 338 de 23 de julio del 2024 se adjudica la construcción y dotación del nuevo Hospital Centro E.S.E del municipio de planadas- Tolima proyecto financiado por el ministerio de salud, por un valor de \$36.082.273.046, con un plazo de ejecución inicial de 28 meses, proceso que efectuo su legalización el 14 de agosto del 2024, teniendo como ejecutor el hospital Municipal. 23 de Abril de 2025: Visita técnica en obra en el Municipio, asiste el gerente del hospital, consultor, interventoría y funcionarios de la secretaria de salud de la gobernación del Tolima. Se evidencia ejecución del 3% de la obra y un claro retraso, se solicita formalmente al equipo consultor la estructuración de un cronograma ajustado, que contemple actividades correctivas con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales y minimizar los riesgos de incumplimiento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Además, ponen en conocimiento el proceso de construcción en el predio del CEATI lugar donde se trasladaron todos los servicios del hospital y a la fecha se encuentran en funcionamiento, se inspecciono el predio del hospital nuevo Se anexa acta.

- 15 de Mayo de 2025:** Se realiza acompañamiento a comité técnico virtual, donde se solicita por parte del ministerio informe escrito con porcentajes de avance de obra; el consultor deja constancia de que algunos retrasos han sido atribuidos a condiciones climáticas y demás . . Se anexa pantallazo del comité
- 28 de Mayo de 2025:** Se realiza acompañamiento a comité técnico virtual, asiste ministerio de salud, gerente y subgerente del hospital, consultor, interventoría y equipo de infraestructura de la secretaria de salud del Tolima, los puntos desarrollados fueron;

ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
Localización y replanteo se encuentra	100%
Descapote	50%
Excavación y cimentación	85%
Concreto pobre para la cimentación	Retraso de 11 días
Plan de contingencia CEATI	En revisión de cantidades
Certificación de RETIE	En tramite

Se deja constancia de la preocupación por el atraso de la obra y se solicita en conjunto con el ministerio plan de choque al gerente.
El consorcio de compromete a entregar cimentación para el 30 de mayo de 2025.

- 14 de Julio de 2025:** Se realiza mesa técnica presencial en el ministerio de salud en Bogotá, asisten gerente de Hospital, Consultor, interventoría y equipo de infraestructura de la secretaria de salud del Tolima, el hospital socializa cumplimiento de obra del 6% y un retraso del 30%. Se decide realizar nuevamente visita en obra y solicitar acompañamiento del alcalde.
- 25 de julio de 2025:** Visita técnica en obra, asiste el gerente del hospital, consultor, interventor, alcalde y equipo de infraestructura de la secretaria de salud; se recomienda revisar actividades adicionales que no se tuvieran previstas en el contrato actual y son de vital importancia para la ejecución del proyecto (obras exteriores, andenes, parqueaderos, taque de agua, impermeabilizaciones, muros de contención necesarios para la estructura de la edificación.

Se realiza recorrido en obra, donde se evidencia el avance en el proceso de amarre de aceros para vigas de cimentación, columnas y muros contención desde los tramos de los ejes 5" al 12" y del A al F.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022
	• 30 de Julio de 2025: Se realiza acompañamiento a comité técnico virtual, asiste ministerio de salud, gerente y subgerente del hospital, consultor, interventoría y equipo de infraestructura de la secretaria de salud del Tolima, el ministerio solicita balance financiero correspondiente a la ejecución de la construcción de CEATI, continua cumplimiento de obra del 6%.		

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Planadas	Valor de la obra “contratar la construcción y dotación del nuevo hospital centro ESE del Municipio de Planadas departamento del Tolima”.	\$ 36.082.273.046
	Anticipo de obra 40%	\$ 14.432.909.218

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.


ALISON AMAYA REYES

Directora de desarrollo de servicios y calidad de la prestación

2. Evidencias

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 5 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS
Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN



Ibagué, 21 de Julio de 2025

Doctor
FRANCISCO ANTONIO ZAPATA
Gerente Hospital Planadas
Municipio de Planadas
ventanillaunica@hospitalcentroplanadas.gov.co
direccionlocaldesalud@planadas-tolima.gov.co

ASUNTO: SOLICITUD PARA CONOCER EL ESTADO DE LA EJECUCION FISICA Y HACER EL CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA OBRA DEL PROYECTO " LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA ", EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVA DEL DEPARTAMENTO Y BAJO LA RESOLUCIÓN 2278 DE 28 DE DICIEMBRE.

Reciba un cordial saludo por parte del Gobierno Departamental, en cabeza de nuestra Gobernadora la Doctora Adriana Mujali Melo y la Dirección de Desarrollo de Servicios y Calidad en la Prestación – SST de la secretaria de Salud, del Departamento del Tolima.

Por medio de la presente, se informa que se ha programado una visita técnica en terreno para el día 25 de Julio de 2025, con el fin de verificar los avances y el estado del proyecto. Para dicha jornada, se solicita de manera atenta la presencia del contratista, la interventoría y la gerencia del hospital, a fin de facilitar el desarrollo de la actividad y resolver inquietudes.

En el cual asistirán los Arq. Crisithan Camilo Gonzalez, el Arq Juan Camilo Bocanegra y Ing. Santiago rizo

Quedamos atentos al enlace para asistir al respectivo comité.

Cordialmente,


ALISON AMAYA REYES
Directora Desarrollo de Servicios y Calidad
Secretaría de Salud

Unito Bueno: Alison Amaya Reyes - Directora Desarrollo de Servicios y Calidad en la Prestación - SST.
Proyecto: Crisithan Camilo Gonzalez (Arq), Juan camilo Bocanegra - Santiago rizo - P.A - DSSCP - SST

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 6 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



EGECE-10-179-00476
Planadas, 10 de abril del 2025.

Señores
ALISON AMAYA REYES
Directora Desarrollo de Servicios y calidad
SERCRETARIA DE SALUD

Asunto: Respuesta a oficio -02005

Cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias, me permito dar respuesta al oficio-02005. SOLICITUD PARA CONOCER EL ESTADO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA A LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO BAJO LA RESOLUCION 2278 DE 28 DE DICIEMBRE, a continuación se mencionara la información:

1. Se lleva un avance del 5,3% del contrato general de la obra, adicional a esto se aclara que el plan de contingencia equivale al 3,74% de lo cual se ha ejecutado el 3,74%. Además se ha adelantado actividades de demolición y excavación lo cual representa el 1,56% de avance.
2. A la presente fecha no se han realizado suspensiones ni reinicios.
3. A la presente fecha no se han realizado otros si.
4. estado financiero se evidencia en el siguiente cuadro:

	CONTRATO DE OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORIA
VALOR DEL CONTRATO	\$36.082.273.046,00	\$2.366.546.849,51
ANTICIPO	\$14.432.909.818,00	\$238.654.684,95
ACTAS PARCIALES	\$0,00	\$0,00

5. Se anexa la copia digital del plano del plan de contingencia.
6. Se anexa la copia digital del informe de avances del plan de contingencia.

No siendo más, quedamos atentos a cualquier solicitud.

Atentamente,

YEINI GUTIERREZ AGUIRRE
Subgerente Hospital Centro E.S.E Planadas Tolima
Supervisora del contrato

PARTICIPACIÓN	NOMBRE COMPLETO	CARGO O ACTIVIDAD	FECHA	FIRMA
Elaboró:	Robinson Javier Rios Viera	Profesional de apoyo técnico	10/04/2024	
Revisó:	Yeini Gutierrez Aguirre	Profesional de apoyo técnico	10/04/2024	
Aprobó:	Yeini Gutierrez Aguirre	Profesional de apoyo técnico	10/04/2024	

Los arriba firmantes, manifestamos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a los normen y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Dispuestos a servir

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 7 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



1.3 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

REFERENCIA	338 DEL 23 DE JULIO DE 2024
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE PLANADAS-TOLIMA
ENTIDAD CONTRATANTE	HOSPITAL CENTRO E.S.E PLANADAS TOLIMA.
NIT	890.704.555-7
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA
SUPERVISOR	YEINY GUTIERREZ AGUIRRE
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE DEL HOSPITAL CENTRO E.S.E. PLANADAS TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO HOSPITALARIO 2024. R.L. CELSO ROMAN GONZALEZ
NIT/CEDULA	901.844.965-2 19.499.379 DE BOGOTA D.C
OBJETO OBRA	CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
VALOR OBRA	TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MC/TE (\$36.082.273.046).
DURACIÓN OBRA	VEINTIOCHO (28) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION.
ANTICIPO DE OBRA 40%	CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL DOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MC/TE (14.432. 909.218 ,00)
FECHA DEL ANTICIPO DE OBRA.	02 DE OCTUBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
FECHA DE FIRMA	23 DE JULIO DE 2024
ACTA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2024.
INTERVNETORIA	CONSORCIO INTERPLANADAS R.L. JAIR GARCIA GARCIA
NIT/CEDULA	901.853.959-6 17.144.460 DE BOGOTA D.C
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
FECHA DE FIRMA	03 DE AGOSTO DE 2024.
ACTA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2024.
OBJETO INTERVENTORIA	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
VALOR INTERVENTORIA	DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:
INS-PD-001
VERSION: 01**

PROCESO

**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL
DESARROLLO**


PÁG. 8 DE 30

**FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-
EJECUTOR TOLIMA.**

**VIGENTE DESDE:
28/06/2022**



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 9 DE 30
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 10 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 3
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	1	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	10:50 AM
			23	04	2025		

OBJETIVO DE LA REUNION:	SEGUIMIENTO Y SUPERVISION
LUGAR:	HOSPITAL CENTRO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS
REDACTADA POR:	

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
LUIS CARLOS ROMERO COLMENARES	DIRECTOR	CONSTRUCTOR
CELSO ROMAN GONZALEZ	INGENIERO	CONSTRUCTOR
DAVID DIAZ	INGENIERO	CONSTRUCTOR
LORENA RIVERA CAMACHO	ARQUITECTA	CONSTRUCTOR
RONNY GONZALEZ	INGENIERO	INTERVENTORIA
ROBINSON JAVIER RIOS	INGENIERO	HOSPITAL CENTRO PLANADAS
FRANCISTO ANTONIO ZAPATA MEDINA	GERENTE	HOSPITAL CENTRO PLANADAS
CRISTIAN CAMILO	ARQUITECTO	SEC. DE SALUD DEL TOLIMA
SANTIAGO RICO PAEZ	INGENIERO	SEC. DE SALUD DEL TOLIMA

AUSENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 11 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 2 de 3
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 25/06/2024

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO DE LA REUNION:

- La reunión se da inicio con la presentación de los presentes, interventoría, contratista y la ESE, el contratista expone el porqué del atraso de la obra afirmando que el motivo durante 7 meses fue por que el proyecto se iba a realizar en 2 fases y debido a que el plan de contingencia paso de trescientos metros cuadrados a novecientos metros cuadrados se contempló realizarlo en una sola fase el cual fue acordado entre consultor, interventoría, la ESE y ministerio.
- Hasta el momento se llevan 6% de avance de obra.
- El CEATI se encuentra totalmente en funcionamiento prestando un óptimo servicio.
- El predio se encuentra listo para libre ejecución y poder optimizar tiempo.
- EL contratista ha venido haciendo trasiego de material para ejecución de obra (acero y material pétreo)

COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
El constructor se compromete a que en un mes terminar la excavación lo cual compete a uno de los preliminares del proyecto.	CONSTRUCTOR	30 DE MAYO	
El constructor se compromete a realizar cimentación a partir del 26 de mayo.	CONSTRUCTOR	26 DE MAYO	


[Handwritten signatures and initials]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 12 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 3 de 3
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 25/06/2024

La ESE se compromete a supervisar el desarrollo de la ejecución de la ejecución y la alimentación	HOSPITAL CENTRO ESE DEL MUNICIPIO DE PLANADAS	30 DE MAYO Y 26 DE MAYO	
			

Como constancia, se firma por los asistentes a los 23 días del mes de abril de 2025, en el municipio de PLANADAS a las 10:50 am


NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
LUIS CARLOS ROMERO COLMENARES	
CELSO ROMAN GONZALEZ	
DAVID DIAZ	
LORENA RIVERA CAMACHO	
RONNY GONZALEZ	
ROBINSON JAVIER RIOS	
FRANCISTO ANTONIO ZAPATA MEDINA	
CRISTIAN CAMILO	
SANTIAGO RICO PAEZ	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 13 DE 30
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 14 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

15 de mayo

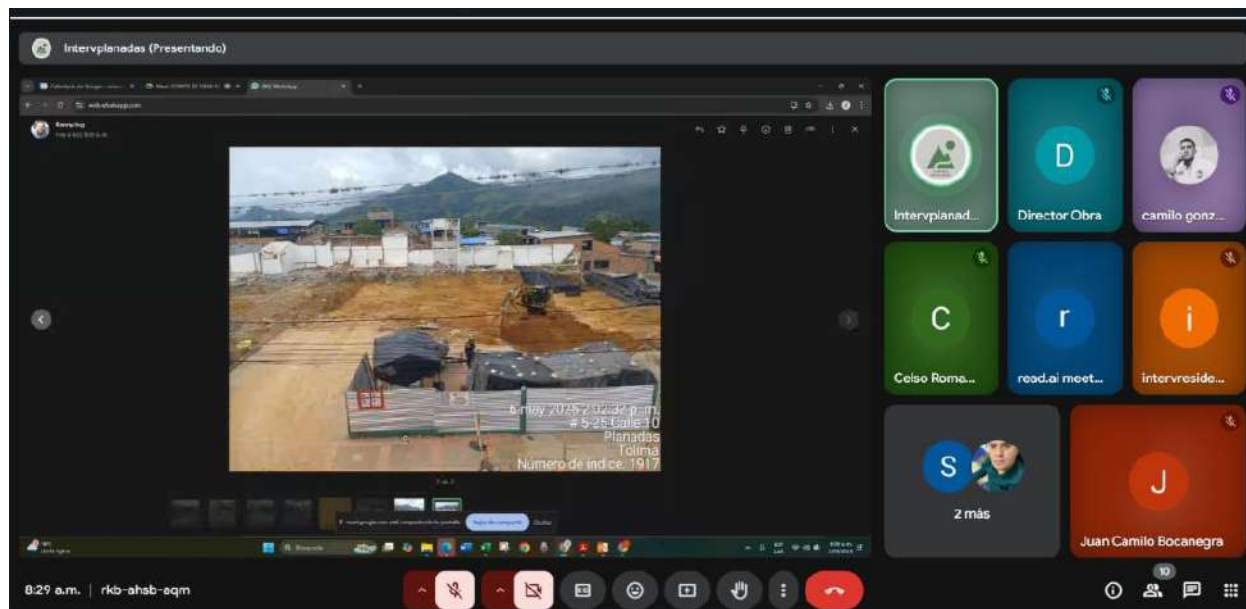

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 15 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO:
INS-PD-001
VERSION: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL
DESARROLLO

PÁG. 16 DE 30

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-
EJECUTOR TOLIMA.

VIGENTE DESDE:
28/06/2022




28 de mayo

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 17 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 18 DE 30
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

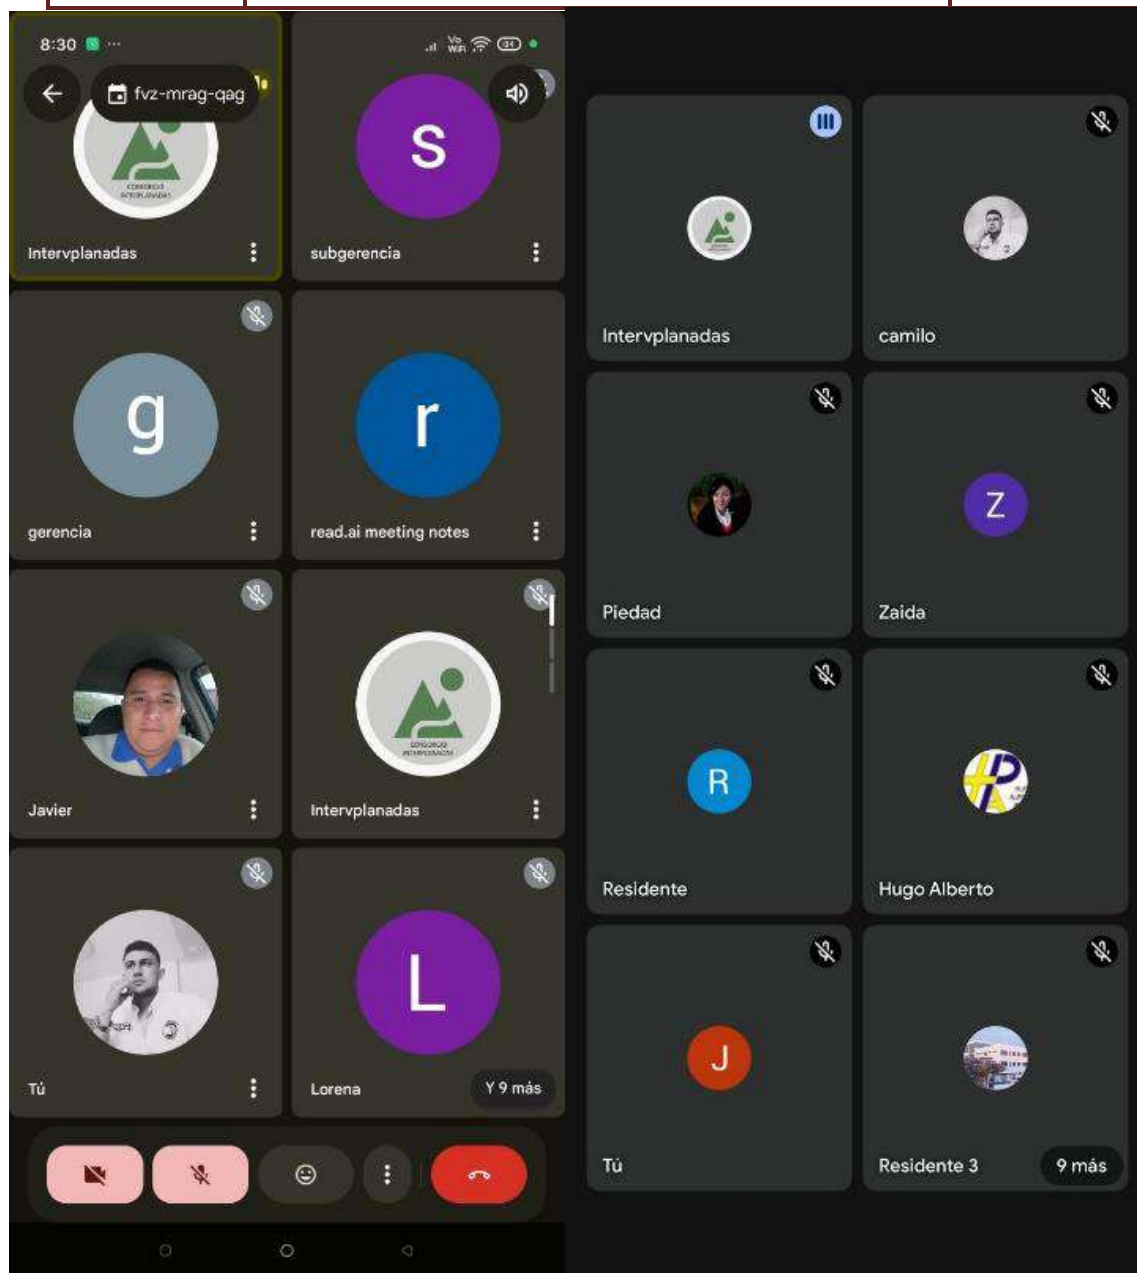

Secretaria de Salud
Reportado por: ARQ. Cristhian camilo gonzalez diaz – ARQ. Juan camilo Bocanegra).
Apoyo al seguimiento del

14 de julio



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO:
INS-PD-001
VERSION: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL
DESARROLLO

PÁG. 19 DE 30

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-
EJECUTOR TOLIMA.

VIGENTE DESDE:
28/06/2022

Salud	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

Acta N°		Fecha: (2)			
Objetivo: (3)					
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: (4)					
Lugar: (5)					
Lider de la reunión: (6)					
Hora Programada: (7)		Hora de Inicio: (8)	Hora de Terminación: (9)		
De: / / A: / /					
N°	Nombre* (10)	Cargo (11)	Dependencia o entidad (12)	Asiste (13)	
				SI	NO
1	RODRIGO ROMERO	DIR. CBH	PROBIO CARRERA HCP	X	
2	Marcela Rivera C	Paralela de	consorcio centro Hosp	X	
3	ZAIDA ALVAREZ N.	R.L.	consorcio centro Hosp	X	
4	Esteban Juan Alva V	Asesor P. Alcantara	HCP	X	
5	Luisa Jaramila	Gerente	Hospital Centro Planes	X	
6	Walter Alvarado	Gerente	HCP	X	
7	Juan Carlos Barona	Contabilista	Secretaria de salud	X	
8	German Camilo Gonzalez Diaz	Contabilista ARA	Secretaria de salud	X	
9	Piedad Mejia Davis	Gerente	SIU - HCPs	X	
10	Juan Carlos G	RI Intervent	Intervent	X	
11	David Hernandez	Subdirector	SIU - HCPs	X	
12	Yenny Gutierrez	Subgerente	Hospital Planes	X	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO:
INS-PD-001
VERSION: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL
DESARROLLO

PÁG. 20 DE 30

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-
EJECUTOR TOLIMA.

VIGENTE DESDE:
28/06/2022

PROCESO

SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL

Código:

ASIFG

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN

Versión:

01

ORDEN DEL DÍA (14)

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Revisión de compromisos pendientes
5. Desarrollo de los temas

6. Observaciones y conclusiones
7. Establecimiento de compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (15)

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:

4. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES:

N°	Actividad (16)	Responsable (17)	Cumple (18)		Observaciones (19)
			Si	NO Nueva fecha:	
1			☐	☐	
2			☐	☐	
3			☐	☐	
4			☐	☐	
5			☐	☐	
6			☐	☐	
7			☐	☐	
8			☐	☐	
9			☐	☐	
10			☐	☐	

5. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se da inicio a la reunión con la Presentación de los
asistentes a la mesa técnica, conformada en la reunión
con el personal y el subdirector de Infraestructura.
La ingeniera Piedad Mejía informa que la programación
anunciada al grupo por parte de la ESE, de una reproducción



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO:
INS-PD-001
VERSION: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL
DESARROLLO

PÁG. 21 DE 30

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-
EJECUTOR TOLIMA.

VIGENTE DESDE:
28/06/2022

salud

PROCESO

SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL

Código:

ASIF08

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN

Versión:

01

Primeros y más por favor, para el cumplimiento del objeto
concretado, con avances de la más cerca, lo que ha sido a
atrasar una propuesta de las actividades contractuales de
de la programación se han ido en cuenta los 18 meses de ejecución
del contrato. Sin embargo, la justificación del contrato
una sola fase (adquisición) y se debe se tiene pendiente la
entrega del Proyecto de 17-03-2026 y no a 17-03-2026. Como se ha
la Suplente del Consejo Hospitalario 2024, como se ha
diciendo que la obra tiene esta programación y que la
fecha el Proyecto se va de mano normal y con el personal
en obra.
El gerente de la ESE De Parques Impulso Impulso, diciendo que
se han ido, diciendo se la ha regulado el contrato y el cumplimiento
de las actividades contractuales. Pero Suplente Suplente con la obra
no avanza, porque en obra que la ESE ha regulado el contrato
como desarrollo de tres fases del contrato y entonces, por parte de la ESE
la Subcontrata del contrato de. Pero como este contrato es
dentro de los estados y dentro de la ESE en ciertos aspectos
como mano, una junta contractual, etc, mostrando el informe que
además de la Supervisión del contrato en el mes de marzo, de 140
menos, como un Subcontrata personal no permite en donde quedará
que las obras del CESTI. Hay un sobrecosto aproximado de 140 millones
el cual debe ser visto por el personal de la Supervisión del
Proyecto, a la fecha de ejecución de la ESE. Hay que tener en
cuenta el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra en donde
hay observaciones y no a los de algunos temas temas del contrato
y aceptando algunas observaciones.

El desarrollo del contrato también tuvo intervención del arquitecto
los cinco temas en donde explican los temas tratados. Hay
las obras contractuales de obra en la ejecución del CESTI y la
construcción de obras nuevas dentro del mismo CESTI, además de las
provisiones que se la fecha para el proyecto con la factibilidad
de obra factibilidad, además de los documentos que el proyecto
de obra factibilidad, además de los documentos que el proyecto
de obra factibilidad, además de los documentos que el proyecto

En conclusión y una vez concluido la obra, el Hospital de
Salud y Protección Social Continúa instalando en el área de
obra la obra que se va a hacer, el proyecto y una vez concluido
el desarrollo del contrato, en donde se establece que cada año

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES ()

7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

Nº	Actividad ()	Responsable ()	Fecha Límite	Observaciones
1				
2				
3				



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO:
INS-PD-001
VERSION: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL
DESARROLLO

PÁG. 22 DE 30

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-
EJECUTOR TOLIMA.

VIGENTE DESDE:
28/06/2022

PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

Se discute, en la reunión - con la asistencia de los representantes de las entidades y municipios independientes, se tiene en cuenta el desarrollo de la obra, se indica en la declaración de cumplimiento del contrato de obra y se presenta a la legislación de la entidad, para la devolución de los recursos, en donde se indica el Valor Departamental del Proyecto, incluyendo un presupuesto detallado con todos y cada uno de los costos directos e indirectos para la ejecución del proyecto y se presentará como un concepto de variación en el presupuesto de salud y protección social.

Se documenta el proceso a la ESE Hospital Centro Planalto de manera oficial en donde se documenta la información de la declaración de cumplimiento y la aplicación de medios corporales lo establece el contrato de obra.

Se actúa una vez finalizada el centro que para de la ESE, donde se indica que la ejecución del contrato se ha pasado a normalización en la entidad que los recursos fueron recibidos de la entidad y que a la fecha han aproximadamente 14 personas laborando en obra.

Los representantes de la Secretaría de Salud del Tolima, asistidos por los señores Camilo Gargueta, una vez escuchada la presentación de la entidad, se indica que la entidad se encuentra en la entidad que realiza el MSP.

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES (2)

7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

Nº	Actividad (2)	Responsable (2)	Fecha Límite (2)	Observaciones (2)
1	Creación de un plan de desarrollo	WSP	15-06-2022	
2	De cumplimiento y ejecución			
3	De la entidad de la ESE			

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 23 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

(5)

Salud	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


 Nombre y firma de quien preside la reunión
 Eng. Piedad Mejía Benítez


 Gerente Hospital


 RL Colegio Centro Hospitalario 2024


 Nombre y firma de quien elabora el acta
 Eng. Piedad Mejía Benítez


 Eng. Jairo García G.
 RL Interventor



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 24 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

25 de julio

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág: 1 de 9
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.		FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	10:00 AM
			25	07	2025		

OBJETIVO DE LA REUNION:	"LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA"
LUGAR:	SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO
REDACTADA POR:	CRISTHIAN CAMILO GONZALEZ DIAZ

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
CRISTHIAN CAMILO GONZALEZ DIAZ	CONTRATISTA	SECRETARIA DE SALUD DEP TOLIMA
JUAN CAMILO BOCAENGRA SERRANO	CONTRATISTA	SECRETARIA DE SALUD DEP TOLIMA
SANTIAGO RICO PAEZ	CONTRATISTA	SECRETARIA DE SALUD DEP TOLIMA
FRANCISCO ANTONIO ZAPATA MEDINA	GERENTE	HOSPITAL PLANADAS
LUIS CARLOS ROMERO COLMENARES	CONSTRUCTOR	DIRECTOR
JAIR GARCIA GARCIA	ARQUITECTO	INTERVENTORIA INTERPLANADAS
ROBINSON JAVIER RIOS	INGENIERO	SUPERVISON HOSPITAL
YEINY GUTIERREZ AGUIRRE	SUBGERENTE	HOSPITAL PLANADAS

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 25 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 2 de 9
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los Asistentes
2. Recorrido por la obra.
3. Estado actual del proyecto avances.
4. Socialización técnica en oficina del gerente del hospital.

DESARROLLO DE LA REUNION:

Siendo las 10:00 AM, nos reunimos de manera presencial, se realiza visita en la obra con el objeto de hacer el seguimiento del estado y avance de la obra del proyecto, **"LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO HOSPITAL CENTRO E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA"**


Se inicia la reunión con la presentación de los diferentes participantes por partes de las entidades.

Seguidamente del recorrido en obra se puede evidenciar un avance en todo el proceso de amarre de acero para, vigas de cimentación, columnas y muros de contención desde los tramos de los Ejes 5' al 12 y del A al F.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 26 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 3 de 9
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

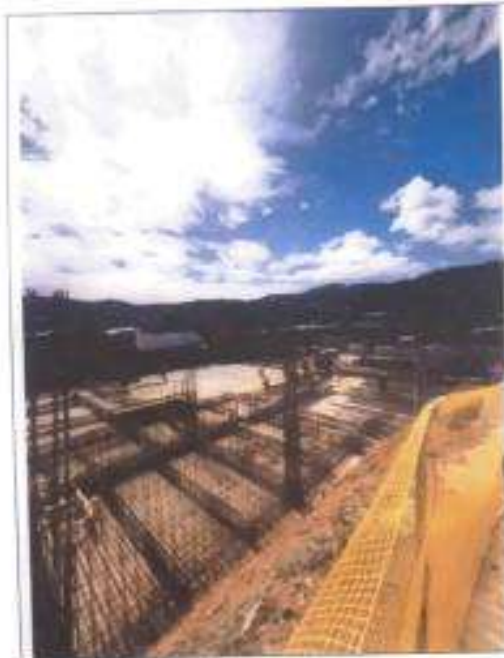

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 27 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 6 de 9
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014




Se evidencia una modificación formal por parte de la interventoría que hasta el momento se encuentra en proceso de aprobación, para las 14 zapatas más 6 del eje 5 del proyecto que presentaron una anomalía en el terreno no cuentan con piso de sustento.

Alonso

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 28 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 8 de 9
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

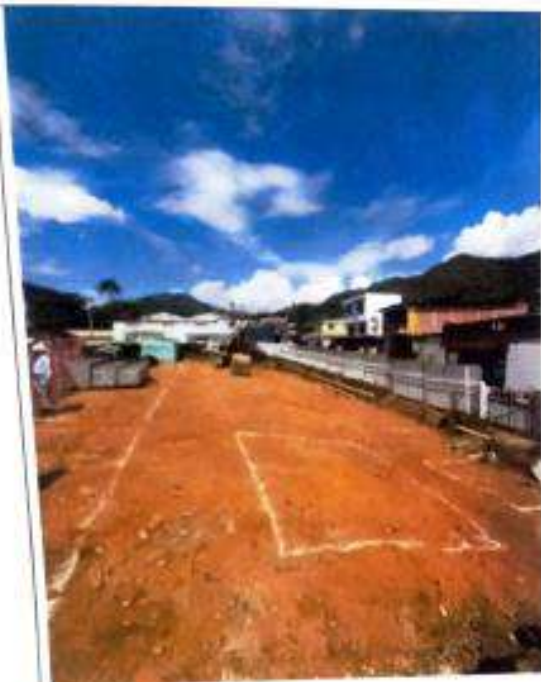

Se recomienda revisar las actividades que pueden que no estén contempladas dentro del contrato actual como, por ejemplo: obras exteriores (andenes y parqueaderos) tanque de agua e impermeabilizaciones. Al igual que muros de contención necesarios para la estructura del eje del 1 al 5 y del A al F.

Se realiza socialización técnica en la oficina de gerencial des hospital

Finaliza la reunión.

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 29 DE 30
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 9 de 9
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Presentar el Plan de contingencia para el avance del proyecto equivalente al 60% de la obra	Contratista interventoria	30 de Julio de 2025	

Como constancia, se firma a los diecisiete (25) días del mes de Julio de 2025, en el Gobernación del Tolima:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
CRISTHIAN CAMILO GONZALEZ DIAZ	
JUAN CAMILO BOCAENGRA SERRANO	
SANTIAGO RICO PAEZ	
FRANCISCO ANTONIO ZAPATA MEDINA	
LUIS CARLOS ROMERO COLMENARES	
JAIRO GARCIA GARCIA	
ROBINSON JAVIER RIOS	

Yeiny Gutierrez A

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 30 DE 30
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

30 de julio

meet.google.com/lzd-auzo-rzu

Director Obra (Presentando y anotando)



15:08 | lzd-auzo-rzu

Personas:

- Juan Camilo Hueje Ribe...
- Lorena Rivera
- Marcela Acosta
- Melissa Lasso
- Piedad Mejía
- Residente 3 Planadas
- SST Centro Hospitalario

3:08 p. m.
30/07/2023

meet.google.com/lzd-auzo-rzu

Personas:

- gerencia gerencia
- interplanadas_siso
- JAIME ALBERTO MORE...
- Jhoan Gutierrez
- Juan Camilo Bocanegra
- Juan Camilo Hueje Ribe...
- Marcela Acosta

14:36 | lzd-auzo-rzu

2:36 p. m.
30/07/2023
