

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 7
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
(P2S24MP9)	15 km de vía urbana mejorada en el marco de la estrategia vías para mejorar vidas	Kilómetros	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
10	7.226	15

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT (Dirección de Infraestructura)

Fecha del reporte: (05/05/2025)

Periodo de reporte: (01/01/2025 al 05/05/2025)

Tipo de soporte: Certificación firmada por el supervisor del proyecto (Archivo pdf)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	1
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 7
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	545.210
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente
2	se cumplió el 100% de la meta física, con una ejecución presupuestal acumulada hasta el 23 de abril de 2025, según lo descrito en el acta parcial de Obra No 04 de \$ 28.057.588.316,72, que corresponde a un porcentaje de ejecución de obra del 91,54%, respecto del valor total del contrato de \$30.648.964.799,64
3	Se realizó la pavimentación de 4346,70 ML, correspondiente a 27125,87 M2

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
Ibagué	El alcance del proyecto corresponde a la 4346,70 ML,	\$30.648.964.799,64

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001	
			VERSION: 01	
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 7	
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	correspondiente a 27125,87 M2.	
--	--------------------------------	--

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Se anexa certificación suscrita por el interventor del proyecto donde indica lo siguiente:

"el Contrato No 2869 de 2023 cuyo objeto es: CONTRATAR LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" cumplió con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales establecidas contractualmente, durante el período de ejecución comprendido entre el 10 de noviembre de 2023 hasta el 05 de mayo de 2025, en cual se cumplió el 100% de la meta física, con una ejecución presupuestal acumulada hasta el 23 de abril de 2025, según lo descrito en el acta parcial de Obra No 04 de \$ 28.057.588.316,72, que corresponde a un porcentaje de ejecución de obra del 91,54%, respecto del valor total del contrato de \$30.648.964.799,64. De la meta física contractual a la fecha se tiene un alcance respecto de la construcción de pavimento:

BARRIO	DIRECCIÓN	LONGITUD	ANCHO	AREA INCLUIDO DESCUENTOS	AREA TOTAL
LIBERTADOR	CALLE 3	57,04	6,14	344,90	2988,06
	CALLE 4	86,50	8,72	754,13	
	CALLE 4A	68,23	8,40	569,67	
	CRA 1A	146,64	7,71	1125,10	
	CALLEJON	36,27	5,84	194,26	
TIERRA LINDA	CARRERA 10 ENTRE CALLES 60 Y 64	238,91	7,51	1791,37	2536,83
	CALLE 64 ENTRE PRADERAS DE TIERRA LINDA Y CRA 10	115,00	6,50	745,46	
PEDREGAL	CARRERA 13 ENTRE CALLES 82 HASTA AV AMBALA	162,80	5,00	804,20	1048,64
	CALLE 84 ENTRE CRA 13 Y AV AMBALA	50,10	5,14	244,44	
RICAUARTE	CARRERA 118 ENTRE CALLES 20 Y 20B	159,6	7,95	1272,11	1272,11
CERROS DE GRANATE	CALLE 17 Y CALLE 18	626,00	5,71	3559,35	4031,25
	CALLEJON 1 ENTRE MZ L Y MZ K	38,10	2,07	78,87	
	CALLEJON 2 ENTRE MZ J Y MZ K	41,25	2,13	87,86	
	CALLEJON 3 ENTRE MZ I Y MZ J	38,80	2,15	83,42	
	CIADRA PARQUE PARTE ALTA	35,20	6,30	221,76	
PEDREGAL	CARRERA 12 CALLE 82,83,84	176,90	3,98	691,68	740,41
	Bahía Cra 12	22,15	2,20	48,73	
	VIA PRINCIPAL	124,01	6,00	750,58	
PUENTE CERROS DE GRANATE	BAHIA PARQUEADERO	12,50	4,98	62,31	853,23
	BOCACALLE	5,10	7,91	40,34	
ORQUIDEAS	CARRERA 11C ENTRE CALLES 75 Y 76	97,55	4,48	437,4	437,40
ARADO	CARRERA 4 SUR ENTRE CALLES 23A Y 24	133,54	6,97	929,8	929,80
RICAUARTE	DIAGONAL 14 CON CALLE 9D Y CALLE 15	141,34	7,97	1125,96	1125,96
CIUDADELA SIMON BOLIVAR		230,66	7,00	1592,19	3322,44
	CALLE 97A HASTA LA CALLE 100 CARRERA 4 SUR	230,66	7,20	1660,752	
				69,5	
SANTA HELENA	CARRERA 4A ENTRE CALLES 42 Y CALLE 40	179	7,00	1253,58	1253,58
MODELIA	CALLE 153 ENTRE CARRERA 8F BIS Y 8D	123,60	6,00	736,17	5944,17
	CALLE 153 ENTRE CARRERA 8D Y 8B	110,21	6,00	658,25	
	CALLE 153 ENTRE CARRERA 8D Y 8B	123,05	6,00	730,45	
	CARRERA 8B ENTRE CALLE 153 Y CALLE 159	598,51	6,00	3819,30	
RICAUARTE	CALLE 22 CON CARRERA 14 SUR	72,00	6,01	432,53	432,53
COLINAS DE ASPROVI	CARRERA 10A ENTRE CALLES 13 Y 14	65,48	3,20	209,47	209,47
TOTAL		LONGITUD INTERVENIDA 4346,70 ML		AREA 27125,87 M2	

Avance total proyecto: 4,346 Km


REPORTADO 2024: 3,09 Km

PRESENTE REPORTE: 1,256 Km

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 7
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ACLARACION: NO SE HABIA IMPACTADO EN LA VIGENCIA 2023, PORQUE NO PRESENTABA AVANCE DE PAVIMENTACIÓN. SE REPORTO EN LA VIGENCIA 2024 UN AVANCE DE 3,09 Km, POR LO TANTO, PARA EL SIGUIENTE REPORTE SE IMPACTA 1,256 Km.

CONTRATO INICIO EN LA VIGENCIA 2023, CON RECURSOS DEL CREDITO POR VALOR DE \$21.024.167.455,90 Y DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS POR LA FUENTE ASIGNACIONES DIRECTAS POR VALOR DE \$1.000.000.000, PARA UN TOTAL DE \$22.024.167.455,90; PARA EL AÑO 2024 SE REALIZO UNA ADICIÓN DE RECURSOS PROPIOS POR VALOR DE \$2.541 MILLONES Y RECURSOS DE REGALÍAS POR VALOR \$6.642, PARA UN TOTAL DEL CONTRATO DE \$30.649 MILLONES PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL MISMO, DANDO ALCANCE A LAS SIGUIENTES COMUNAS:

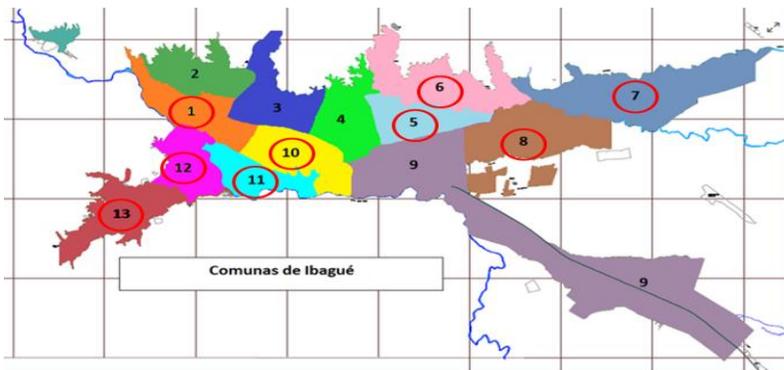

A CONTINUACION, SE EVIDENCIA UN REGISTRO FOTOGRAFICO:

TRAMO RICAURTE CARRERA 11B



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 5 DE 7
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

TRAMO LIBERTADOR CARRERA 1ª



TRAMO LIBERTADOR CALLE 3



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSION: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 6 DE 7
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

TRAMO PRADERAS DE TIERRA LINDA CARRERA 10




TRAMO PEDREGAL CARRERA 13 – AMBALA



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	VERSION: 01
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		PÁG. 7 DE 7
			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

TRAMO CERROS DE GRANATE CALLE 17

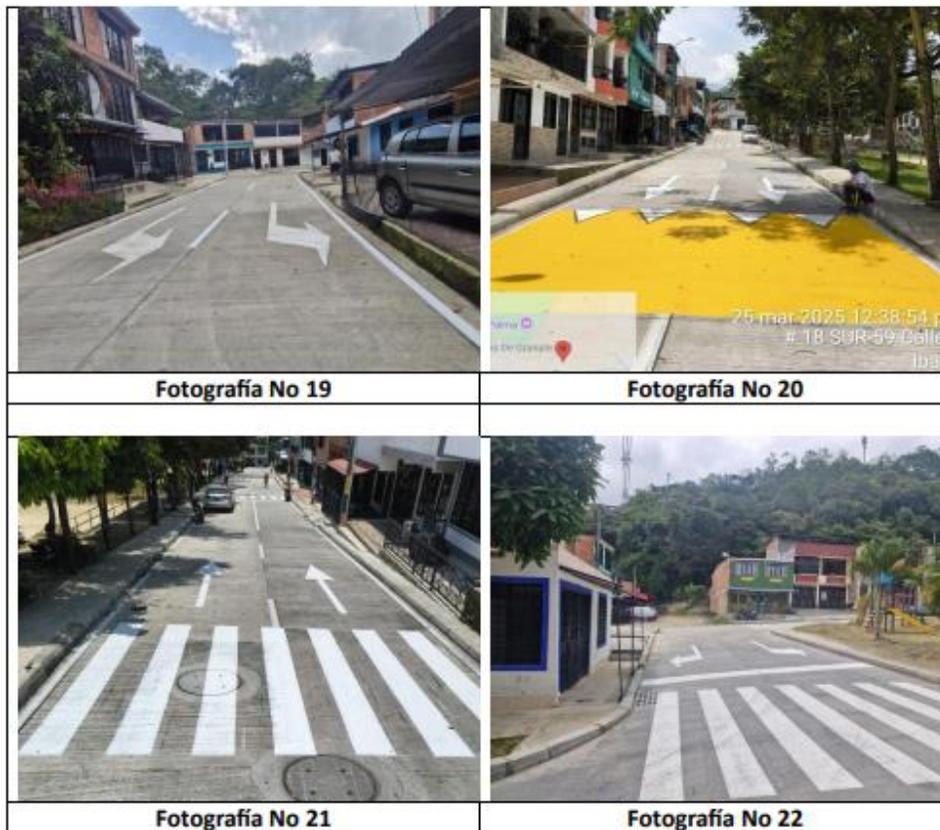

REPORTE TOTAL: 1,256 Km



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS

Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Reportado por: (JULIO CESAR GALLO ORTIZ - Supervisor)
