

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 1 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA

A. Información General

Dependencia responsable:	EDAT S.A. E.S.P OFICIAL
Código de la meta:	P1S40MP2
Nombre de la meta:	Cinco (5) Alcantarillados optimizados
Indicador de producto:	Número de alcantarillados optimizados
Tipo de Indicador:	Acumulado
Meta del Cuatrienio:	5

B. Información Específica de la Meta

METAPROGRAMA DA VIGENCIA	META ALCANZADA *	AVANCE DE EJECUCIÓN PARA ESTE CARGUE **	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO PARA LA VIGENCIA
4	3.70	0,84	4.54

*:Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información.

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0

**::De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

C. Definición de Tiempos de Reporte

Fecha del Reporte: (24/04/2026)

Periodo de Reporte: Abril

D. Relación de Soportes y Evidencias

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO o VIDEOS	X
CONTRATO/CONVENIO	
ACTA	X
INFORME	X
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Población Beneficiada

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	5
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son/solosi aplica)

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 2 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	540.598
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
GÉNERO	HOMBRE	
	MUJER	
	OTRO	
CICLOVITAL	(0-5 AÑOS)	
	(6-11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE VULNERABILIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
1.	Actividad ejecutada con proyecto: NOMBRE DEL PROYECTO*: Construcción ampliación y/o mejoramiento de acueductos y alcantarillados para comunidades y territorios en el departamento del Tolima BPIN: 2024004730118 ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: optimización de sistemas de alcantarillados sector urbano y rural DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: - Se liquidó la Interventoría de la obra cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE REHABILITACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES URBANAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". - Se encuentra en ejecución el proyecto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO SOBRE LA AV FUNDADORES DESDE LA MANZ 1 CASA 1 HASTA LA MANZ 5 CASA 5 DE LA URB EL TRIÁNGULO Y DE AHÍ HASTA LA CALLE 5 NÚM 10-77 DEL BARRIO LOS CÁMBULOS, ADEMÁS EN EL BARRIO CAMILO TORRES CALLEJÓN CIEGO ENTRE LA CARRERA 1 Y LA CALLE 11 A DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA en un avance del

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 3 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
75%	- Se encuentra en ejecución el proyecto REFORMULACIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE CHICORAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA con un avance del 80% donde se han realizado las siguientes actividades: Suministro e instalación de cama en triturado para atraque e=0,20 m: Suministro e instalación de cama en triturado para atraque para realizar filtro en el reactor UASB de la PTAR NP3.1 gavión: Se realiza gaviones como sostenimiento talud caja tormenta, gaviones laterales lado derecho reactor módulo 5 para sostenimiento de talud y Gaviones externos lote Héctor Villanueva. NP3.2 Relleno con material de recebo: Se realiza relleno con material de recebo en la zona del preliminar NP3.5 Refuerzo Malla electrosoldada: Se realiza refuerzo malla electrosoldada en la zona del preliminar-PTAR NP3.21 instalación de tubería PVC presión lisa 12" RDE21: se realiza suministro e instalación de tubería PVC presión lisa de 12" rde21 en la conexión entre la caja final del preliminar y los módulos del reactor uasb - El proyecto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” se encuentra terminado al 100% en proceso de liquidación. - Se suscribió acta de inicio al contrato de interventoría No. 054 del 16 de marzo de 2026 al proyecto “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “SANEAMIENTO BASICO DEL HUMEDAL LA HERRERUNA Y DE LA ZONA DE LA QUEBRADA LEMAYA INCLUIDA EN EL AREA URBANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR LEMAYA – FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUAMO – TOLIMA. el día siete (07) de abril de 2026. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Obras de construcción y/o mejoramiento de sistemas de alcantarillado, orientadas a garantizar la adecuada recolección, conducción y disposición de aguas residuales y/o pluviales, mediante la ejecución de actividades como instalación de redes, construcción de pozos de inspección, estructuras hidráulicas y demás componentes, conforme a los diseños y especificaciones técnicas aprobadas. En cuanto al estado de los proyectos, se evidencia que el municipio de Purificación presenta un avance aproximado del 75% en su ejecución; el proyecto del barrio La Libertad en Purificación se encuentra ejecutado al 100%; el proyecto del municipio de Ibagué se encuentra ejecutado y debidamente liquidado; el proyecto en Chicoral presenta un avance aproximado del 80%; y se registra el inicio de la obra en el municipio de El Guamo en el mes de abril de 2026. Se realiza seguimiento a los proyectos en ejecución y en etapa de inicio, con el fin de garantizar el cumplimiento de los cronogramas, la calidad de las obras y la adecuada ejecución contractual..

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 4 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

G. ACTIVIDADES REALIZADAS	
2.	Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la dependencia, no recursos de inversión. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: Se realiza seguimiento permanente, desde la entidad, a la ejecución de las obras de alcantarillado, verificando su cumplimiento conforme a los términos contractuales, cronogramas establecidos y especificaciones técnicas aprobadas. Así mismo, se efectúa monitoreo a los proyectos en sus diferentes estados, incluyendo los que se encuentran en ejecución, en proceso de inicio y los ya liquidados, revisando avances físicos, calidad de las obras, cumplimiento de obligaciones contractuales y estado de los procesos administrativos asociados, con el fin de garantizar la adecuada ejecución y funcionamiento de los sistemas de alcantarillado. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Seguimiento y control a los contratos de obra de alcantarillado, mediante la elaboración de informes de supervisión, en los cuales se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se revisa la ejecución de las actividades constructivas y se evalúan los avances físicos, técnicos y administrativos de los proyectos en desarrollo. A través de estos informes se deja constancia del estado de las obras, el nivel de cumplimiento frente a los cronogramas establecidos, la calidad de las actividades ejecutadas y las observaciones o recomendaciones a que haya lugar, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de los proyectos y el correcto funcionamiento de los sistemas de alcantarillado, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos de la entidad.

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto.

- Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.
- Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el recurso ejecutado
- Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

H. LOCALIZACIÓN(inversiónfocalizada)

MUNICIPIO	BIENYSERVICIO	VALOR*RP**
ROVIRA	ALCANTARILLADO URBANO	\$ 173.372.187,66
IBAGUE	REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES URBANAS DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 1. EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 13.151.615.569,54
PURIFICACIÓN	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION LA LIBERTAD EN EL	\$ 70.490.000,00

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 5 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

	MUNICIPIO DE PURIFICACION DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
PURIFICACIÓN	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO SOBRE LA AV FUNDADORES DESDE LA MANZ 1 CASA 1 HASTA LA MANZ 5 CASA 5 DE LA URB EL TRIÁNGULO Y DE AHÍ HASTA LA CALLE 5 NÚM 10-77 DEL BARRIO LOS CÁMBULOS, ADEMÁS EN EL BARRIO CAMILO TORRES CALLEJÓN CIEGO ENTRE LA CARRERA 1 Y LA CALLE 11 A DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 50.370.371,00
GUAMO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "SANEAMIENTO BASICO DEL HUMEDAL LA HERRERUNA Y DE LA ZONA DE LA QUEBRADA LEMAYA INCLUIDA EN EL AREA URBANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR LEMAYA – FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUAMO – TOLIMA	\$ 583.204.513,29
TOTAL, EJECUTADO		\$ 14.029.052.641,49

*:solosiaplica.

RP*:registropresupuestal.

I. EVIDENCIAS

Se anexa, acta de liquidación del Municipio de Ibagué, Informe de Chicoral, Registro fotográfico de MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO SOBRE LA AV FUNDADORES DESDE LA MANZ 1 CASA 1 HASTA LA MANZ 5 CASA 5 DE LA URB EL TRIÁNGULO Y DE AHÍ HASTA LA CALLE 5 NÚM 10-77 DEL BARRIO LOS CÁMBULOS, ADEMÁS EN EL BARRIO CAMILO TORRES CALLEJÓN CIEGO ENTRE LA CARRERA 1 Y LA CALLE 11 del municipio de Purificación

https://drive.google.com/drive/folders/13yKCK_zG1ivMHIRq_6tN3IXuS1-JL3VE?usp=sharing

- Registro Fotográfico Purificación

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 6 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 7 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

- Registro Fotográfico Chicoral

3.4.4 REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.11 Suministro e instalación de cama en triturado para atraque e=0,20 m

Suministro e instalación de cama en triturado para atraque para realizar filtro en el reactor UASB de la PTAR

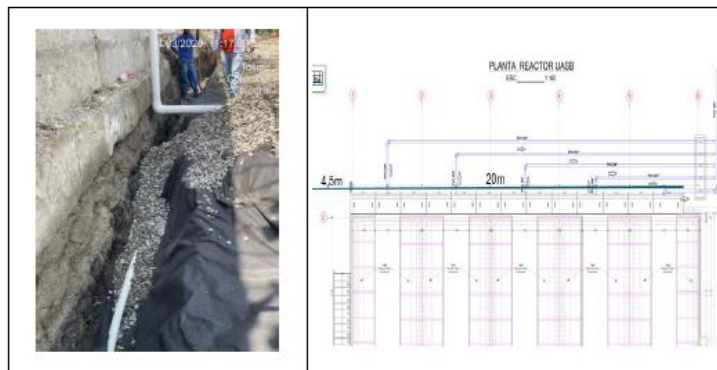

NP3.1 gavión

Se realiza gaviones como sostenimiento talud caja tormenta, gaviones laterales lado derecho reactor modulo 5 para sostenimiento de talud y Gaviones externos lote Héctor Villanueva



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 8 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

NP3.4 Anden en concreto 3000psi E=10cm
se realiza anden en concreto 3000psi en la zona del preliminar



NP3.20 suministro de tubería PVC presión lisa 12" RDE21
NP3.21 instalación de tubería PVC presión lisa 12" RDE21
se realiza suministro e instalación de tubería PVC presión lisa de 12" rde21 en la conexión entre la caja final del preliminar y los módulos del reactor uasb



NP 4.18 Suministro de Tee 6" PVC Presion
NP 4.19 Instalacion de Tee 6" PVC Presion



NP 4.20 Soporte en concreto para red interna de distribución (Incluye anclajes con epoxico).



"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional. Cualquier copia o impresión física se considerará un documento no controlado."

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-PE-001
			Versión: 02
	PROCESO:	PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL DESARROLLO	Pág. 9 de 9
	FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA		Vigente desde: 08/04/2026

Cordialmente,



RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO
DIRECTOR TECNICO EDAT SA ESP OFICIAL

Elaborado: Carolina Villanueva Muñoz

Revisado y Reportado por:

Cargado por:

Control de Cambios

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
28/06/2022	Primera Emisión Formal del Formato Único para el cargue de la información en el aplicativo Ejecutor Tolima	01
08/04/2026	Se actualizó la codificación del proceso y las tablas de información en el formato, asegurando consistencia, claridad y alineación con los estándares documentales vigentes	02
