

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 1 de 4****INFORME DE SUPERVISIÓN****GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción del presente informe, el supervisor técnico asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, desde la fecha de asignación.

Fecha: **06** de **Mayo** de **2025****INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

<b>CONTRATO</b>	<b>X</b>	<b>CONVENIO</b>	
<b>CONTRATO NÚMERO:</b>	4155	<b>De</b>	27/11/2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".			
<b>SUPERVISOR:</b>	JULIO CESAR GALLO ORTIZ		
<b>CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:</b>	UNION TEMPORAL MARV 4		
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	MIL DOSCIENTOS VEITIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$ 1.228.640.597,15). IVA INCLUIDO		
<b>ADICIONAL AL CONTRATO</b>	SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS (\$614.000.000,00). IVA INCLUIDO		
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$1.842.640.597,15) M/CTE IVA INCLUIDO.		
<b>DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:</b>	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION,		
<b>DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO</b>	CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS CALENDARIO contados a partir del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.		
<b>Fecha de Legalización:</b>	09 DE DICIEMBRE DE 2024		
<b>Acta de Inicio:</b>	10 DE DICIEMBRE DE 2024		

**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA****SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT****Pág. 2 de 4****INFORME DE SUPERVISIÓN****Fecha de Terminación Actual:****23 DE MAYO DE 2025**

**A. ESTADO A LA FECHA:** EL PROCESO A LA FECHA DE ESTE INFORME SE ENCUENTRA EN EJECUCION.

**B. RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMNISTRACION DEPARTAMENTAL:**

1. La fecha de inicio del contrato fue el día 10 de diciembre del 2024 y se encuentra en ejecución.
2. Se suscribió el Acta 001 (MODIFICATORIA), mediante la cual se aclaro el valor del CDP en la minuta, el cual había sido digitado erróneamente.
3. Se suscribió el Acta 002 (ACTA DE PRORROGA), mediante la cual se prorrogó el plazo del contrato por 45 días calendario, quedando un plazo de ejecución de 105 días calendario.
4. Se suscribió el Acta 003 (ACTA DE PRORROGA Y ADICION), mediante la cual se adiciona el contrato por un valor de SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS (\$614.000.000,00) y se prorrogó por SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, quedando un valor total de ejecución de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$1.842.640.597,15) M/CTE IVA INCLUIDO y un plazo total de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DIAS CALENDARIO contados a partir del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

**5. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA:**

- Con corte al 30 de Marzo de 2025 se ha realizado la siguiente intervención en vías a cargo del Departamento y a cargo del municipio.  
:
  - ✓ Se realizo un total de 24,5 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Segundo Orden a cargo del Departamento.
  - ✓ Se realizo un total de 24 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Departamento.
  - ✓ Se realizo un total de 272,75 Km de Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Municipio

**CONTRATO 4155 DEL 2024 - PERIODO 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2025****MANTENIMIENTO VIAL AÑO 2024 - 2025**

MUNICIPIO	VIA INTERVENIDA	FECHA DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	MAQUINARIA UTILIZADA	KM DE VIA INTERVENIDOS
LIBANO	LA HONDA	13 de Diciembre del 2024- 23 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Motoniveladora	5
	LA TRINA	13 de Diciembre del 2024- 23 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada,	2 Volquetas Vibrocompactador	
				Retroexcavadora Motoniveladora	1,5



# GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 3 de 4

## INFORME DE SUPERVISIÓN

			limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Vibrocompactador	
	LA ALCANCIA	03 de Enero del 2025 - 08 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Motoniveladora	5
				2 Volquetas Vibrocompactador	
	BULGARIA - LA LIMA	13 de Enero del 2025 - 17 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Motoniveladora	3
				2 Volquetas Vibrocompactador	
	LA GREGORITA - LA POLCA	18 de Enero del 2025 - 31 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Motoniveladora	3
				2 Volquetas Vibrocompactador	
	LA REGRESIVA - MESETA	15 de Febrero del 2025- 28de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	5,5
	LIBANO GATO NEGRO - MESETA BAJA	01 de Marzo del 2025 - 31 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	4
RIOBLANCO	DIAMANTE EL CEDRO	13 de Diciembre del 2024- 23 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Vibrocompactador	4
				2 Volquetas Retroexcavadora	
	LOS MANGOS	13 de Diciembre del 2024- 23 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Bulldozer	2
	DIAMANTE - BILBAO	02 de Enero del 2025- 31 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Motoniveladora	7
	HERRERA - LAS MERCEDES	24 de Febrero del 2025- 28 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Vibrocompactador	3
IBAGUE	VEREDA MONTAÑA	12 de Diciembre del 2024- 22 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	8
	PRADERA	10 de Diciembre del 2024- 12 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 1 Volquetas	0,2



# GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 4 de 4

## INFORME DE SUPERVISIÓN

	TAPIAS	02 de Enero del 2025- 31 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 1 Volquetas	3,4
	VEREDA APARCO	13 de Enero del 2025- 19 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	7,3
	VEREDA CHARCO RICO - SALITRE	23 de Enero del 2025- 31 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	5
	VEREDA CHARCO RICO - SALITRE	10 de Febrero del 2025- 21 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	16
	VEREDA ANIMAS EL GALLO	24 de Febrero del 2025- 28 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	2
	VEREDA ANIMAS EL GALLO	03 de Marzo del 2025 - 31 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	5
COYAIMA	GUAYAQUIL	13 de Diciembre del 2024- 23 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 1 Volquetas	3
CAJAMARCA	ANAIME POTOSI	13 de Diciembre del 2024- 23 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 2 Volquetas	2
	SAN LORENZO	02 de Enero del 2025- 09 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 2 Volquetas	2
	ANAIME POTOSI	13 de Enero del 2025- 31 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 2 Volquetas	4
	LOS TUNJOS	10 de Febrero del 2025- 21 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de Apoyo en el cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Volquetas	10
	LAS ORMAS	24 de Febrero del 2025- 28 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de Apoyo en el cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Volquetas	2
	ANAIME - POTOSI	03 de Marzo del 2025 - 31 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de Apoyo en el cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 1 Volquetas	12
RONCESVALLES					4



# GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 5 de 4

## INFORME DE SUPERVISIÓN

	PLAYA RICA RONCESVALLES	13 de Diciembre del 2024- 22 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora Motoniveladora	
				2 Volquetas Vibrocompactador	
	PLAYA RICA RONCESVALLES (BRUCELAS)	02 de Enero del 2025- 31 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	6
	GUADALITO - PANDO - ORQUIDEAS - LAS BISAS	16 de Febrero del 2025- 28 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Bulldozer	22
	VEREDA SAN MARCOS	17 de Febrero del 2025- 25 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	2
	VEREDA LA PLATINA	27 de Febrero del 2025- 28 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	1
	RONCES VALLES - LA MORENA	02 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	0,3
	RONCES VALLES - EL ORIENTE	03 de Marzo del 2025 - 04 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	2
	ROVIRA - EL REAL	12 de Marzo del 2025 - 16 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	3,5
	EL REAL - HATO VIEJO	17 de Marzo del 2025 - 25 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	2 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	6
EL SILENCIO LA ESTRELLA EL TOPACIO TOLDA VIEJA LAS PAVAS LA NUTRIA EL CEDRO LA PLATINA	01 de Marzo del 2025 - 27 de Marzo del 2025	Se realizo la atencion de emergencia, remocion de derrumbe para habilitacion paso vehicular y solucion pasos criticos.	Bulldozer	28,5	
PRADO - CUNDAY	VIA TRONCAL DEL NORTE	11 de Diciembre del 2024- 23 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2
	MONTENEGRO PARTE BAJA	11 de Diciembre del 2024- 23 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	2



# GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 6 de 4

## INFORME DE SUPERVISIÓN

	CHICALA	03 de Enero del 2025- 09 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3
	MONTENEGRO PARTE BAJA	13 de Enero del 2025- 23 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	4
PRADO - DOLORES	PRADO - DOLORES	19 de Febrero del 2025- 27de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	4
	PRADO - DOLORES	03 de Marzo del 2025 - 07 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3
	MALTA - LA PIEDRA EL NUEVE	08 de Marzo del 2025 - 31 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	9
VILLARICA	EL CRUCERO - TRONCAL OCCIDENTE	12 de Marzo del 2025 - 27 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	1 Volquetas Retroexcavadora Vibrocompactador Motoniveladora	3
	CUINDE BLANCO - TRONCAL OCCIDENTE	18 de Marzo del 2025 - 27 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	1 Volquetas Retroexcavadora	2
PLANADAS	LA ESTRELLA	20 de Enero del 2025- 31 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Retroexcavadora 2Volquetas	4
	PLANADAS VELLA VISTA	10 de Febrero del 2025- 21 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	4
	PLANADAS - LA ESTRELLA	24 de Febrero del 2025- 28 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	1,5
	LA ESTRELLA - JASMINIA EL MADRONAL	03 de Marzo del 2025 - 10 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	5
	EL RUBY - PLANADAS	11 de Marzo del 2025 - 13 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3



# GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 7 de 4

## INFORME DE SUPERVISIÓN

CHAPARRAL	EL RECREO	20 de Enero del 2025- 31 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Bulldozer	5
	GUAINI - AMOYA	24 de Febrero del 2025- 28 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	3
	EL RECREO	25 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Bulldozer	3
	GUAINI - AMOYA - CHAPARRAL	01 de Marzo del 2025 - 31 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas, cargue y descargue de material explotado para extender sobre la via.	Motoniveladora Retroexcavadora 2Volquetas	12
ARMERO	ARMERO	11 de Diciembre del 2024- 21 de Diciembre del 2024	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas.	Retroexcavadora 1 Volquetas	0,65
ATACO	EL VISO	17 de Febrero del 2025- 21 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas.	Retroexcavadora 1 Volquetas	5
	LA HAMACA - LAS CRUCES	24 de Febrero del 2025- 28 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas.	Retroexcavadora 1 Volquetas	4
	LAS AMACAS LAS CRUCES	01 de Marzo del 2025 - 6 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas.	Retroexcavadora 1 Volquetas	3
	SAN ANTONIO - LAS CRUCES	10 de Marzo del 2025 - 31 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion de cunetas.	Retroexcavadora 1 Volquetas	2
ALPUJARRA	SAN ISIDRO - ARADA - SAN LUIS	18 de Enero del 2025- 28 de Enero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion .	Retroexcavadora 1 Volquetas	17
FALAN	SANTA ROSA - CLARAS	11 de Febrero del 2025- 20 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion .	Retroexcavadora	2
	ALTO DEL OSO	27 de Febrero del 2025- 28 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion .	Retroexcavadora	2,5
ALVARADO	LA GUNETA - VALLECITA	24 de Febrero del 2025- 28 de Febrero del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion .	Retroexcavadora 1 Volquetas	2,4
	ALVARADO -LA GUNETA	03 de Marzo del 2025 - 12 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion .	Retroexcavadora 1 Volquetas	5
	ALVARADO - LA GUARUMA	13 de Marzo del 2025 - 25 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion .	Retroexcavadora 1 Volquetas	4
	ALVARADO - LLANITOS	26 de Marzo del 2025 - 27 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion .	Retroexcavadora 1 Volquetas	1
MARIQUITA	EL MERCADO – LA MESA - CAMELIAS - GUACAS	03 de Marzo del 2025 - 31 de Marzo del 2025	Se realizaron actividades de conformacion de la calzada, limpieza y ampliacion .	Retroexcavadora 1 Volquetas	10



# GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Pág. 8 de 4

## INFORME DE SUPERVISIÓN

Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Segundo Orden a cargo del Departamento	24,5
Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Departamento	24
Mantenimiento y/o mejoramiento de vías de Tercer Orden a cargo del Municipio	272,75


### C. PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:

PORCENTAJE DE EJECUCION A CORTE 30/03/2025	85 %
--	------

El presente informe se emite para detallar las actividades realizadas en la ejecución del Contrato N° 4155 de 2024.

### D. REGISTRO FOTOGRAFICO:

#### Municipio de Rioblanco

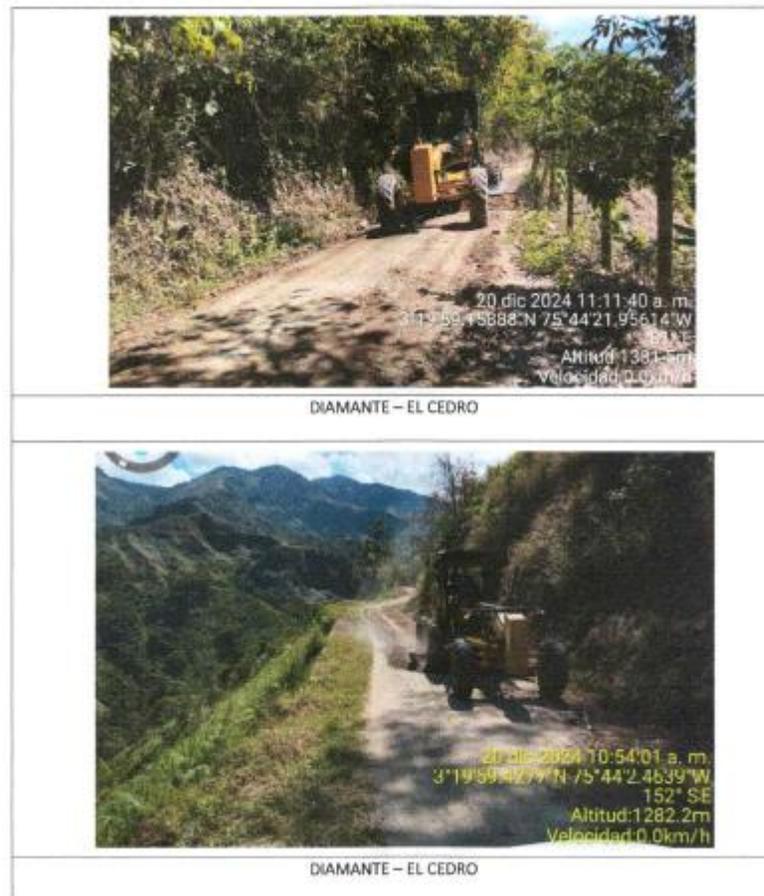



INFORME DE SUPERVISIÓN



DIAMANTE – EL CEDRO



DIAMANTE – EL CEDRO



LOS MANGOS



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio del Líbano



LA HONDA



LA HONDA



LA TRINA



LA TRINA



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Ibagué



IBAGUE



IBAGUE



IBAGUE



IBAGUE



INFORME DE SUPERVISIÓN


Municipio de Roncesvalles



BRUSELAS



BRUSELAS

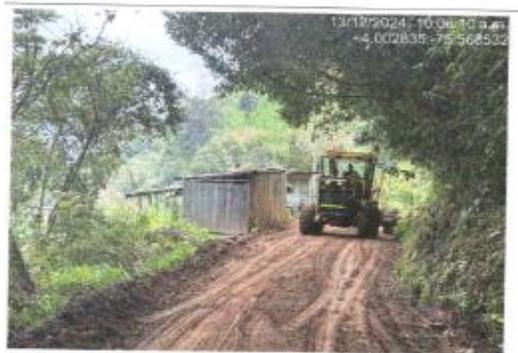

BRUSELAS



BRUSELAS



INFORME DE SUPERVISIÓN

Municipio de Cajamarca



ANAIME - POTOSI



ANAIME - POTOSI



ANAIME - POTOSI



ANAIME - POTOSI



ANAIME - POTOSI



Sebastian Ortiz P.

**JULIO CESAR GALLO ORTIZ**  
Supervisor del Convenio  
Director de infraestructura-SIH

**JUAN SEBASTIAN ORTIZ PEÑUELA**  
Apoyo a la Supervisión
