


 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR			 el Tolima nos une
	SECRETARÍA DE SALUD			
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN			


CÓDIGO PROYECTO:	2021004730106	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Prestación de servicios de salud		
PROYECTO:	Fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud en el departamento del Tolima		
OBJETIVO:	Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad de la prestación en servicios en salud en el Tolima		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP46	Ejecutar iniciativas priorizadas en el Plan de Acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y Salud Rural	3	3

DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	MARTHA JOHANA PALACIOS URIBE	RESPONSABLE DE META	
		GLORIA E VARGAS M	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	MIGUEL MUÑOZ	RESPONSABLE DE REPORTE	
		ESTEFANY MORAN	
PERIODO DE CARGUE	01-ene-22	FECHA DE CARGUE	23-nov.-2022
	23-nov-22		

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
Asesoría asistencia técnica y/ o cofinanciación a una (1) ESEs en iniciativas priorizadas y gestionadas de municipio PDET y estrategia de salud rural.	3	3	100,00%
2,021E+12			

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES		AVANCE FÍSICO DE META	
Asesoría asistencia técnica y/ o cofinanciación a una (1) ESEs en iniciativas priorizadas y gestionadas de municipio PDET y estrategia de salud rural. 2,021E+12 0 0 0 0 0		Atraso	0,00%
		Avance Físico	100,00%
		AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
		\$ 150.000.000	\$ 150.000.000
		Proporción de Ejecución	100,00%



FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS	
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	RENTAS CEDIDAS	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO
Transferencias			150.000.000		
Regalías		REGALÍAS			
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ
					ÁREAS AMBIENTALES
OTROS					

GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO	CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA, PARA DESARROLLO DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN AMBULANCIAS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO PARA EL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.				
2609						
CONTRATISTA	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA.			VALOR	150.000.000,00	
LINK DE ACCESO	Proceso de Contratación CD-2022-CONV-2481			AVANCE FÍSICO	57%	
CDP	3944 de 27 de julio de 2022	RP	9723 de 2 de septiembre de 2022	AVANCE FINANCIERO	75.000.000,00	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO					
CONTRATISTA				VALOR		
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO		
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	-	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO					
CONTRATISTA				VALOR		
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO		
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO		

EJECUCIÓN CONTRACTUAL						
No.	OBJETO					
CONTRATISTA				VALOR		
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO		
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO		

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor Inversión	

					Inversión	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	


EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.					
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte	
15/03/022	Visita Tecnica	VISITA DE OBRA LICITACIÓN PUBLICA LPO - 2021 - 294 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL MARÍA INMACULADA DE RIOBLANCO POR FASES RIOBLANCO	Direccion de Oferta - SST; Alcaldia Municipal - Hopital Maria Inmaculada	Acta de Reunion	
04/11/2022	Asitencia tecnica	REVISION ESQUEMA PROPUESTA NUEVO HOSPITAL PARA EL MUNICIPIO DE PLANADAS	Direccion de Oferta - SST - Hopital Centro Plandas, consultor Hospital	Acta de Reunion	
21/06/2022	Mesa Técnica	MESA TÉCNICA PARA ORIENTACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE CHAPARRAL	Equipo de la Secretaría de Salud, Personal de Salud del Hospital.	Acta de Reunion	


PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

GLORIA E. VARGAS M.


VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
 Directora Administrativa Oferta de Servicios

GLORIA ESPERANZA VARGAS MELENDRO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – DIRECCIÓN OFERTA DE SERVICIOS
 SECRETARIA DE SALUD DPT.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 2de 3
ACTA DE VISITA			

ORDEN DEL DIA:


- Identificación del sitio de Intervención.
- Recorrido.

DESARROLLO DE LA REUNION:

- Se da inicio a la Visita de Obra Licitación Publica LPO -2021 – 294, proyecto Construcción del nuevo hospital María Inmaculada de Rioblanco por fases, realizando Identificación del sitio de Intervención.
- Seguidamente se realiza un recorrido en compañía de los funcionarios de la Alcaldía Municipal y del Hospital, teniendo en cuenta que no se presentaron posibles oferentes; se hace la recomendación a la administración Municipal de la gestión que se debe realizar de la prórroga de la licencia de construcción del proyecto que se vence el 08 de mayo de 2022 y debe estar vigente en el momento de inicio de las obras.
- Se informa a la Administración Municipal y el Hospital, que, para el inicio de la obra, deben tener dispuesto el sitio de reubicación de los servicios de la primera etapa de la construcción de la Obra, teniendo en cuenta que la fecha estimada de adjudicación según el cronograma del proceso es el 18 de mayo de 2022 con la firma del correspondiente contrato.
- Se culmina la presente visita con la firma de la presente acta de visita al sitio del proyecto.
- No se presentaron preguntas por parte de los funcionarios que asistieron.


COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Reubicación de los servicios de la primera etapa	Hospital	18 de mayo de 2022	Realizar todos los trámites Administrativos y técnicos
Prórroga de la licencia de construcción	Alcaldía - Hospital	02 de mayo de 2022	Antes de su vencimiento que es el día 08 de mayo de 2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 3 de 3
	ACTA DE VISITA		

Como constancia, se firma por los asistentes a los 15 días del mes de marzo de 2022, en el Municipio de Rioblanco Tolima:

NOMBRE	APELLIDO	FIRMA
Lida Jazbleidy Vann.	Vann mona	Lida Vann
Jose Francisco	Castañeda Delgado	JF
Fuente Humberto NAVARRO	NAVARRO DIAZ	Fuente Navarro
Maria Myrzancker Lat.	Latone Perez.	Maria Latone

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 1 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.		FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	3:00 pm
			4	11	2022		

OBJETIVO DE LA REUNION:	REVISION ANTEPROYECTO NUEVO HOSPITAL PARA EL MUNICIPIO DE PLANADAS
LUGAR:	Secretaria de salud – Gobernación del Tolima
REDACTADA POR:	Gloria E Vargas M

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Diógenes Salazar	Asesor	Hospital Centro Planadas
Marlivi Salazar	Gerente	Hospital Centro Planadas
Hugo Parra H	Arq Consultor	Consultor Hospital Centro Planadas
Gloria E Vargas M	P.U	Dirección Oferta SST
Felipe H. Navarro	P.U Apoyo	Dirección Oferta SST

ORDEN DEL DIA:
<ul style="list-style-type: none"> - Presentación proyecto - Desarrollo Mesa técnica al proyecto

DESARROLLO DE LA REUNION:
<p>El arquitecto Hugo Parra presenta del anteproyecto arquitectónico del proyecto para la Construcción del nuevo Hospital Centro de Planadas</p>



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

ACTA DE REUNION

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

Pág. 2 de 5

**Vigente desde:
04/08/2014**



HOSPITAL CENTRO
E.S.E.
PLANADAS - TOLIMA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS

Arq. Hugo Parra



Anteproyecto

Planta arquitectónica - Sótano y tanque de agua



HOSPITAL CENTRO
E.S.E.
PLANADAS - TOLIMA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS

Arq. Hugo Parra

Área total del lote: 3.395 m²
Área construida/Piso 1: 1879
Área total construida: 5025
Índice de ocupación: 59%
Índice de construcción: 1.70%



Anteproyecto

Planta arquitectónica - Piso 1



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

ACTA DE REUNION

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03


Pág. 3 de 5

**Vigente desde:
04/08/2014**



ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS

Arq. Hugo Parra

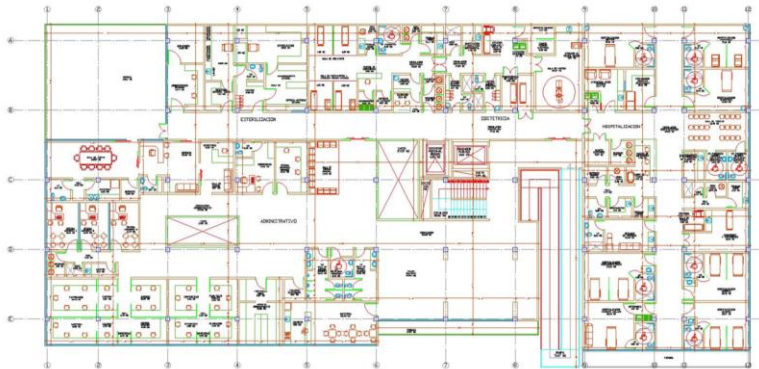


Anteproyecto

Planta arquitectónica - Piso 2




ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL E.S.E DEL MUNICIPIO DE PLANADAS

Arq. Hugo Parra

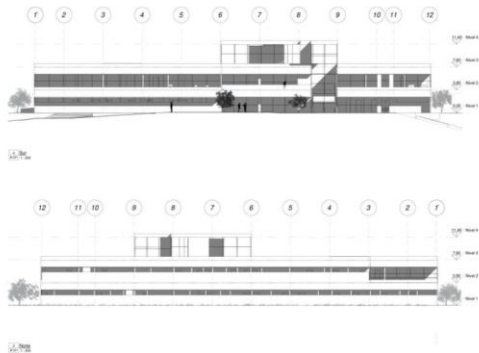

Anteproyecto

Fachadas Norte - Sur

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 4 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014




La arquitecta Gloria E Vargas de la DOS SST manifestó que se debe tener en cuenta las etapas de construcción y contar con el plan de contingencias.

La Gerente de la Institución manifestó que se seguirá prestando los servicios de urgencias, hospitalización y partos en la construcción actual y los demás servicios serán trasladados a una establecimiento que la alcaldía les entregue en comodato para la emergencia del covid,

La Arquitecta SST manifestó que se debe contar con el plan de contingencia valorados las adecuaciones y esto forma parte del valor del proyecto y quien asume en el proyecto estos valores de adecuación.

La arquitecta recomienda revisar en el servicio de urgencias las circulaciones ya que el

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 5 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

paciente crítico se encuentra transitando en el área de observaciones.
Revisar circulaciones de uso privado del paciente que es trasladado entre los diferentes servicios de urgencias, rx. Hospitalización y partos sin realizar cruce con los visitantes.
Revisar la circulación interna del personal asistencial y el apoyo como insumos, basuras alimentos.
Revisar el número de parqueaderos de acuerdo a las exigencias del esquema de ordenamiento territorial y así mismo revisar número de parqueaderos privados requeridos por el hospital.
El arquitecto consultor manifestó que revisara las observaciones para revisión y las remitirá por correo electrónico.

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Ajustar diseños de acuerdo a las recomendaciones	Hospital- Consultor	15 días	

Como constancia, se firma por los asistentes a los 4 días del mes de Noviembre de 2022:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Diógenes Salazar	Original firmado
Marlivi Salazar	Original firmado
Hugo Parra H	Original firmado
Gloria E Vargas M	Original firmado
Felipe H. Navarro	Original firmado


 La salud es de todos	PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	ASIF08
	FORMATO	Acta de Reunión	Versión	01

Acta N° (1)		Fecha: (2) 21-JUNIO-2022.	
Objetivo: (3) Mesa Técnica Hospital San Juan Bautista. Chaparral (Tolima)			
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: (4) Despacho Viceministro SGR.			
Lugar: (5) MSPS. - Piso 17.			
Líder de la reunión: (6) David Hernández Pinzón.			
Hora Programada: (7)		Hora de Inicio: (8)	Hora de Terminación: (9)
De: 09:00 / A: 12:00		09:00	

N°	Nombre* (10)	Cargo (11)	Dependencia o entidad (12)	Asiste (13)	
				SI	NO
1	Lorena Rivera G.	Contratista	Disentus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Eric Campos Angarika	Gerente Hosp. Ba	Hospital Chaparral	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Erica F. VARGAS R.	P.U.	SECRETARÍA SAJCO TOLIMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Osorio Román G.	Director	HOSPITAL CHAPARRAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Dennis Y. Cotaizal	Ing. Elect. MSPS-SGR	MSPS - SGR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Jairo Carrera A.	Contratista - SGR	MSPS - SGR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) firmada por los participantes.
Página 1 de 5

Fecha de Versión: 25 de julio de 2016

 La salud es de todos	PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	ASIF08
	FORMATO	Acta de Reunión	Versión	01

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Revisión de compromisos pendientes
5. Desarrollo de los temas:

6. Observaciones y conclusiones
7. Establecimiento de compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:

4. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES:

N°	Actividad (16)	Responsable (17)	Cumple (18)			Observaciones (19)
			Si	NO	Nueva fecha:	
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

5. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se allega el proyecto en memoria donde se evidencian los cambios sugeridos de esta manera. Se revisan los estudios técnicos de Ingeniería. así Hidrosanitaria

Se solicita instalar el sistema de instalaciones sanitarias con el fin de

 	PROCESO FORMATO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Acta de Reunión	Código Versión	ASIF08 01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

liberar la zona y de esta forma. incluir capas de especimen.

detalle de Conexiones domiciliarias No se evidencian.

todas las capas y elementos. Dispuestos en la planimetría deben tener Cotas y Cotas de entrada y salidas. y porcentajes de Pendiente.

Se recomienda. Codificar y Referenciar los detalles de todos los tanques con el fin que queden detallados cada uno de estos tanques

Estado de Suelos.

Plano de localización de Sondeos. incluir

en sanitario e hidráulico. Se solicita que los elementos dispuestos en estos. Ingenieros sean coherentes con la Arquitectura.

Se solicitara coherencia y Numeración más Distancia entre ejes y demás elementos.

La Codificación de los Detalles de los Muros de Contención no son Claras.

Se solicita. Ser más riguroso con esta Numeración y Codificación.

Se solicita Claridad. con el ciclopeo que ocupa el terreno. en las Paralelas de las zapatas.

A.A.I.M.


1. Se solicita que las plantas sean legibles.

Se solicita que los elementos y Equipos de Aire acondicionado que están dispuestos en las cubiertas, se evidencien en todos los esquemas que represente las Plantas de cubiertas.

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

Nº	Actividad (21)	Responsable (22)	Fecha Límite (23)	Observaciones (24)
1				
2				
3				
4				
5				

	PROCESO FORMATO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Acta de Reunión	Código Versión	ASIF08 01
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Se solicita que en las plantas Arquitectónicas estén Manifestadas las inclinaciones de losas de cubiertas con sus porcentajes y de la misma forma elementos que vayan dispuestos en esta.

tener en cuenta los desagues de elementos que generen Condensaciones

Se recomienda que la Arquitectura Sobre la que se genera todos los estudios técnicos de ingeniería se una única y Definitiva.

Arquitectura General.

Se recomienda que las plantas generales No contengan codificaciones de Puertas Ventanas o Muebles.

Se solicita tener en cuenta 6047 NTC. para unidades sanitarias PMR.

Se solicita que las UCI tengan Cortinas o un Cerramiento

Detalles Arquitectura.

Se solicita que el plano de cielo raso. contenga todos los elementos dispuesto en este. tales como luminarias, detectores, KA. etc....

Se solicita que se genere un Plano de Bordes de losa.

Se solicita Plano de localización con Códigos de Areas.

Componente Eléctrico

* Revisar o aclarar la ruta de la canalización de la red de M.T. en el plano E-13 ya que de acuerdo al dibujo estaría cruzando áreas de pacientes.

* Revisar el respaldo de la cadena de pino para los depósitos de vacunación.

* Presentar Memorial de responsabilidad de cada uno de los profesionales que intervinieron en el proyecto, con su M.P. y certificado de vigencia

* Coherencia entre diseño y presupuesto con su descripción de los ítems y cantidades.

* Anexar documento de Factibilidad por el operador de red.

* Presentar planos en físico firmados por los ~~profesionales~~ profesionales que intervinieran

	PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	ASIF08
	FORMATO	Acta de Reunión	Versión	01


6				
7				
8				
9				
10				

(25)

GLORIA E VARGAS M.

Nombre y firma de quien preside la reunión


SGT - POS.




Cont. Director.

Lorena Rivera C.
Contratista Director

Nombre y firma de quien elabora el acta



MSPS - S. Gral.
Dennis y Cataño Hil



Wlir COUPERAI

