



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
HÁBITAT



INFORME EJECUTIVO CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2018.

1. CONTRATO DE OBRA

- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO No.	1361 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.
CONTRATISTA	CONSORCIO CP LA URIBE 2016
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO FISICO DE LA VEREDA LA URIB SECTOR CENTRO POBLADO MUNICIPIO DE RIOBLANCO – TOLIMA (MEJORAMIENTO DE VIAS, PAVIMENTACION CON PLACA HUELLAS TIPO INVIAS, SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE)
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	VEREDA LA URIB SECTOR CENTRO POBLADO MUNICIPIO DE RIOBLANCO – TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	\$1.246.514.191
INTERVENTORIA	CONSORCIO OBRAS CIVILES RIOBLANCO
FECHA DE INICIACIÓN	10 DE JULIO DE 2017

2. METAS EJECUTADAS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED DE ACUEDUCTO	RED DE Ø 1 ½"	134,06 ML	676,94 ML
	RED DE Ø 2"	542,88 ML	

Soluciones que transforman


Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima

SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED PLUVIAL	PERFIL 1 Y 2	81,99 ML	912,23 ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	RED Ø 8"	618,14 ML	
	RED Ø 6"	212,10 ML	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA	TIPO INVIAS	40 ML	40 ML

- Valor de cada componente en el contrato.



- Valor por componente contratado (1) y ejecutado (2).

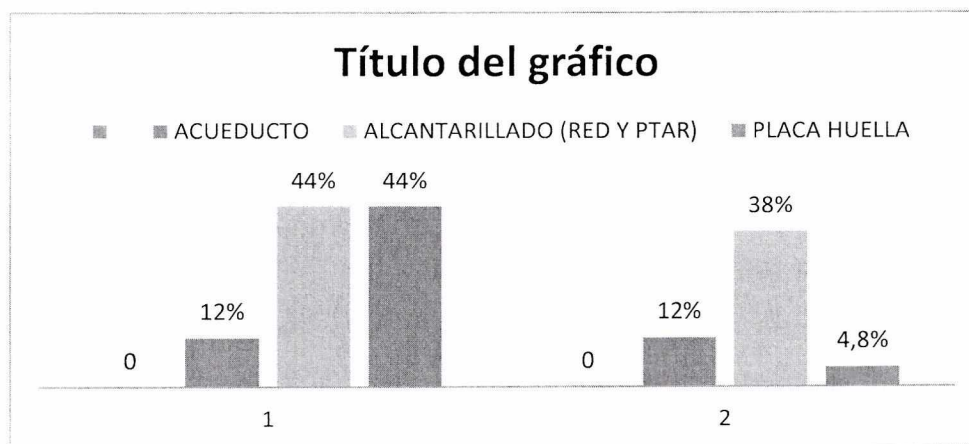



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
HÁBITAT



Relación del tiempo y valor ejecutado.

	TIEMPO	OBRA
CONTRACTUAL	140 DIAS	100 %
EJECUTADO	130 DIAS	54,8%
POR EJECUTAR	10 DIAS	45,2%

3. INFORMACION FINANCIERA

Se encuentra 32% cancelado en el acta parcial No. 1 cancelada a la fecha y el valor correspondiente al 30% del anticipo del contrato.

Acta No	Fecha	Valor Básico	Valor Total	Amort. Anticipo	Saldo Anticipo	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato
1	27/09/2017	\$323.031.293	\$403.789.116	\$121.136.235	\$252.817.523	\$403.789.116	\$842.725.075
TOTALES		\$32.3031.293	\$403.789.116	\$121.136.235	\$252.817.523	\$403.789.116	\$842.725.075

Cordialmente.

Ing. Rafael Ortiz
Contratista SIH

Ing. Diana Carolina Villalba
Contratista SIH

Soluciones que transforman
