

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 1 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

INFORME DE AVANCE	FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2017	LUGAR: IBAGUE
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA Y HABITAT	
PROCESO	CONVENIO 703 CON EL MUNICIPIO DE PLANADAS	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE PLANADAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO “DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONEXIÓN INTERMODAL URBANA-RURAL DEL TOLIMA	
ELABORADO POR:	INGENIERO CIVIL DIEGO FERNANDO HERRAN TRIANA	
SOLICITANTE	Diana Cifuentes	


INFORMACION GENERAL;

1.	VALOR DEL CONVENIO	\$ 2.703.890.000
2.	NOMBRE DEL COOPERANTE	MUNICIPIO DE PLANADAS.
3.	APORTE GOBERNACION	\$ 2.527.000.000
4.	APORTE COOPERANTE	\$ 176.890.000
5.	PAGOS RALIZADOS	90% DE LAS OBLIGACIONES (\$ 2.274.300.000)
6.	PAGOS FALTANTES	10% POR LIQUIDACION
7.	ADICIONES O MODIFCATORIAS	UNA MODIFICATORIA CALUSULA DE EJECUCION Y UNA ADICION EN TIEMPO
8.	SUSPENCION	21 DE MARZO
9.	REINICIO	08 DE MAYO
10.	SUPENCION	22 DE MAYO
11.	ESTADO ACTUAL	SUSPENDIDO
12.	AVANCE ESTIMADO DE EJECUCION	94%
13.	META DE PAVIMENTACION PROYECTADA	6.183,37 M2
14.	META DE PAVIMENTACION EJECUTADA	5.760 M2
15.	META DE RED DE ALCANTARILLADO PROYECTADA	594 ML
16.	META DE RED DE ALCANTARILLADO EJECUTADA	594 ML

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 2 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

--	--

CALLES PENDIENTES POR EJECUTAR PLACA Y SUB-BASE			423,54 M2	
CALLES ACTUALMENTE PAVIMENTADAS			5.759,83 M2	
1	CALLE 3 ENTRE CRAS. 5 Y 6	83,40	7,10	592,14
2	CALLE 4 ENTRE CRAS. 6 Y 7	81,51	7,10	578,72
3	CALLE 10 ENTRE AEROPISTA Y CAMPO DE FUTBOL	93,63	5,00	468,15
4	CALLE 11 ENTRE CRAS. 6 Y 7 -60% de ejecucion	94,00	7,10	667,40
5	CALLE 11 ENTRE CRAS. 8 Y 9	91,67	5,40	495,02
6	CALLE 11A ENTRE CRAS. 9 Y 9B- 0% de ejecucion	38,19	4,10	156,58
7	CALLE 12 ENTRE CRAS. 8 Y 9	103,95	7,10	738,05
8	CALLE 14 ENTRE CRAS. 6 Y 7	66,91	3,00	200,73
9	CALLE 15 ENTRE CRAS. 6 Y 7	68,00	7,10	482,80
10	CRA. 5 ENTRE CALLES 3 Y 4	77,81	7,10	552,45
11	CRA. 6 ENTRE CALLES 13 Y 15	87,77	3,40	298,42
12	CRA. 8A ENTRE CALLES 8 Y 9	83,76	4,50	376,92
13	ENTRADA PPAL. ENTRE CLLES 4 Y 4A BARRIO AVENIDA	80,00	7,20	576,00
	TOTALES			6.183,37

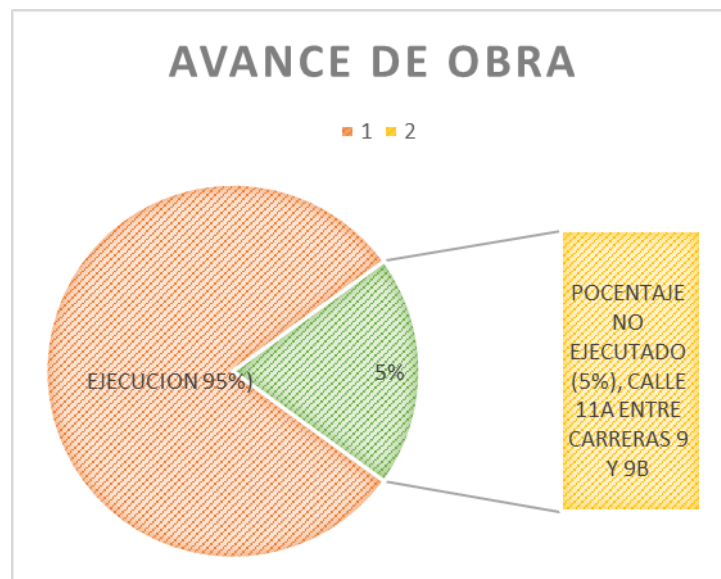

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 3 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

TIPO DE OBRA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO E:0,18. CRA 8 A ENTRE CALLES 8 Y 9	Construcción placa en pavimento rígido e: 0,18 con las dovelas según diseño.  

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 4 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

CONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO E:0,18 EN LA CALLE 14 ENTRE 6 Y 7	Placa en concreto MR38  
PAVIMENTO RIGIDO CRA 6 ENTRE CALLES 13 Y 15	Placa en concreto MR38 

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 5 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

ESTRUCTURA
PAVIMENTO RIGIDO
CALLE 12 ENTRE
CARRERAS 8 Y 9

Extendida de la subbase granular s/diseño.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 6 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

TIPO DE OBRA	OBSERVACIONES
REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 3 ENTRE CARRERAS 5 Y 6	
PAVIMENTO RIGIDO CALLE 3 ENTRE CARRERAS 5 Y 6	Placa en concreto MR38 

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 7 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4	Línea principal, tubería pvc alcantarillado 12". 
PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4	Placa en concreto MR38 

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 8 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 4 ENTRE CARRERAS 6 Y 7	Línea principal, tubería pvc alcantarillado 12". 
PAVIMENTO RIGIDO CALLE 4 ENTRE CARRERAS 6 Y 7	Placa en concreto MR38 y sumidero de aguas lluvias. 

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 9 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

REPOSICION ALCANTARILLADO ENTRADA PRINCIPAL B/AVENIDA ENTRE CALLES 4 Y 4a	Excavaciones e instalación tuberías principal de 16" y domiciliarias de 6"  
PAVIMENTO RIGIDO ENTRADA PRINCIPAL B/AVENIDA ENTRE CALLES 4 Y 4a	Corte de pavimento para las dilataciones 
PAVIMENTO RIGIDO ENTRADA PRINCIPAL B/AVENIDA ENTRE CALLES 4 Y 4a	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 10 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

REPOSICION
ALCANTARILLADO
CALLE 11A ENTRE
CRAS. 9 Y 9B



REPOSICION
ALCANTARILLADO
CALLE 11A ENTRE
CRAS. 9 Y 9B




ING. DIEGO FERNANDO HERRAN TRIANA
Elaborado

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 11 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014
