

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 12
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P2S24MP4	24 corredores Viales estratégicos señalizados en el cuatrienio	Vías con infraestructura instalada	Acumulado

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
12	11	24

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Fecha del reporte: 31 DE MARZO DE 2025

Periodo de reporte: (ENERO A MARZO DE 2025)

Tipo de soporte:

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	X
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	X
ACTA	X
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	5
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?	

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 12
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

	ACTIVIDAD
1	-En el municipio de Prado como corredor estratégico de la subregión Sur oriente, se llevó a cabo con el contrato de obra No. 4384 de 12/12/2024, la Instalación de Señalización Vial Vertical, Demarcación Vial e instalación de bandas reductoras de velocidad con una inversión de \$102.101.560,7 Evidencia:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 12
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022



- En el municipio de Santa Isabel como corredor estratégico de la subregión Nevados, se llevó a cabo con el contrato de obra No. 4384 de 12/12/2024, la Instalación de Señalización Vial Vertical y dispositivos de canalización con una inversión de \$31.198.545,57

Evidencia:



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 12
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

- En el municipio de Venadillo como corredor estratégico de la subregión Nevados, se llevó a cabo con el contrato de obra No. 4384 de 12/12/2024, la Instalación de Señalización Vial Vertical y dispositivos de canalización con una inversión de \$6.975.160,14


Evidencia:



- En el municipio de Ibagué como corredor estratégico de la subregión Centro, se llevó a cabo con el contrato de obra No. 4384 de 12/12/2024, la Instalación de Señalización Vial Vertical, Demarcación Vial e instalación de bandas reductoras de velocidad y dispositivos de canalización con una inversión de \$227.380.457,7

Evidencia:

*Corregimiento Pastales:

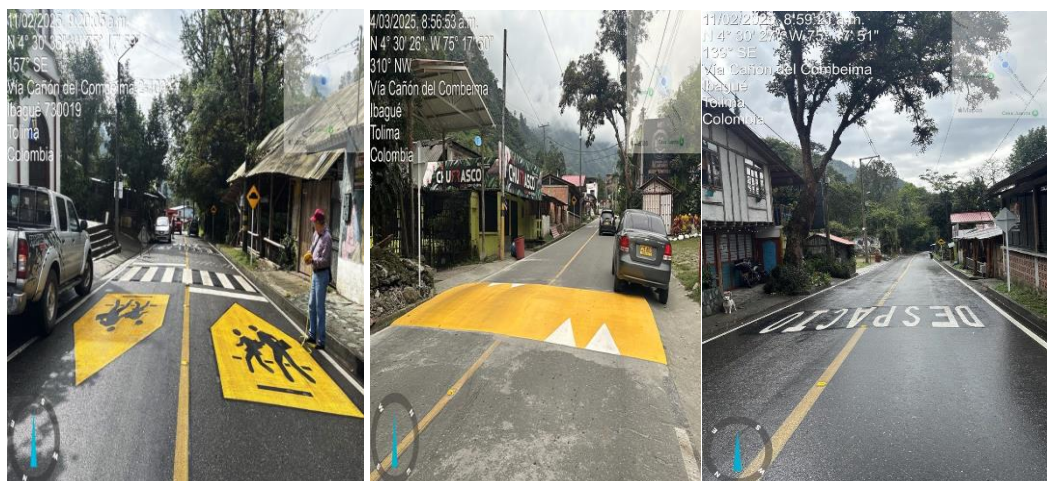

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	VERSIÓN: 01
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		PÁG. 5 DE 12 VIGENTE DESDE: 28/06/2022

***Corregimiento Villarestrepo:**



***Corregimiento San Bernardo:**



[illegible]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 7 DE 12
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

-El convenio No. 3039 de 08/10/2024 con el municipio de Chaparral por valor de \$450 Millones, para llevar a cabo LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE DE SIETE (7) INTERSECCIONES UBICADAS EN: 1). INTERSECCIÓN CARRERA 8 & CALLE 7; 2). INTERSECCIÓN CARRERA 6 & CALLE 7; 3). INTERSECCIÓN CARRERA 6 & CALLE 9; 4). INTERSECCIÓN CARRERA 8 & CALLE 9; 5). INTERSECCIÓN CARRERA 10 & CALLE 8; 6). INTERSECCIÓN CARRERA 10 & CALLE 7 7). AVENIDA SIMÓN BOLIVAR CON CALLE 11, QUE CORRESPONDEN A LAS CALLES Y CARRERAS DE MAYOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR DE RADICADO 2007-00405-00; A la fecha lleva un avance de ejecución del 85.83% que corresponde al valor de \$378.226.735 Evidencia:
--



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO:
INS-PD-001
VERSIÓN: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL
DESARROLLO

PÁG. 8 DE 12

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-
EJECUTOR TOLIMA.

VIGENTE DESDE:
28/06/2022

EJECUTADO			Curva del Cacho	Arte Floral	Plaza	Chocatos	Inst Soledad Medina	Panadería Giordano	Iglesia			
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	Avenida simon bolivar con calle 11	Carrera 6 con calle 9	Carre ra 6 con calle 7	Carrer a:8 con calle 7	Carre ra 10 con calle 8	Calle 10 con carrera 7	Carr era 8 con calle 9	TOTAL CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación Bomeraporta fusible	UNID	8	8		8			8	32.00	\$ 23,438	\$ 750,016
2	Suministro e instalación Breakermatic corta picos	UNID	1	1						2.00	\$ 290,000	\$ 580,000
3	Suministro e instalación Breaker bipolar 6K	UNID		1						1.00	\$ 205,000	\$ 205,000
4	Suministro e instalación Cable 3x16 AWG	MI	100	70	103	70	110		70	523.00	\$ 23,518	\$ 12,299,914
5	Suministro e instalación Cable 4x16 awg	MI	60	30	45	30	80	60	30	335.00	\$ 23,433	\$ 7,850,055
6	Suministro e instalación Candado incluye argolla	UNID	1		1		1	1	1	5.00	\$ 260,000	\$ 1,300,000
7	Suministro e instalación Chapa	UNID	1	1		1			1	4.00	\$ 366,000	\$ 1,464,000
8	Suministro e instalación Cinta Leds x 1m	UNID	1	1	1	1			1	5.00	\$ 112,000	\$ 560,000
9	Suministro e instalación Dispositivo sonoro para invidentes	UNID	6		4	4	6		4	24.00	\$ 1,967,857	\$ 47,228,568
10	Suministro e instalación Equipo de Control 6G Con Conexión a central	UNID			1		1			2.00	\$ 36,333,333	\$ 72,666,666

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 9 DE 12
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

11	Suministro e instalación Fuente 12VDC 110VAC para cinta leds	UNID	1	1	1	1		1	5.00	\$ 364,000	\$ 1,820,000
12	Suministro e instalación Fuente 5VDC para sistema de Tarjetas	UNID	1	1				1	3.00	\$ 383,333	\$ 1,149,999
13	Suministro e instalación Kit ECTV 8G Tinsa®	UNID	1	1		1		1	4.00	\$ 9,250,000	\$ 37,000,000
14	Suministro e instalación Modulo animado 200mm peatonal	UNID			4	2	4	2	12.00	\$ 637,500	\$ 7,650,000
15	Suministro e instalación Modulo doble contador 200mm peatonal	UNID					2	2	4.00	\$ 690,625	\$ 2,762,500
16	Suministro e instalación Modulo vehicular 200mm rojo	UNID	3	1	4	2	4	2	20.00	\$ 602,500	\$ 12,050,000
17	Suministro e instalación Modulo vehicular 200mm amarillo	UNID	3	1	2	2	4	2	18.00	\$ 605,556	\$ 10,900,008
18	Suministro e instalación Modulo vehicular 200mm verde	UNID	3	1	4	2	4	2	20.00	\$ 697,500	\$ 13,950,000
19	Mtto mástil	Gb	4	2	2	4	1	1	14.00	\$ 1,314,286	\$ 18,400,004
20	Mtto Ménsula	Gb	2	2	2		3	2	13.00	\$ 1,642,308	\$ 21,350,004
21	Suministro y aplicación Pintura Acrílica base solvente Cruce x m2. Según manual de INVIAS	M2		63.42	82.33	51.51	59.37	53.77	310.40	\$ 103,093	\$ 32,000,067
22	Suministro y aplicación Pintura Gabinete	Gb	1	1	1	1		1	5.00	\$ 556,000	\$ 2,780,000
23	Suministro e instalación Polo a tierra	UNID	1	1	1	1	1	1	7.00	\$ 571,429	\$ 4,000,003
24	Suministro e instalación Router	UNID	1	1		1		1	4.00	\$ 2,450,000	\$ 9,800,000
25	Suministro e instalación Semáforo peatonal 200mm animado doble contador sujeción mástil	UNID	6				2	2	10.00	\$ 2,490,000	\$ 24,900,000
26	Suministro e instalación Semáforo Vehicular 200mm policarbonato sujeción mástil	UNID	3			1	1	1	6.00	\$ 2,458,333	\$ 14,749,998
27	Suministro e instalación Semáforo Vehicular 200mm policarbonato sujeción Ménsula	UNID						1	1.00	\$ 2,750,000	\$ 2,750,000



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO:
INS-PD-001

VERSIÓN: 01

PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL
DESARROLLO

PÁG. 10 DE 12

FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-
EJECUTOR TOLIMA.

VIGENTE DESDE:
28/06/2022

28	Suministro e instalación Sensor puerta	UNID	1	1	1	1		1	5.00	\$ 240,000	\$ 1,200,000
29	Suministro e instalación Soporte semáforo mástil	UNID	2	2	4	2	4	2	16.00	\$ 131,250	\$ 2,100,000
30	Suministro e instalación Supresor traslentes	UNID	1	1					2.00	\$ 875,000	\$ 1,750,000
31	Construcción Tapa caja de paso 50x50 cm fundición 3000 PSI	UNID	1						1.00	\$ 459,932	\$ 459,932
32	Suministro e instalación UPS 750W - 110VAC	UNID	1	1		1		1	4.00	\$ 650,000	\$ 2,600,000
33	Construcción Acometida eléctrica	UNID	1			1	1	1	4.00	\$ 1,375,000	\$ 5,500,000
34	Suministro e instalación de señal vertical. Según manual de invías	UNID			2			1	3.00	\$ 566,667	\$ 1,700,001
										TOTAL	\$ 378,226,735

A la fecha, se tiene un valor ejecutado acumulado del contrato por TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VENTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$378.226.735) correspondiente al 85.83% del valor total del contrato.

Para constancia se firma el siete (07) de febrero de 2025.

Por el SUPERVISOR


ING. ALVARO FERNANDO MELENDRO MENESES
Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal
Supervisor

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 11 DE 12
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022



Link proceso:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-12-14192870&g-recaptcha-response=03AFcWeA5wiqmNv2ja3yLNACYERcWF2bxFPZVYqOUTIEnQRUpSM2yBtYEgQcD2CT-QXAq3vbo5wo5ZrNya34VURtDooX59Efpm2Lt7pBs5gMStN3mDhRgUgChNLzeB56OEldP8tKwv6PIAo3GOJLVbBTS6FtlQuoLC15SozkmsDzeSml8qk7SeLSH1CiAHN19PW4IRQBSSBZHcyoC4KZN3gduviZB7W_8qiSzz1khbSxXXqnJduQWxNuOd_uktwJG9X0Zt3XXSvkpqGJwjKRCMPfgAlf3BdKT3Ef9oCPvJiy1HjLBP6zhQ7FjdcHLMDcW2dVXCULFHvGI4-RtRgdyJ5TZvBRLPf6rh33AQTyVONN2nkLjPcxKji-k1TA0fo866P0PIinntXU5eIKOrtmVhby4RSkoLjA5ey1-nn9yg1Fbel5Qa0KraqZ69KBdTi9ZEZylluvBRb1t9AzzLITj1YrMU0TK1cTKqp2PijY2aZF4h3LRr4rDT-v_1pEmV_hTI19RjgBb8bm597eAdPd3qXG4Y4jvX-LxV7x_Q_dcy1LklcwP-4qdRN_2R13eUKUIlpTc-FkUgxyN1Sm4IYxIDxCB1MKuVZ0o8XHeLtWbAMUlg5DehfNuAKD0oiEOM1TwCz2lth2KzAY6vGU6D_QI3fpsHbbPU-qPZSQqZhB8C9rGBOSiYvO2qNwum8MtYC67z54sfuiQF3H3HQJGVIRloemmrwzWaLo9KDBVA_OGRKfrU7z_7ahUhfMqPezxfGVt2OQ7uQmn_b1IMVcUzA8RJZDBkMiYogNv6cz8jSypH4Pp9f

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 12 DE 12
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	r48FI74h5tRhUBhBwXlZfR5n4BKJQEgQGtwDdjazL_kc2MGg0y3sC2P2_K-LpR-jdZDX0mVO-QMoDOOcD0pg_y4S
	-Se fortaleció el apoyo técnico para la formulación de proyectos de señalización vial para mejorar la infraestructura para la seguridad vial en el Departamento del Tolima, con una inversión de \$61.199.983 Millones.

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
PRADO	Señalización Vial	\$102.101.560,7
SANTA ISABEL	Señalización Vial	\$31.198.545,57
VENADILLO	Señalización Vial	\$6.975.160,14
IBAGUE	Señalización Vial	\$227.380.457,7
CHAPARRAL	Semaforización	\$225.000.000

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Cordial saludo,



MARIO ALBERTO TOVAR LUCURA

SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Elaborado por: Fabián Sánchez - Profesional Contratista STT

Revisado y Reportado por: José A. Varón C. - Profesional Contratista STT

Cargado por: Hanner Garcia - SPT
