

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT	
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Pág. 1 de 17

INFORME DE SEGUIMIENTO					
Convenio No. 0446 del 1 de Marzo de 2019					
Fecha:	20	De	Diciembre	De	2019

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SUPERVISIÓN

Recopilación de las actividades de supervisión desarrolladas a la ejecución de obra del contrato No. 0446 del 1 de Marzo de 2019, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE HERVEO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION OBRAS DE RENOVACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE HERVEO TOLIMA”	
LOCALIZACIÓN	1. Municipio de Herveo – Parque Principal

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
CONTRATO NÚMERO:	0446 del 1 de Marzo de 2019
OBJETO DEL CONTRATO:	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE HERVEO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION OBRAS DE RENOVACION DEL PARQUE PRINCIPAL DE HERVEO TOLIMA”
SUPERVISOR:	ANDREA DEL PILAR GOMEZ ESPINOSA – Mediante resolución No. 0358 de 2 de Julio de 2019
COPERANTE:	MUNICIPIO DE HERVEO RL. NONDIER ARIAS

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
 Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
 Página Web: www.tolima.gov.co
 Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT	
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Pág. 2 de 17

VALOR DEL CONVENIO:	\$ 2.157.565.603	DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO
APORTE DEL DEPARTAMENTO	\$ 1.941.809.043.00		
APORTE DEL MUNICIPIO	\$ 215.756.560.00		
FECHA DE INICIO	21 de Marzo de 2019		
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		
CDP	1778 del 26 de Febrero de 2019		
RP	2465 del 6 de Marzo 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de Septiembre de 2019		
PRORROGA No.1 (90 días)	12 de Septiembre de 2019		
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de Diciembre de 2019		

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

- Que Se firma el acta de inicio de este convenio el 21 de Marzo de 2019
- Que mediante oficio de 21 de Marzo el supervisor Ing. Andrés Martínez hace remisión del acta de inicio a la Dirección de Contratación del Departamento
- Que mediante oficio No. 1399 de 24 de Abril de 2019 el supervisor Ing. Andrés Martínez, solicita información sobre el estado actual del Convenio.

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
 Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
 Página Web: www.tolima.gov.co
 Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT	
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Pág. 3 de 17

- Que mediante oficio de 5 de Junio de 2019 el alcalde del Municipio solicita el desembolso del 50% del Convenio
- Que mediante oficio de 12 de Junio el supervisor Ing. Andres Martínez hace remisión de documentos a la Dirección de contratación de conformidad con las condiciones generales del Convenio – Forma de Desembolso
- Que mediante resolución No. No.0358 de 2 de Julio de 2019 se reasigna la supervisión a la Arq. Andrea Gómez Espinosa.
- Que mediante oficio No. 2169 de 3 de Julio de 2019 se solicita información y documentación del Convenio.
- Que mediante oficio No. 2367 de 18 de Julio de 2019 se hace segundo requerimiento solicitando información y documentación del Convenio.
- Que mediante oficio No. 2631 de 5 de Agosto de 2019 se hace tercer requerimiento solicitando información y documentación del Convenio.
- Que mediante oficio No. 2655 de 6 de Agosto de 2019 se hace cuarto requerimiento y citación a mesa técnica para el día 12 de Agosto de 2019
- Que el Municipio realiza Contrato de obra pública No. D-085-2019 de Mayo 7 de 2019
- Que el Municipio firma acta de inicio del contrato No. D-085-2019 de Mayo 7 de 2019 el 5 de junio de 2019 por un plazo de 6 meses
- Que el Municipio realiza Contrato de consultoría No. D-109-2019 de Mayo 30 de 2019
- Que el Municipio firma acta de inicio del contrato de consultoría No. D-109-2019 de Mayo 30 de 2019 el 5 de junio de 2019 por un plazo de 6 meses

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
 Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
 Página Web: www.tolima.gov.co
 Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT		
	INFORME DE SEGUIMIENTO		Pág. 5 de 17

A la presente fecha el flujo de caja de inversión programado debe superar el 42,00%, la inversión actual supera el 50,00%

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

A la presente fecha se ha dado cumplimiento a la programación de obra las actividades terminadas son las siguientes:

PRESUPUESTO CONTRACTUAL				BALANCE - ACTA DE MAYORES Y MENORES ITEMS NO PREVISTOS No. 002	CANTIDADES EJECUTADAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	CANT.	ACUMUL. SEMANAS ANTER.	PRESENTE SEMANA 26	ACUMUL. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1,1	Localización y Replanteo con Topografía	M2	4.271,52	4271,52	4271,52		4271,52
1,2	Cerramiento Provisional de Obra en Fibra Verde (h=2,10), Incluye bases de apoyo y parales de madera	ML	315,00	500,4	500,4		500,40
1,3	Desmonte de Lámparas Existentes Incluye Desmonte de Punto Eléctrico	UND	11,00	11	11		11,00
1,4	Demolición y/o Desmonte de Baranda con Balaústres, Soportes y Pasamanos en Concreto	ML	106,00	106	106		106,00
1,5	Desmonte de Baranda Metálica Existente	ML	18,20	17,54	17,54		17,54
1,6	Demolición de Banca Matera en Concreto h=0,90m a=0,60m	ML	166,00	166	166		166,00
1,7	Demolición de Elementos Existentes en Concreto	M3	58,67	58,67	58,67		58,67
1,8	Demolición de Adoquín y/o Acabado de Piso Existente	M2	470,00	581,87	470,00	111,87	581,87
1,9	Demolición de Pisos en Concreto e=variable entre 0,10m y 0,20m	M2	550,00	724,98	550,00	174,98	724,98
1,10	Campamento Provisional de Obra de 27 M2	UND	1,00	1	1		1,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
2,1	Excavación manual en Material Común	M3	1.494,15	1883,53	1494,15	389,38	1883,53

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
 Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
 Página Web: www.tolima.gov.co
 Ibagué, Tolima



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SEGUIMIENTO

Pág. 6 de 17

2,2	Trasiego, Cargue y Retiro de Material Sobrante	M3	1.753,75	2338,73	1753,75	584,98	2338,73
2,3	Rellenos con Material Seleccionado Proveniente de Excavación	M3	448,25	448,70	448,25	0,45	448,70
2,4	Rellenos con recebo compactado	M3	448,25	458,84	448,2460263	10,59	458,84
2,5	Rellenos con Tierra Fértil	M3	201,52	83,60	83,60		83,60
3	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA EN CONCRETO						
3,1	Concreto pobre para limpieza ($f_c=140\text{kg/cm}^2$ $e=0,03\text{m}$)	M3	0,63	1,90	0,63	1,27	1,90
3,2	Zapatillas en Concreto 3000 psi	M3	4,43	6,54	4,43	2,11	6,54
3,3	Vigas de Amarre Cimentación en concreto de 3000 psi	M3	2,52	5,14	2,52	2,62	5,14
3,4	Muro de contención en concreto 3.000 psi	M3	7,20	12,32	7,2	5,12	12,32
3,5	Columnas en concreto Tipo 1 de 3.000 psi Sección 0,60x0,30	ML	6,80	2,52	2,85	-0,33	2,52
3,6	Columnas en concreto Tipo 2 de 3.000 psi Sección 0,25x0,25	ML	10,20	14,76	10,2	4,56	14,76
3,7	Placa de Contrapiso en Concreto de 3000 psi, incluye (polietileno cal. 6) $e=10\text{ cm}$	M2	93,00	216,01	93	123,01	216,01
3,8	Vigueta de Borde Placa de Contrapiso en Concreto de 3000 psi Sección 0,15m x 0,10m	ML	40,00	0,00	0		0,00
3,9	Rampa Contrapiso en Concreto de 3.000 psi $e=0,10\text{m}$	M2	70,00	78,82	69,07	9,75	78,82
3,10	Vigueta de Borde Rampa Contrapiso en Concreto de 3000 psi Sección 0,15m x 0,10m	ML	40,00	40,00	40,00		40,00
3,11	Placa Aligerada en Concreto de 3000 psi $h=0,50\text{m}$	M2	20,00	27,14	20	7,14	27,14
3,12	Placa Maciza en Concreto de 3000 PSI $e=0,15\text{m}$	M2	9,00	40,00	9	31,00	40,00
3,13	Viga Aérea en concreto Tipo 1 de 3.000 psi seccion 0,35x0,40	ML	71,40	0,00	0		0,00
3,14	Viga Aérea en concreto Tipo 2 de 3.000 psi seccion 0,15x0,40	ML	16,00	0,00	0		0,00
3,15	Escaleras y Graderías en Concreto de 3000 psi	M3	9,00	9,34	9	0,34	9,34
3,16	Malla Electrosoldada Estandar 6,00x2,35 ($f_y=5000\text{ kg/cm}^2$) - 0,15x0,15 Ambos Sentidos	KG	2.000,00	2021,98	1963	58,98	2021,98
3,17	Acero de Refuerzo ($f_y=4200\text{ kg/cm}^2$)	KG	5.000,00	5000,00	5000		5000,00
4	ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA						
4,1	Estructura Metálica de Soporte Torre Existente	KG	1.400,00	1400,00	1400		1400,00
4,2	Desmonte, Retauración, Mantenimiento, Traslado y Montaje de Torre Existente, Inc. Anticorrosivo y Pintura	UND	1,00	1,00	1,00		1,00
4,3	Mantenimiento General de la Estructura Metálica Existente de cubierta, Inc. Anticorrosivo y Pintura	M2	80,00	80,00	80		80,00
4,4	Mantenimiento General de la Cubierta Existente, Inc. Acabado y Pintura	M2	80,00	0,00	0		0,00
5	MAMPOSTERIA Y PAÑETES						

Soluciones que transforman



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SEGUIMIENTO

Pág. 7 de 17

5,1	Muro en Bloque Hueco de Arcilla H5 e=0,12m	M2	120,00	124,54	120	4,54	124,54
5,2	Muro en Ladrillo Prensado Liviano Tipo Santafé e=0,12m	M2	20,00	20,00	25	-5,00	20,00
5,3	Columnetas en Concreto de 3000 PSI de 0,12 x 0,10	ML	25,00	25,00	20	5,00	25,00
5,5	Alfajías en Concreto de 3000 PSI de 0,12 x 0,10	ML	20,00	0,00	0		0,00
5,6	Pañete Liso Sobre Muros en Mortero 1:4; Inc. Filos y Dilataciones	M2	255,00	333,81	255	78,81	333,81
5,7	Pañete Liso Bajo Placas en Mortero 1:4; Inc. Filos y Dilataciones	M2	70,00	106,62	70	36,62	106,62
5,8	Banca en Concreto de 3000 PSI Tipo 1	ML	38,41	18,81	18,81		18,81
5,9	Banca en Concreto de 3000 PSI Tipo 2	ML	79,00	36,64	36,64		36,64
5,10	Banca en Concreto de 3000 PSI Tipo 3	ML	86,00	105,12	86	19,12	105,12
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
6,1	INSTALACIONES Y RED HIDRAULICA						
6,1,1	Acometida General en Tubería PCV P RDE21 de 1" L=7,50ml, Inc. Accesorios (Válvula de incorporación, Válvula de Corte, Universal de 1", filtro en Y de 1", Válvula de Cierre Rápido de 1")	UND	1,00	5,00	4	1,00	5,00
6,1,3	Sum. E Instalación de Tubería PVC P RDE 21 de 1"	ML	20,00	29,54	20	9,54	29,54
6,1,4	Sum. E Instalación de Tubería PVC P RDE 11 de 3/4"	ML	10,00	38,28	10	28,28	38,28
6,1,5	Sum. E Instalación de Tubería PVC P RDE 9 de 1/2"	ML	40,00	139,48	40	99,48	139,48
6,1,7	Sum. E Instalación de Registro RW (Llave de Paso) Ø 1/2"	UND	4,00	1,00	4	-3,00	1,00
6,1,8	Puntos de agua fría en PVCP de 1/2"; Inc. Tubería y Accesorios	UND	30,00	26,00	28	-2,00	26,00
6,2	INSTALACIONES Y RED SANITARIA						
6,2,1	Punto Salida Sanitaria PVC Ø 4", Incluye Tubería y Accesorios	UND	6,00	6,00	6		6,00
6,2,2	Punto Salida Sanitaria PVC Ø 2", Incluye Tubería y Accesorios	UND	25,00	25,00	20	5,00	25,00
6,2,3	Sum. E Instalación de Tubería Sanitaria PVC de 2"	ML	36,00	36,00	36,00		36,00
6,2,4	Sum. E Instalación de Tubería Sanitaria PVC de 4"	ML	24,00	24,00	20	4,00	24,00
6,2,5	Sum. E Instalación de Tubería Sanitaria PVC de 6"	ML	12,00	12,00	8	4,00	12,00
6,2,7	Caja de Inspección 70x70; Ladrillo Tolete, Base y Tapa en Concreto; Inc. Refuerzo H=Variable	UND	2,00	0,00	0		0,00
6,2,8	Caja de Inspección 80x80; Ladrillo Tolete, Base y Tapa en Concreto; Inc. Refuerzo H=Variable	UND	3,00	8,00	3	5,00	8,00
6,4	RED DE AGUAS LLUVIAS						
6,4,1	Sum. E Inst. Canal de Drenaje Prefabricado en Polyconcreto tipo DP-200V A=250MM H=320MM Carga=D400	ML	146,50	63,50	65	-1,50	63,50
6,4,2	Caja de Inspección Aguas Lluvias 0,60x0,60; Ladrillo Tolete, Base y Tapa en Concreto; Inc. Refuerzo H=Variable	UND	8,00	0,00	0		0,00

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3

Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311

Página Web: www.tolima.gov.co

Ibagué, Tolima



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SEGUIMIENTO

Pág. 8 de 17

6,4,3	Pozo de Inspección Ø1,20m con tapa Aro HF de Ø0,60m y Escalera Acero Ø3/4" cada 0,30m, Inc. Pañete Imp. 1:4 inc. Base e= 0,30m y Cañuelas	UND	2,00	1,00	1		1,00
6,4,4	Cárcamo Sumidero Transversal en Concreto de 3000 PSI A=0,60M, Base y Muros e=0,10m, Profundidad total promedio 0,60 m, Inc. Acero de Refuerzo y Pañete Imp. 1:4.	ML	20,60	0,00	0		0,00
6,4,5	Sum. E Inst. de Tapa Sumidero Transv. Vehicular en Concreto de 3000 PSI de 0,50mx0,50m 0,15m, Inc. Acero de Refuerzo	ML	20,60	0,00	0		0,00
6,4,6	Cañuela prefabricada semicircular en Concreto de 3000 A=0,30m e=0,15m	ML	87,50	0,00	0		0,00
6,4,7	Sum. E Inst. Tubería Novafort Ø10" conducción Aguas Lluvias	ML	36,00	54,42	36,00	18,42	54,42
7	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7,1	Estructura SB 400 (Conexión Punto de Arranque Baja Tension A.P y Red de Baja Tension)	UND	1,00	1,00	1		1,00
7,2	Armario para equipo de medida Directa Norma AE303 incluye equipo de medida para A.P	UND	1,00	1,00	1		1,00
7,3	Malla a Tierra Principal	UND	1,00	1,00	1		1,00
7,4	Alimentador de Distribucion (3X4+4+T)CU-THW (Solo Conductor)	UND	1,00	1,00	1		1,00
7,5	Alimentador de Distribucion (2X(3X4+4T) CTOS A.P+(3X4+4+4T))AL S8000, 5Ø3"PVC	ML	53,00	53,00	53		53,00
7,7	Alimentador Cable No 4 AL S8000	ML	168,00	168,00	168		168,00
7,8	Red de Distribucion B.T (2X12+12T)Cu Awg, 1 Ø de 3/4"	ML	235,00	235,00	235		235,00
7,9	Camara de Inspeccion CS 275	UND	6,00	6,00	6		6,00
7,10	Camara de Inspeccion CS 280	UND	2,00	0,00	0		0,00
7,11	Sistema de Puesta a Tierra en Red de Alumbrado	UND	5,00	5,00	5		5,00
7,12	Luminaria Teceo (8 Led)-19W	UND	21,00	20,00	20		20,00
7,13	Luminaria Teceo (32 Led)-71W	UND	21,00	20,00	20		20,00
7,14	Luminaria Calla 2241(28 Led)-46W	UND	24,00	20,00	20		20,00
7,15	Proyector Terra MIDI LED (16 Led)-30W	UND	2,00	2,00	2		2,00
7,16	Poste ITO TRONCOCONICO doble proposito- 8Mts de altura, con canastilla de anclaje	UND	21,00	20,00	20,00		20,00
7,17	Poste Cilindrico de 6 Mts de altura, con canastilla de anclaje	UND	24,00	20,00	20,00		20,00
7,18	Empalme CS 339	UND	105,00	105,00	105		105,00
7,19	Barraje B.T CS 340,160A con elementos de anclaje	UND	24,00	24,00	24		24,00
7,20	Tablero Autosoportado AE 311 (control horario y breaker según diagrama unifilar)	UND	1,00	1,00	1		1,00

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3

Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311

Página Web: www.tolima.gov.co

Ibagué, Tolima



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SEGUIMIENTO

Pág. 9 de 17

7,25	Tablero Monofásico 12 Circuitos con espacio para Totalizador	UND	1,00	1,00	1		1,00
7,29	Luminaria LED de 18W	UND	8,00	8,00	8		8,00
8	PISOS, TEXTURAS, SUPERFICIES Y ENCHAPES						
8,1	BASES Y PISOS						
8,1,3	Mediacaña en Granito Pulido No. 2 a=0,10m h=0,10m	ML	56,65	56,65	56,65		56,65
8,1,4	Cenefa de Borde Elementos en Gravilla Lavada No. 2 a=0,15m	ML	1.195,00	573,30	573,3		573,30
8,1,5	Sum. E Instalación Piso Loseta de Concreto Color - Tipo 1 (Plazoleta, peatonal y Atrio)	M2	301,15	424,78	424,78		424,78
8,1,6	Sum. E Instalación Piso Loseta Rayada de Concreto Color - Tipo 2 (Ver Planta de Texturas y Acabados)	M2	172,78	123,59	123,59		123,59
8,1,7	Sum. E Instalación Piso Loseta de Concreto Color - Tipo 3 (Área de Comidas)	M2	122,76	132,93	132,93		132,93
8,1,8	Sum. E Instalación Piso Loseta de Concreto - Tipo 4 (Ándenes Parque Principal)	M2	650,04	957,68	957,68		957,68
8,1,10	Sum. E Instalación Loseta Táctil de Concreto - Tipo 5	ML	495,80	529,14	529,14		529,14
8,1,11	Piso Afinado en Concreto con Acabado Endurecido de Color Tipo Rocktop o Similar, Inc. Dilatación en Bronce (Pista)	M2	205,42	249,29	249,29		249,29
8,2	MESONES Y PAREDES						
8,2,1	Meson en Concreto de 3000 PSI a=0,60m e=0,10m con Acabado en Granito Pulido; Inc. Salpicadero y Faldón, Soportes y Refuerzo	ML	21,35	21,35	21,35		21,35
9	CARPINTERIA METÁLICA, PUERTAS Y VENTANAS						
9,1	CARPINTERIA METALICA DE ALUMINIO						
9,2	CARPINTERIA METALICA EN LÁMINA						
9,2,5	Pasamanos Tubo en Acero Inoxidable Ø2"; Inc. Soportes, Anclajes y Accesorios	ML	13,30	2,00	2		2,00
9,2,6	Division Metálica h=1,80m en Acero Inoxidable, entamborada, Inc. Puertas, Cerraduras, Soportes y Accesorios	M2	14,24	0,00	14,24	-14,24	0,00
9,3	MOBILIARIO ESPECIAL Y DE ESPACIO PUBLICO						
9,3,1	Módulos de Venta - Según Especificaciones; Inc. Salidas Eléctricas e Iluminación	UND	13,00	13,00	13		13,00
9,3,2	Puestos de Comida - Según Especificaciones; Inc. Salidas Eléctricas e Iluminación	UND	3,00	3,00	3		3,00
9,3,3	Sum. E Instalación de Bebederos de Agua Potable prefabricados Inc. Accesorios	UND	3,00	1,00	3	-2,00	1,00
9,3,4	Canecas Metálicas Tipo IDRD	UND	6,00	6,00	6		6,00
9,3,5	Bolardos Metálicos en Hierro Fundido E=4mm	UND	14,00	14,00	14		14,00

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3

Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311

Página Web: www.tolima.gov.co

Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT			
	INFORME DE SEGUIMIENTO		Pág. 10 de 17	

10	APARATOS Y EQUIPOS					
10,1	Sum. E Instalación Sanitario Blanco Tipo institucional; Inc. Accesorios	UND	5,00	5,00	5	5,00
10,2	Sum. E Instalación de Sanitario para Discapacidad; Inc. Accesorios	UND	1,00	1,00	1	1,00
10,3	Sum. E Instalación de Orinal Blanco tipo Institucional; Inc. Grifería y Accesorios	UND	2,00	2,00	2	2,00
10,4	Sum. E Instalación de Lavamanos Blanco Tipo Institucional de Sobreponer; Inc. Grifería y Accesorios	UND	6,00	4,00	4	4,00
10,5	Sum. E Instalación de Lavamanos de Pedestal para Discapacidad; Inc. Grifería y Accesorios	UND	1,00	1,00	1	1,00
10,6	Sum. E Instalación de Poceta en Acero Inoxidable; Inc. Grifería y Accesorios	UND	3,00	1,00	3	-2,00
10,7	Sum. E Instalación de Barras y Pasamanos para Baños de Discapacidad	UND	1,00	1,00	1	1,00
10,8	Sum. E Instalación de Rejillas de Piso de Ø2" con Sosco	UND	6,00	6,00	6	6,00
10,9	Sum. E Instalación de Tapa Plástica para Registro 0,20m x 0,20m	UND	6,00	6,00	6	6,00
11	PINTURAS					
11,3	Pintura Exterior Tipo Koraza Fachada Principal	M2	200,00	200,00	200	200,00
12	VIDRIOS Y CERRADURAS					
13	PAISAJISMO Y PLANTAS ORNAMENTALES					
13,1	Sum. E Instalación de Grama Natural	M2	503,80	417,99	408,59	9,40
13,3,1	Suministro e instalacion de equipo para ejercicio de remo, Inc. Concreto Cimentación 3000 PSI	UND	1,00	1,00	1	1,00
13,3,2	Suministro e instalacion de equipo para prensa Horizontal, Inc. Concreto Cimentación 3000 PSI	UND	1,00	1,00	1	1,00
13,3,3	Suministro e instalacion de Pectoral Sentado, Inc. Concreto Cimentación 3000 PSI	UND	1,00	1,00	1	1,00
13,3,4	Suministro e instalacion de Barras Paralelas, Inc. Concreto Cimentación 3000 PSI	UND	1,00	1,00	1	1,00
13,3,5	Suministro e instalacion de Escalador, Inc. Concreto Cimentación 3000 PSI	UND	1,00	1,00	1	1,00
13,3,6	Suministro e instalacion de Elíptica Doble, Inc. Concreto Cimentación 3000 PSI	UND	1,00	1,00	1	1,00
13,3,7	Suministro e instalacion de equipo twister 3 personas, Inc. Concreto Cimentación 3000 PSI	UND	1,00	1,00	1	1,00
13,3,8	Suministro e instalacion de equipo volante Doble, Inc. Concreto Cimentación 3000 PSI	UND	1,00	1,00	1	1,00
14	VARIOS					
14,2	Plan de Manejo de Tránsito y PGIO	GL	1,00	1,00	1,00	1,00
15	ITEMS NO PREVISTOS					

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
 Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
 Página Web: www.tolima.gov.co
 Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT			
	INFORME DE SEGUIMIENTO		Pág. 11 de 17	

	ITEMS NO PREVISTOS BALANCE - ACTA DE MAYORES Y MENORES ITEMS NO PREVISTOS No. 001 - 06-09-2019					
NP-1	ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS HIDRÁULICAS DOMICILIARIAS, EN ANDENES PERIMETRALES DEL PROYECTO; INC. TUBERÍA, ACCESORIOS Y ACABADOS EN GRAVILLA	UND	27,00	27,00		27,00
NP-2	PUNTO DE GAS NATURAL LOCALES Y CAFETERÍA; INC. ACOMETIDA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	4,00	4,00		4,00
	ITEMS NO PREVISTOS BALANCE - ACTA DE MAYORES Y MENORES ITEMS NO PREVISTOS No. 002 - 07-11-2019					
NP-3	Columnas en concreto de 3.000 psi Sección 0,30x0,30	ML	2,52		2,52	2,52
NP-4	Columnas en concreto de 3.000 psi Sección 0,20x0,20	ML	10,08		10,08	10,08
NP-5	Viga Aérea en concreto de 3.000 psi seccion 0,30x0,50	ML	33,49		33,49	33,49
NP-6	Viga Aérea en concreto de 3.000 psi seccion 0,25x0,40	ML	32,92		32,92	32,92
NP-7	Viga Aérea en concreto de 3.000 psi seccion 0,15x0,20	ML	5,72		5,72	5,72
NP-8	Corte para placa de concreto espesor variable con maquina	ML	3.138,88		3138,88	3138,88
NP-9	Sum. E Inst. Tubería Novafort Ø12" conducción Aguas Lluvias	ML	78,13		78,13	78,13
NP-17	Materas en concreto e=,30 L=,98 A=,60 inc elementos de ornato	UND	6,00		6,00	6,00
NP-19	Pintura Exterior Tipo Koraza para bancas	ML	160,57		160,57	160,57

Ítems más representativos: Localización, Cerramiento, Desmontes y demoliciones, Campamento, Excavaciones, Movimientos de Tierra, Rellenos, Retiros, Canales, Cárcamos, Cajas de Inspección y Tubería de Aguas Lluvias.

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
 Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
 Página Web: www.tolima.gov.co
 Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT	
	INFORME DE SEGUIMIENTO	Pág. 12 de 17

ACTIVIDADES POR EJECUTAR:

A la presente fecha las siguientes actividades se encuentran pendientes de Ejecución, de acuerdo a la programación:

No.	ACTIVIDAD	VALOR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	Carpintería Metálica, Puertas y Ventanas	\$ 243.153.400,00	0,00%	0,00%
2	Aparatos y Equipos	\$ 9.010.000,00	0,00%	0,00%
3	Pinturas	\$ 11.769.200,00	0,00%	0,00%
4	Vidrios y Cerraduras	\$ 911.000,00	0,00%	0,00%
5	Paisajismo y Plantas Ornamentales	\$ 69.506.000,00	0,00%	0,00%
6	Varios	\$ 25.578.900,00	0,00%	0,00%
	SUBTOTAL	\$ 359.928.500,00	0,00%	0,00%
	AIU – 25%	\$ 89.982.125,00	0,00%	0,00%
	TOTAL	\$ 449.910.625,00	0,00%	0,00%
	RETIE Y RETILAP	\$ 5.950.000,00	0,00%	0,00%

Ítems más representativos: Puertas, Ventanas, Barandas, Divisiones Metálicas, Módulos de Venta, Puestos de Comida, Bebederos, Canecas, Mobiliario Urbano, Aparatos Sanitarios, Lavamanos, Accesorios para Discapacidad, Pinturas, Espejos, Cerraduras, Grama, Especies Vegetales, Arbustos, Equipos Biosaludables, Señalización Horizontal y Vertical, Aseo y Limpieza General.

OBSERVACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA:	
% EJECUCION:	98%
<i>Nota: El porcentaje de ejecución que se describe corresponde al remitido mediante programación actualizada del mes de Diciembre de 2019, enviada por el Municipio.</i>	

Soluciones que transforman




GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SEGUIMIENTO

Pág. 13 de 17

PLANTA GENERAL DEL PROYECTO

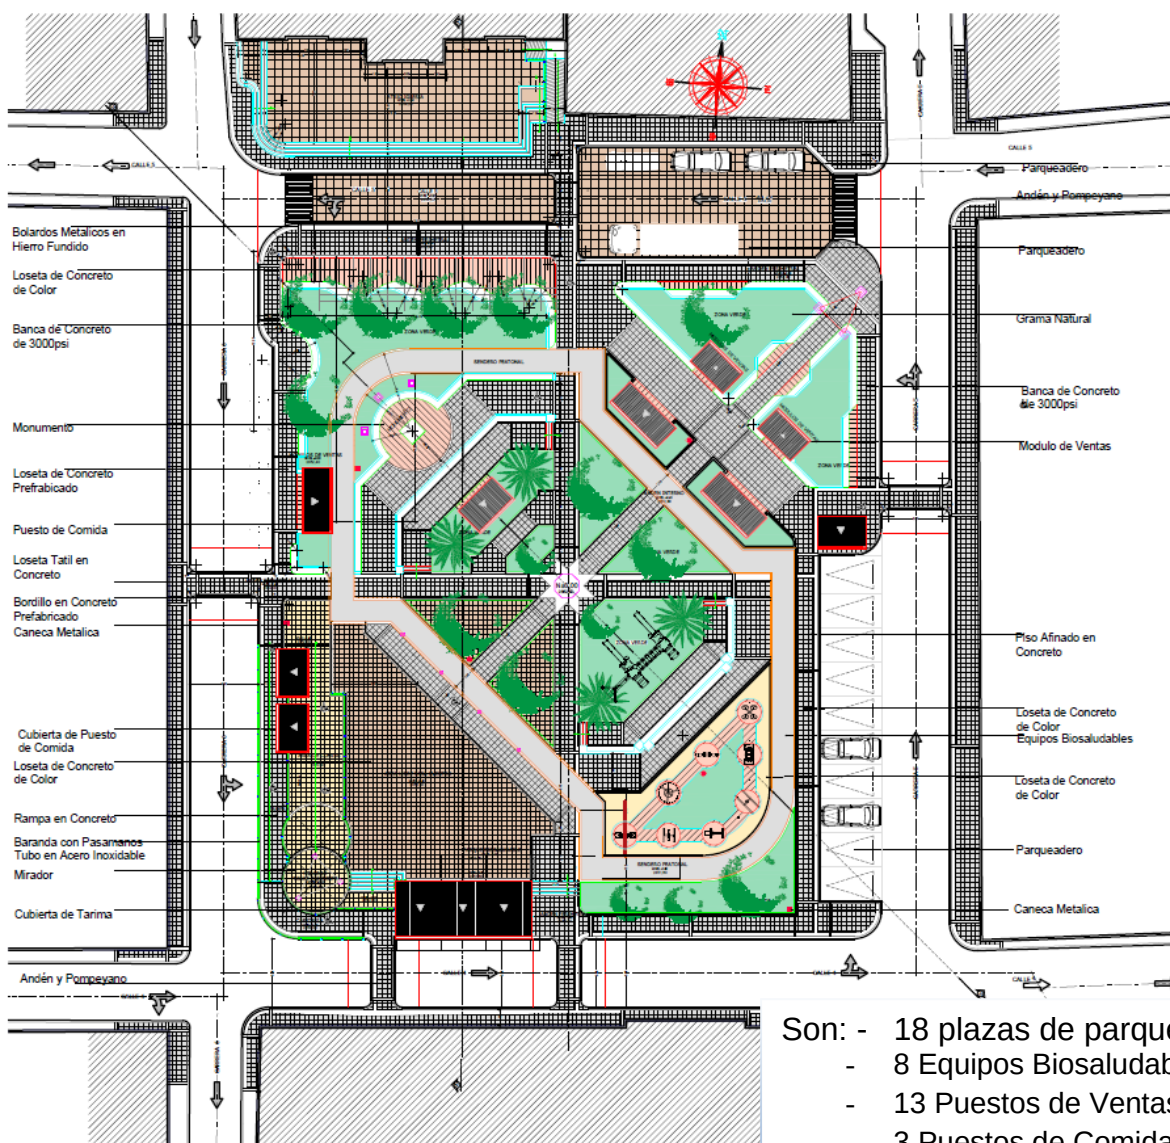


- Son: - 18 plazas de parqueo
- 8 Equipos Biosaludables
- 13 Puestos de Ventas
- 3 Puestos de Comida

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima



PARQUE BIOSALUDABLE Y ZONAS DE PARQUEO

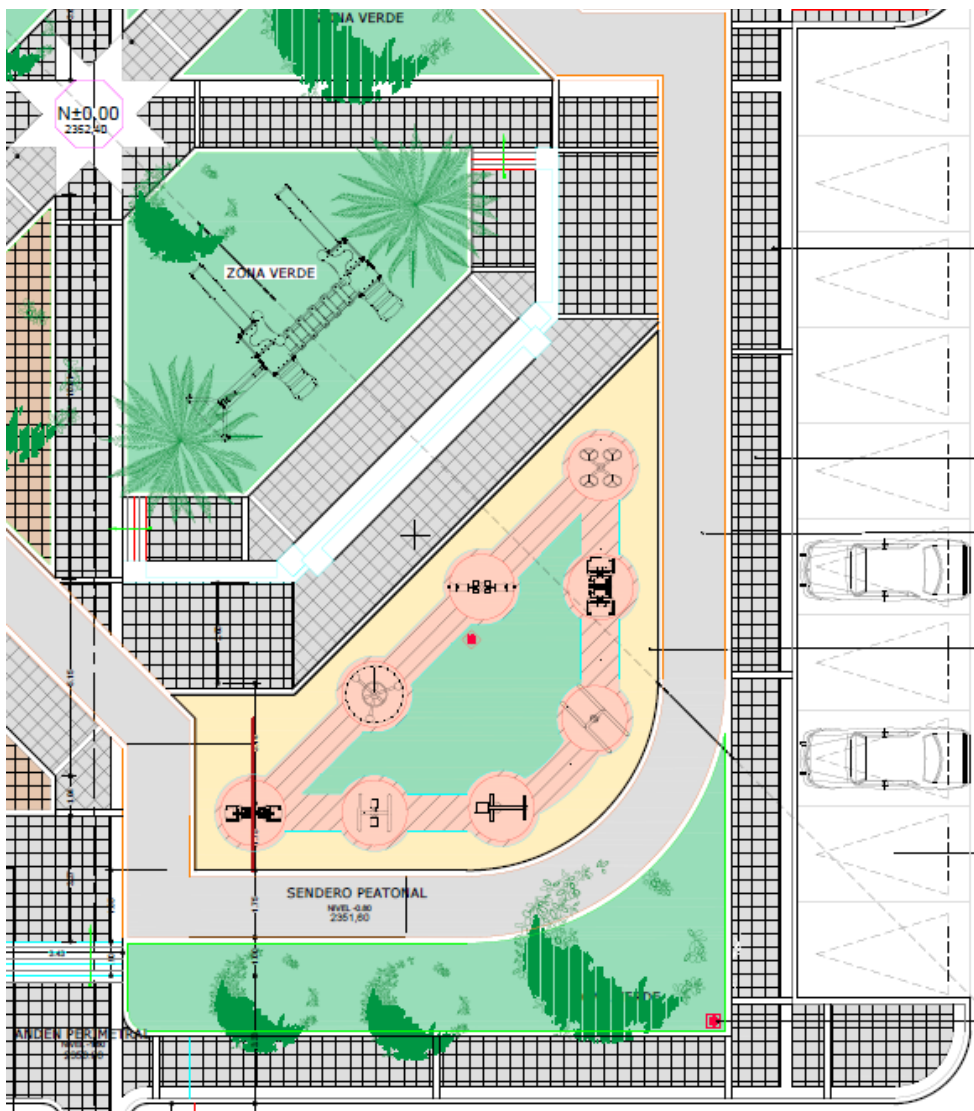

Biosaludables:

- Remo
- Prensa Horizontal
- Pectoral
- Barras
- Escalador
- Elíptica
- Twister
- Volante

* Zona para Parque Infantil

* 10 Parqueos en este sector

* Sendero Peatonal que enlaza el proyecto

* Mobiliario Urbano

Soluciones que transforman



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SEGUIMIENTO

Pág. 15 de 17

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SEGUIMIENTO

Pág. 16 de 17



Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT		
	INFORME DE SEGUIMIENTO		Pág. 17 de 17



ANDREA GOMEZ ESPINOSA.
 Supervisora del Contrato
 Contratista
 Secretaría de Infraestructura y Hábitat

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
 Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
 Página Web: www.tolima.gov.co
 Ibagué, Tolima
