

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 13
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

### FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
P1S40MP1	Nueve (9) Acueductos optimizados	Número de acueducto optimizados	Acumulada

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
3	2	9

\*: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

**Nota:** En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

**Dependencia responsable:** EDAT S.A. E.S.P OFICIAL

**Fecha del reporte:** 10/09/2025

**Periodo de reporte** SEPTIEMBRE

**Tipo de soporte:** INFORME

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	X
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? Informe	X

**Beneficiados:** (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	4
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
-----------------------------------	-----------	---------

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 2 DE 13</b>
<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>	

OTRO ¿CUÁL?	
-------------	--

**Enfoque diferencial y territorial:** (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

TERRITORIAL	URBANO	1182
	RURAL	
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVILIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

**Nota:** Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

### 1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Dado que en la Hoja de vida de los indicadores el cual es: 10% Proceso de Estructuración, y Pre-Contractual, 80% Ejecución (Desde acta de inicio hasta acta de terminación) 10% Interventoría (Desde acta de inicio hasta acta de terminación)" el acueducto de Suarez el avance físico de ejecución de cada uno de los componentes que conforman la obra, con corte a la fecha mencionada del presente informe, el cual corresponde a un 80%.

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 3 DE 13</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

2	Se instala estructura metálica que soporta la tubería de PVC 6" que conecta la salida del agua trata de la PTAP con la entrada de la misma al tanque de almacenamiento
3	Se termina de instalar los macromedidores de 4" y 3" con sus respectivos accesorios en la red de distribución con la fundida de las respectivas cajas en concreto reforzado y las tapas de fibrocemento en los sectores 1,2,3 y 4. Se tomas muestras de concreto
4	Se continua con las instalaciones eléctricas en la caseta de laboratorio
5	Se instala tanque séptico integrado de 1650 lts para realizar el tratamiento de aguas residuales de la caseta de laboratorio.
6	Se realiza la construcción de pavimento rígido para la entrada de la planta de tratamiento de agua potable
7	El proyecto REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES URBANAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 1. EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA El avance del proyecto acumulado a la fecha del presente informe según la reprogramación del adicional, el avance de obra es de 100%
8	El contratista se encuentra ejecutando 6 frentes de obra simultáneos los cuales son motivo del avance de obra
9	Se ha cumplido por parte de los contratistas la entrega oportuna de los EPPS y así mismo ha realizado las charlas para generar cultura al trabajador por el uso correcto y constante de los elementos de protección personal en cada uno de los frentes de obra
7	Luego de ser viabilizado el proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO TIPO COLGANTE SOBRE EL CAUCE DEL RIO GUALI "LÍNEA DE ADUCCIÓN MEDINA" OBRA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HONDA, TOLIMA se encuentra en proceso contractual en la etapa de legalización por parte de los contratistas.
8	Luego de ser viabilizado el proyecto MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. se encuentra en proceso contractual.

## 2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
-----------	-----------------	--------------

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 4 DE 13</b>
	<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN EJECUTOR TOLIMA.</b>		<b>VIGENTE DESDE: 28/06/2022</b>

SUAREZ	ACUEDUCTO URBANO ( Obra e interventoría	7.667.489.939.00
IBAGUE	REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES URBANAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE 1. EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	13.151.615.569,54
HONDA	CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO TIPO COLGANTE SOBRE EL CAUCE DEL RIO	1.639.137.756
	GUALI "LÍNEA DE ADUCCIÓN MEDINA" OBRA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HONDA, TOLIMA	
MARIQUITA	MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	3.688.070.354,21

- \*: solo si aplica.
- RP\*: registro presupuestal.

### 3. Evidencias

Se anexa informe contratista obra <..\..\..\Downloads\INFORME No. 17.pdf>

SUAREZ:



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA  
INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: INS-PD-  
001**

**VERSIÓN: 01**

**PROCESO**

**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL  
DESARROLLO**

**PÁG. 5 DE 13**

**FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE  
INFORMACIÓN EJECUTOR TOLIMA.**

**VIGENTE DESDE:  
28/06/2022**



Foto 1. PTAP



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA  
INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: INS-PD-  
001**

**VERSIÓN: 01**

**PROCESO**

**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL  
DESARROLLO**

**PÁG. 6 DE 13**

**FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-**


**VIGENTE DESDE:**

**EJECUTOR TOLIMA.**

**28/06/2022**



Instalación planta de tratamiento

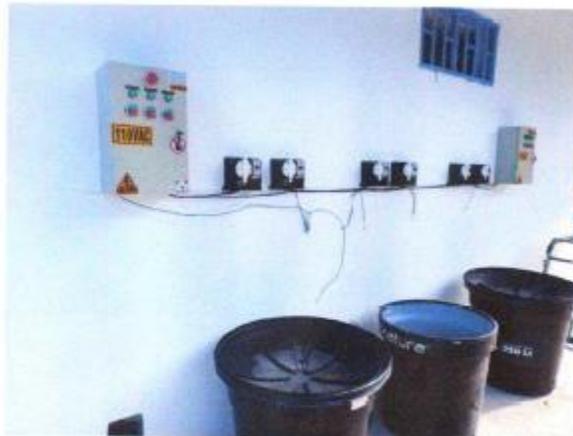

Instalación planta de tratamiento tanques dosificación químicos

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 7 DE 13</b>
<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-</b>			<b>VIGENTE DESDE:</b>

EJECUTOR TOLIMA.

28/06/2022



Elaboración via en pavimento rígido fundida placa en concreto espesor 25 cm

Planta de tratamiento



Elaboración caja macro medidores instalación macro medidor

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 8 DE 13</b>
<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-</b>			<b>VIGENTE DESDE:</b>

EJECUTOR TOLIMA.

28/06/2022



IBAGUE:

Se anexa informe contratista Interventoría [Soporte Meta P1S40MP1 Ibague.pdf](#)

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>		<b>PÁG. 9 DE 13</b>

**FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.**

**VIGENTE DESDE: 28/06/2022**



Foto. Vías terminadas

**EJECUTOR TOLIMA.**

**28/06/2022**

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 10 DE 13</b>
<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-</b>			<b>VIGENTE DESDE:</b>



**EJECUTOR TOLIMA.**

**28/06/2022**



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA  
INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: INS-PD-  
001**

**VERSIÓN: 01**

**PROCESO**

**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL  
DESARROLLO**

**PÁG. 11 DE 13**

**FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-**

**VIGENTE DESDE:**



Foto 3. Instalación Tubería

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>CÓDIGO: INS-PD-001</b>
			<b>VERSIÓN: 01</b>
	<b>PROCESO</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO</b>	<b>PÁG. 12 DE 13</b>
<b>FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-</b>			<b>VIGENTE DESDE:</b>



Foto 4. Trabajo en obra

**EJECUTOR TOLIMA.**

**28/06/2022**



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA  
INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO: INS-PD-  
001**

**VERSIÓN: 01**

**PROCESO**

**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL  
DESARROLLO**

**PÁG. 13 DE 13**

**FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-**

**VIGENTE DESDE:**



Foto 5. Pavimentación

RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO  
DIRECTOR TECNICO EDAT SA ESP OFICIAL Reportado  
por: (Carolina Villanueva Muñoz).  
Cargado por:
