


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 1 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

INFORME DE AVANCE		FECHA: 09 DE MAYO DE 2017	LUGAR: MUNICIPIO DE PLANADAS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA Y HABITAT		
PROCESO	CONVENIO 703 CON EL MUNICIPIO DE PLANADAS		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE PLANADAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO “DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONEXIÓN INTERMODAL URBANA-RURAL DEL TOLIMA		
ELABORADO POR:	INGENIERO CIVIL DIEGO FERNANDO HERRAN TRIANA		
SOLICITANTE	ING. Andres Fabián hurtado		
INFORMACION GENERAL;			
1.	VALOR DEL CONVENIO	\$ 2.703.890.000	
2.	NOMBRE DEL COOPERANTE	MUNICIPIO DE PLANADAS.	
3.	APORTE GOBERNACION	\$ 2.527.000.000	
4.	APORTE COOPERANTE	\$ 176.890.000	
5.	PAGOS RALIZADOS	90% DE LAS OBLIGACIONES (\$ 2.274.300.000)	
6.	PAGOS FALTANTES	10% POR LIQUIDACION	
7.	ADICIONES O MODIFCATORIAS	UNA MODIFICATORIA CALUSULA DE EJECUCION Y UNA ADICION EN TIEMPO	
8.	SUSPENCION	21 DE MARZO	
9.	REINICIO	08 DE MAYO	
10.	ESTADO ACTUAL	EN EJECUCION	
11.	AVANCE ESTIMADO DE EJECUCION	80%	
12.	META DE PAVIMENTACION PROYECTADA	6.183,37 M2	
13.	META DE PAVIMENTACION EJECUTADA	6.033,40 M2	
14.	META DE RED DE ALCANTARILLADO PROYECTADA	594 ML	
15.	META DE RED DE ALCANTARILLADO EJECUTADA	594 ML	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 2 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

CALLES PENDIENTES POR EJECUTAR PLACA Y SUB-BASE	156,58 M2
CALLES ACTUALMENTE PAVIMENTADAS	6.026,79 M2

1	CALLE 3 ENTRE CRAS. 5 Y 6	83,40	7,10	592,14
2	CALLE 4 ENTRE CRAS. 6 Y 7	81,51	7,10	578,72
3	CALLE 10 ENTRE AEROPISTA Y CAMPO DE FUTBOL	93,63	5,00	468,15
4	CALLE 11 ENTRE CRAS. 6 Y 7	94,00	7,10	667,40
5	CALLE 11 ENTRE CRAS. 8 Y 9	91,67	5,40	495,02
6	CALLE 11A ENTRE CRAS. 9 Y 9B	38,19	4,10	156,58
7	CALLE 12 ENTRE CRAS. 8 Y 9	103,95	7,10	738,05
8	CALLE 14 ENTRE CRAS. 6 Y 7	66,91	3,00	200,73
9	CALLE 15 ENTRE CRAS. 6 Y 7	68,00	7,10	482,80
10	CRA. 5 ENTRE CALLES 3 Y 4	77,81	7,10	552,45
11	CRA. 6 ENTRE CALLES 13 Y 15	87,77	3,40	298,42
12	CRA. 8A ENTRE CALLES 8 Y 9	83,76	4,50	376,92
13	ENTRADA PPAL. ENTRE CLLES 4 Y 4A BARRIO AVENIDA	80,00	7,20	576,00
TOTALES				6.183,37

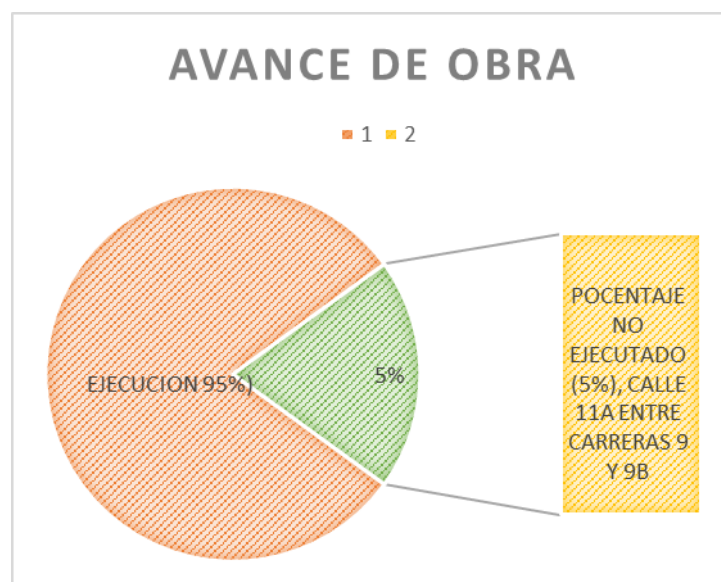

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 3 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

TIPO DE OBRA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO E:0,18. CRA 8 A ENTRE CALLES 8 Y 9	Construcción placa en pavimento rígido e: 0,18 con las dovelas según diseño.  

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 4 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

CONSTRUCCION PLACA EN CONCRETO E:0,18 EN LA CALLE 14 ENTRE 6 Y 7	Placa en concreto MR38  
PAVIMENTO RIGIDO CRA 6 ENTRE CALLES 13 Y 15	Placa en concreto MR38 

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 5 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

ESTRUCTURA
PAVIMENTO RIGIDO
CALLE 12 ENTRE
CARRERAS 8 Y 9

Extendida de la subbase granular s/diseño.



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 6 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

TIPO DE OBRA	OBSERVACIONES
REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 3 ENTRE CARRERAS 5 Y 6	
PAVIMENTO RIGIDO CALLE 3 ENTRE CARRERAS 5 Y 6	Placa en concreto MR38 

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 7 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4	Línea principal, tubería pvc alcantarillado 12". 
PAVIMENTO RIGIDO CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4	Placa en concreto MR38 

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 8 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 4 ENTRE CARRERAS 6 Y 7	Línea principal, tubería pvc alcantarillado 12". 
PAVIMENTO RIGIDO CALLE 4 ENTRE CARRERAS 6 Y 7	Placa en concreto MR38 y sumidero de aguas lluvias. 

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 9 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

REPOSICION ALCANTARILLADO ENTRADA PRINCIPAL B/AVENIDA ENTRE CALLES 4 Y 4a	Excavaciones e instalación tuberías principal de 16" y domiciliarias de 6"  
PAVIMENTO RIGIDO ENTRADA PRINCIPAL B/AVENIDA ENTRE CALLES 4 Y 4a	Corte de pavimento para las dilataciones 
PAVIMENTO RIGIDO ENTRADA PRINCIPAL B/AVENIDA ENTRE CALLES 4 Y 4a	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 10 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014

REPOSICION
ALCANTARILLADO
CALLE 11A ENTRE
CRAS. 9 Y 9B



REPOSICION
ALCANTARILLADO
CALLE 11A ENTRE
CRAS. 9 Y 9B




ING. DIEGO FERNANDO HERRAN TRIANA
Elaborado

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GD-012
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	GESTION DOCUMENTAL	Pág. 11 de 11
	INFORME DE AVANCE		Vigente desde: 04/08/2014
