


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT	
	INFORME DE SUPERVISION	Pág. 1 de 5

INFORME DE ACTIVIDADES DE SUPERVISION					
Contrato No. 1890 del 12 de Septiembre de 2018					
Fecha:	29	De	Noviembre	De	2018

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SUPERVISION

Recopilación de las actividades de supervisión desarrolladas a la ejecución de obra del contrato No. 1890 del 12 de Septiembre de 2018, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, al cual se le da ejecución en distintos sectores que componen el departamento del Tolima.

LOCALIZACIÓN	Se le está dando ejecución al contrato en dos (2) tramos de vía comprendidos en los municipios del Departamento del Tolima, correspondientes a: 1. Coyaima – Ataco – Planadas: 116 Kilómetros 2. Chaparral – Rioblanco: 54 Kilómetros
---------------------	---

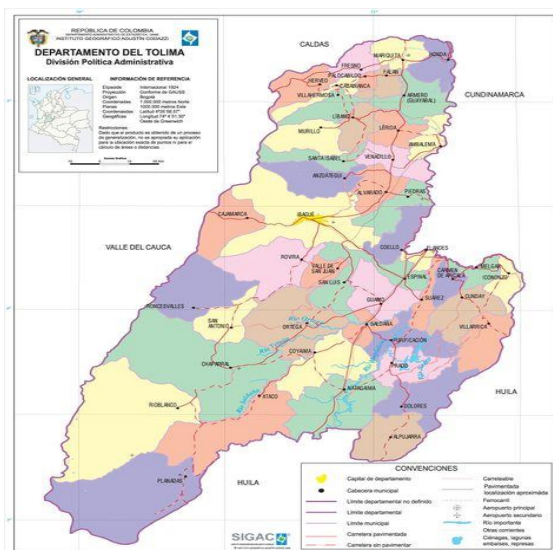

Soluciones que transforman

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT	
	INFORME DE SUPERVISION	Pág. 2 de 5

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO NÚMERO:	1890 del 12 de Septiembre de 2018		
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
SUPERVISOR:	ANDREA ESTEFANIA SUÁREZ BARRERA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS VERDES		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 664.031.266	DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	90 Días calendario
FECHA DE INICIO	27 de Septiembre de 2018		
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		
CDP	1806 del 13 de FEBRERO de 2018		
RP	7638 del 18 de Septiembre de 2018		
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de Diciembre de 2018		

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

CONTRATO	VALOR	EJECUCIÓN FÍSICA (META A EJECUTAR)			EJECUCIÓN FINANCIERA		
		PROGRAMADO EN EL CONTRATO	EJECUTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	CONTRATADO	PAGADO	%
1890 del 12 de Septiembre de 2018	\$664.031.266	170 km	153 km	90%	\$664.031.266	\$ 0	0%


Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
 Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
 Página Web: www.tolima.gov.co
 Ibagué, Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION NIT. 800 113 672 7 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT	
	INFORME DE SUPERVISION	Pág. 3 de 5

OBSERVACIONES
• Se firmó Acta de Inicio del contrato el día 27 de Septiembre de 2018. • A la fecha no se realizado ningún pago al contratista, está en revisión la primer acta con sus respectivos soportes. • Se han visitado los corredores viales Coyaima – Ataco – Planadas y Chaparral – Rioblanco por parte de la Supervisión, donde se ha logrado verificar la ejecución de actividades en cumplimiento al contrato No. 1890 de 2018, mediante trabajos de rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas, remoción de derrumbes presentados sobre estos corredores viales, recuperación de berma y también limpieza en algunos sectores con ayuda de maquinaria amarilla. • Se verificó que el contratista contara con el personal adecuado para realizar las labores en estos corredores viales, el cual cuenta con la respectiva dotación, herramienta y equipo de trabajo adecuado para la ejecución de actividades. • Hoy por hoy se han intervenido 153 kilómetros de vía, comprendidos en los corredores viales objeto de la ejecución del contrato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

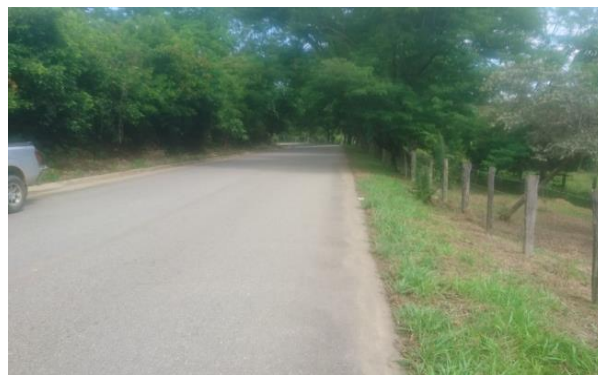

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
 Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
 Página Web: www.tolima.gov.co
 Ibagué, Tolima



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SUPERVISION

Pág. 4 de 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
NIT. 800 113 672 7
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT



INFORME DE SUPERVISION

Pág. 5 de 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Andrea Suárez.

ANDREA ESTEFANIA SUÁREZ B.
Supervisora del Contrato
Contratista
Secretaría de Infraestructura y Hábitat

Soluciones que transforman

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre Calles 10 y 11. Piso 3
Telefax: (8) 2617081-2611111 Extensión 1311
Página Web: www.tolima.gov.co
Ibagué, Tolima
