





artistas), grupos de danza de seis (6) parejas, grupos musicales de formato grande (8 a 12 artistas)

NOTA: Para el 50% de esta actividad se ha desarrollado doce (12) presentaciones en formato grande y treinta y dos (32) presentaciones en formato pequeño, a continuación, evidencia fotográfica de las presentaciones.

FORMATO GRANDE:

Estas presentaciones se llevaron a acabo en el Teatro Tolima, lugar estipulado para realizar las presentaciones de tertulias en formato grande.

1. ENSAMBLE PIJAO



2. AGRUPACION FOLCLORICA MANTE











3. MARIACHI TEQUILA



4. BANDA SINFONICA DEPARTAMENTAL



5. AGRUPACION CARTA ROCK

Coop

VIGILADO MINEDUCACIÓN

DAR









6. MARIACHI GUADALAJARA



7. TABU DANCE



8. TROPIBANDA











9. UNIVERSIDAD DEL TOLIMA DANZA



10. UNIVERSIDAD DEL TOLIMA MUSICA



11. ZIGUARAYA











12. CANDIDATAS DEPARTAMENTAL SAN PEDRO EN EL ESPINAL



FORMATO PEQUEÑO

Estas presentaciones se realizan en diferentes lugares como: Centros comerciales parques y lugares externos de la ciudad de Ibagué.

HECTOR GOMEZ

ON









2. JEAN CARLOS MAYOR CAMACHO



3. NHAREM GIOVANNY CEBALLOS GONGORA Y DANIIA FERNANDA SALCEDO MARTINEZ



4. WILLIE GARES

arl.









5. HAYBER MENESES Y LAURA QUIROGA



6. MARIACHI SHOW MONTERREY



7. WILLIE GARCES

Cel

But









8. SENTIMIENTO QUE SE BAILA



9. PAPAYERA LA GUERRERA



10. FABIAN AMPUDIA



Pro Con







11. TIMBAL Y SABOR



12. PAPAYERA ZIGUARAYA



13. FABIAN AMPUDIA



14. BAILA MI GENTE

and









15. BANDA DEL MOHAN



16. HECTOR GOMEZ



17. ROMPIENDO ESQUEMAS











18. MARIACHI HERNANDEZ



19. FUNDACION IBAMACA



20. MATICES DE MI TIERRA











21. RICHARD LEON



22. HUGO TRUJILLO



23. LAURA MARCELA RODRIGUEZ











24. EYLEEN GONZALEZ QUEVEDO



25. LIGIA ESTER GILON QUIJANO



26. RAFAEL GONZALEZ













27. TAMA



28. SONART



29. JUAN ZAPATA














30. LA REVOLUCION DEL VALLENATO



31. SANTIAGO REYES



32. HECTOR GOMEZ











OBLIGACION 6: Apoyar la adecuación y dotación para la puesta en marcha de emisora de radio del conservatorio del Tolima para el fortalecimiento de los procesos interpretativos de los estudiantes de los programas de la facultad de educación y artes.

Se ejecuta al 100% la presente obligación que pertenece al 30% del presente informe:

Durante el desarrollo y ejecución de física de la obra dentro del proceso de unión de esfuerzos para la implantación de las emisoras universitarias y por ende de interés público, se han ido ejecutando y cerrando los diversos Capítulos con sus respectivas Actividades, en cumplimiento al encuadre genera del fortalecimiento de los procesos de extensión, proyección social, formación y dotación instrumental en el marco de las actividades culturales del departamento del Tolima.

Para tal cometido, se realizaron las siguientes Actividades:

ITEM II: CARPINTERÍA METÁLICA:

Básicamente se denomina al Taller, al Oficio y el Producto elaborado del Carpintero que emplea metales de todo tipo para la fabricación de todo lo que tiene que ver con trabajos de puertas y ventanas, para nuestro caso propio de aluminio y que se encuentra muy ligada con la implementación de vidrios traslucidos y de seguridad por laminación, que ofrece bastantes grados de insonoridad, aptos e idóneos para la formación académica musical de los estudiantes del Conservatorio de Música del Tolima.

Para éste Capítulo, se ejecutaron las siguientes Actividades:

Suministro e instalación de ventana tipo V-1; con marquetería en Aluminio color café anolok y vidrio laminado insonorizado 5+5 m.m. + película de polivinilo 3,00 micras. Dimensión: 1,92 x 1,27 mts. Ref.: T-8 de 1,5"x1,5"; c/accesorios y empaques.	7 UND.	\$ 4.296.99 6 ,0	\$ 4.296.996,0
--	--------	----------------------------	-------------------

Esta ventana, se encuentra localizada en el área de Locución, costado Oriental. (en ejecución)













Suministro e instalación de ventana tipo V-2; con marquetería en Aluminio color café anolok y vidrio laminado insonorizado 5+5 m.m. película de polivinilo 3,00 micras. Dimensión: 2,40 x 1,27 mts. Ref.: T 37 de 1,5"x1,5"; c/accesorios y empaques.		\$ 5.371.212.0	\$ 5.371.212,0
--	--	-------------------	-------------------

Esta ventana, se encuentra localizada en el área de Locución, costado Sur. (en ejecución)



Suministro e instalación de ventana tipo V-3; con marquetería en 2,03 Aluminio color café anolok y vidrio laminado insonorizado 5+5 m.m. + película de polivinilo 3,00 micras. Dimensión: 1,50 x 0,48	ml	1,50	\$ 1.268.784,0	\$ 1.903.176,0
---	----	------	-------------------	-------------------









Suministro e instalación de puerta/ventana tipo PV-2; con marquetería en Aluminio y vidrio de seguridad laminado 5+5 m.m.	UND.	1,00	\$ 8.276.40	00,0	\$ 8.276.400,0
Ref.: T-87 de 1,5" x 1,5"con película en polivinilo de 3.00 micras y					


mts. Ref.: T-87 de 1,5"x1,5"; c/accesorios y empaques.

Esta ventana, se encuentra localizada en el área del Rack.



Puertas localizadas en el ingreso al área del Máster, Locución y salida a terraza costado sur. (en ejecución)















tubular de 3"x1,5" con pisa/vidrios y sus accesorios y chapa de seguridad. Dimensión 1,54 x 2,35 mts.

Suministro e instalación de puerta tipo P-1; con marquetería en Aluminio y vidrio de seguridad laminado 5+5 m.m. con película en polivinilo de 3.00 micras y tubular de 3"x1,5" con pisa/vidrios y sus accesorios y chapa de seguridad. Dimensión: 0,99 x 2,27 mts.

UND. 3,00 4.004.748,0

12.014.244,0

Puerta ubicada en el pasillo ingreso a cabinas de locución, máster y rack. ()



ITEM VIII: PISOS:

Se refiere a la superficie inferior horizontal de los espacios arquitectónicos de la emisora radial, específicamente en la cabina de Locución.











Para éste Capítulo, se ejecutaron las siguientes Actividades:

8,01	Suministro e instalación alfombra tráfico pesado; cabina locución.	m2	16,51	\$ 275.22	0,0	\$ 4.543.882,2
------	--	----	-------	--------------	-----	-------------------

Es un tapete o alfombra de tipo argollado con presentación modular de 1.00 x 0.25 mts. De trático comercial, localizado en la cabina de Locución. (En ejecución)



	Entoblada e/toblesso MADO	Τ.		Ś	-	Tś
8,02	Entablado c/tableros MDP y manto acústico, base para alfombra	m2	16,51	196.02	0,0	3.236.290,2

Localizado en la cabina de Locución. (en ejecución)



ITEM IX: CARPINTERÍA DE MADERA;

Se llama Carpintería de Madera en líneas generales al taller donde se trabaja la madera y otros materiales derivados, donde se recibe un proceso completo de industrialización y funcionalidad.











Suministro e instalación de ventana tipo V-4 (Mampara); con doble marquetería en madera Flor morado o similar y doble vidrio laminado insonorizado 10+10 m.m. Dimensión: 2,40 x 1,20 mts.

Esta Actividad se refiere, a la división insonora que sucede entre la cabina del Máster y cabina de locución, pero su comunicación es totalmente visual a través de doble vidrio laminado.(En ejecución)



						-	-		
1		Suministro e instalación de puerta/ventana corrediza tipo PV-3; con			,	П		ć	
	9,02	marquetería en madera y vidrio de seguridad laminado 5+5 m.m.	UND.	1.00	2 8 989 2		, ,	⇒ 8.989.200.0	
	3,02	Dimensión: 1,70 x 2,26 mts.		1,00	0.505.2		,	0.303.200,0	

Este elemento es la puerta que da acceso principal a la emisora radial. (en ejecución)













Suministro e instalación semi-pórtico en madera tipo Abarco; 9,03 sección 2"x4": dimensión 1,3 + 2,3 mts. /und. UND. 4,00 \$ 1.621.224,0 6.484.896,0

Elemento de diseño, que hace la transición entre el paso del área de Comunicaciones al área específica de la emisora radial. (En ejecución)



O.R







	Suministro e instalación viguetas en madera tipo abarco; sección 2"x4": dimensión 1,15 mts.	UND.	8,00	\$ 811.800	0,0	\$ 6.494.400,0
--	---	------	------	---------------	-----	-------------------

Elemento de diseño, que da continuidad en la transición espacial entre el área de Comunicaciones al área específico de la emisora radial. (En ejecución)



ITEM XII: INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES:

Es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a la Central de Radio del Conservatorio Musical del Tolima. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos correspondientes.

Actividades 12.01 a 12.15: CONEXIONES ELECTRICAS.

ACTIVIO	dades 12.01 a 12.15. CONEXIONES ELECTRICAS.				1
12,01	Toma corriente doble consola Máster 2000 V.	UND.	2,00	\$ 363.000,0	\$ 726.000,0
	Salida tomas monofásicas doble c/polo a tierra para red normal, incluye curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios.	UND.	22,00	\$ 231.000,0	\$ 5.082.000,0
12,03	Salida iluminación; incluye curvas y accesorios.	UND.	47,00	\$ 237.600,0	\$ 11.167.200,0
12,04	Punto salida T.V.	UND.	4,00	\$ 198.000,0	\$ 792.000,0
L					











					8, 8,
12,05	Salida para toma GFCI, incluye toma GFCI, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios.	UND	3,00	\$ 287.760,0	\$ 863.280,0
12,06	Punto tomas dobles interperie	UND.	2,00	\$ 237.600,0	\$ 475.200,0
12,07	Desmonte tablero automático existente.	UND.	1,00	\$ 198.000,0	\$ 198.000,0
12,08	Tablero bifásico NTQ-408; 4 circuitos c/puerta, chapa y llave, espacio para totalizador. Incluye breakers enchufables 1x20 A.	UND.	1,00	\$ 217.800,0	\$ 217.800,0
12,09	Tablero bifásico NTQ-408; 12 circuitos c/puerta, chapa y llave, espacio para totalizador. Incluye breakers enchufables 1x20 A.	UND.	2,00	\$ 990.000,0	\$ 1.980.000,0
12,10	Acometida en B.T. desde TGA hasta tablero en 1x8+No.8, AWG. THHNN.	ml	25,00	\$ 47.520,0	\$ 1.188.000,0
L 2,11	Acometida en B.T. desde TGA hasta tablero en 3x8+No.8, AWG. THHNN.	ml	45,00	\$ 76.560,0	\$ 3.445.200,0
.2,12	Salida toma bifásica para aires acondicionados.	UND.	2,00	\$ 316.800, 0	\$ 633.600,0
	Suministro e instalación equipo de aire acondicionado marca Samsung Wind Free Premium con WIFI; una (01) unidad de Cap. 12.000 BTU. Tecnología Inverter bajo consumo de energía. Cabina Máster.	UND.	1,00	\$ 5.544.00 0 ,0	\$ 5.544.000,0
2,14	Suministro e instalación equipo de aire acondicionado marca Samsung Wind Free Premium con WIFI; una (01) unidad de Cap. 24.000 BTU. Tecnología Inverter bajo consumo de energía. Cabina Locución.	UND.	1,00	\$ 8.316.00 0, 0	\$ 8.316.000,0
2,15	Punto salida internet (PSI).	UND.	15,00	\$ 198.000,0	\$ 2.970.000,0

Actividades 12.16 a 12.17

RED FIBRA ÓPTICA			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			
Suministro e instalación puntos de fibra óptica. Incluye swicht HP de 24 puertos, bandeja de 12 puertos	UND.	2,00	\$ 10.824.000,0	\$ 21.648.000,0	\$ 27.456.000),0











			TOTAL F	RED VOZ Y DATOS	\$	81.752.88
Programación swicht para recepción le fibra y red en UTP	UND.	2,00	\$ 490.380,0	\$ 980.760,0		
Configuración de Rack de datos	UND.	2,00	\$ 623.700,0	\$ 1.247.400,0	\$	2.228.16
CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN			***************************************			
Suministro e instalación red de datos cable UTP CAT ISZH 24 AWG en canaleta plástica lisa 100x45 cms, canaleta metálica 100x40 cms y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	ml	1.220,00	\$ 21.912,0	\$ 26.732.640,0	\$	52.068.77
Suministro e instalación puntos red de datos. Incluye gabinete de pared desmontable, herrajes, organizador horizontal y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	UND.	42,00	\$ 603.240,0	\$ 25.336.080,0		
RED DE DATOS						
Suministro e instalación red fibra óptica 12 hilos ml 50/125 en tubo conduit MT de 1"Ø y todos los accesorios para su buen funcionamiento.	ml	80,00	\$ 72.600,0	\$ 5.808.000,0		2 1 3
multimodo y todos los accesorios para su buen funcionamiento.						

onl












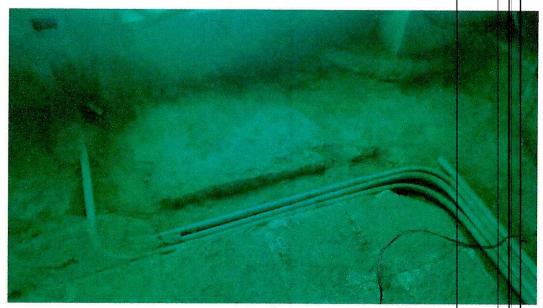






























Cook
























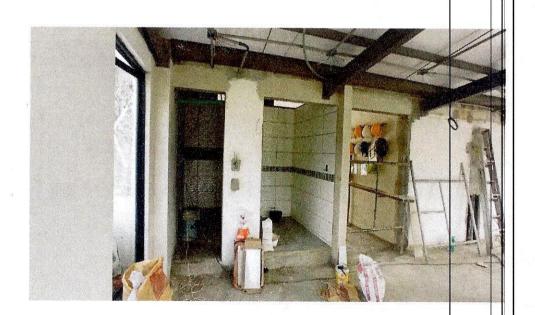

ITEM XV: MAMPOSTERÍA:











Se llama Mampostería al sistema tradicional de construcción de erigir muros mediante a colocación manual de los elementos o los materiales que los componen, denominados mampuestos o puestos con la mano como ladrillos, bloques de cerámica, de cemento, etc.

Para éste Capítulo, se ejecutaron las siguientes Actividades:

	Suministro e instalación muro Superboard doble cara; e=0,12 mts.	П	\$	T	\$
15,01	Área Servicios y bolsa de puerta ingreso.	m2	27,69 247.50	00	6.853.275,0

Esta actividad se refiere al muro de superboard paralelo al muro de ladrillo del tanque de agua potable, cuya función es la de guardar y proteger la puerta de madera de ingreso a la emisora radial. (En ejecución)





La función de esta actividad, además de estética, es la de reforzar la insonorización en las cabinas del Máster y Locución. (En ejecución)

Suministro e instalación tablero MPD-Melanina Jerez RH 15 m.n	n.	\$	4,0	\$
15,02 2,15 x 2,44 mts.	m2	9,7 2 335.54		3.261.487,7

Con









	VALOR TOTA				VR.	CAPÍTULO	10	.322.776,2
15,03	Bloque cerámico No.: 5 cubrir vano ventana máster (En ejecución)	m2	2,47	\$ 84.216,0	\$ 208.01	.3,5		

Car

Organ








A continuación se anexan evidencias finales:



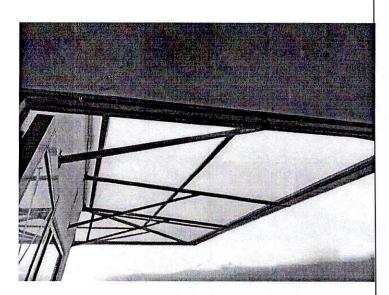


and and









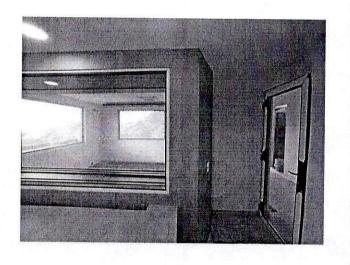



Ro









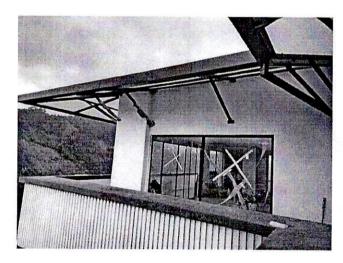













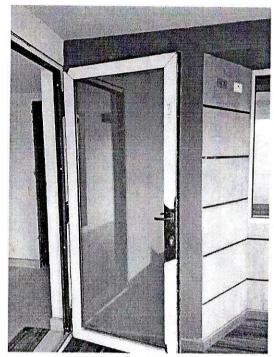

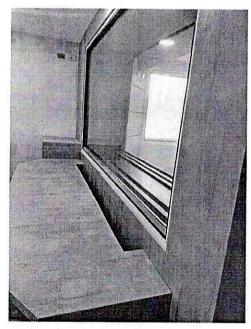


g.


all







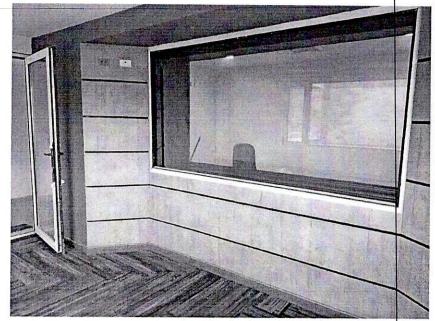

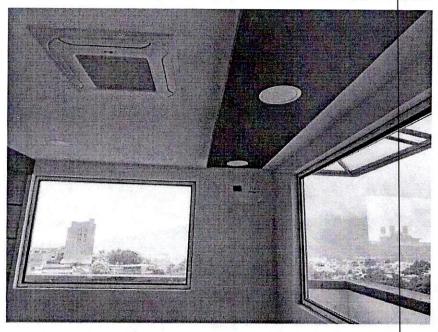

col

all







OBLIGACION 7: Apoyar los procesos de formación de alto impacto del Conservatorio de Tolima.

La presente obligación se cumple al 100% y hace parte del 30% del tercer pago el presente informe:

Descripción: Garantizar el apoyo (cofinanciación) para la formación de artistas priorizados por su nivel de vulnerabilidad que quieran adelantar procesos de profesionalización artística, de educación post gradual o de formación complementaria especializada, los cuales aporten al incremento de la dalidad de los productos culturales del departamento con la réplica de saberes.

El programa de Especialización en Educación Musical, contó con un costo de matrícula equivalente a 6 (seis) SMMLV (Salarios mínimos mensuales legales vigentes) lo que equivale al salario del año 2021 a \$5.451.156 (cinco millones cuatrocientos cincuenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos). Los recursos asignados para los apoyos financieros de dos estudiantes del programa de posgrado Especialización en Educación Musical fue de: Diez millones de pesos M/CTE. (\$10.000.000). Los beneficiarios de los apoyos financieros de posgrado Especialización en Educación Musical:

- 1. QUIMBAYO CAÑON DANIEL ALEJANDRO identificado con documento de identidad C.C. No. 1.234.641.597 de Ibagué quien obtuvo un promedio ponderado acumulado de cuatro punto tres (4.3) en el programa de Maestro en Música del Conservatorio del Tolima. Termina su proceso académico en el Periodo Académico 2021-2.
- 2. VELEZ ARISTIZABAL JUAN DAVID, identificado con documento de identidad C.C. 1109300942 de Fresno (Tolima), obtuvo un promedio ponderado acumulado de cuatro punto siete (4.7) en el programa de Maestro en Música del Conservatorio del Tolima. El Estudiante inició su proceso academico en el Periodo Académico 2021-2.

Las asignaciones de los Apoyos Financieros constituyeron el costo total de matrícula, teniendo en cuenta la concepción del Aprendizaje a lo Largo de la Vida (ALV) emitida por la UNESCO que "pretende potenciar el desarrollo de las personas hacia el ejercicio pleno de todas sus potencialidades, brindándoles las oportunidades de acceso al conocimiento en cualquier etapa de su vida."

Además, fueron tenidos en cuenta aspectos de acuerdo al nivel y compromiso academico de los seleccionados, tales como:

- Haber obtenido el promedio acumulado de carrera más alto en la ceremonia de Grado inmediatamente anterior al inicio del primer semestre académico a cursar
- Haber obtenido el promedio acumulado más alto de su promoción.
- Haber culminado sus estudios de pregrado en el tiempo establecido por el programa.
- No haber sido sancionado académica y/o disciplinariamente.
- No haber incursionado en periodos de prueba.











Pertenecer a 1, 2 ó 3 nivel de estrato socio-económico.

Dicho informe se expide el día 22 de noviembre de 2021

James enrique fernández córpoba

RECTOR

CONSERVATORIO DEL TOLIMA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA REPRESENTANTE LEGAL

Ord







Ibagué, Noviembre 22 de 2021

CUENTA DE COBRO N 008

GOBERNACION DEL TOLIMA NIT 800.113.672-7

DEBE A

CONSERVATORIO DEL TOLIMA NIT 890.700.906-0

La suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$451.500.000), según el Convenio Numero 0936 de 2021; celebrado entre la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA y el CONSERVATORIO DEL TOLIMA cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL Y EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE EXTENCIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". Como Tercer desembolso correspondiente al 30% previo cumplimiento del 50% actividad 1, cumplimiento del 100% de la actividad 6, actividad 7, Todo lo anterior según cronograma de actividades, según clausula 6 de la minuta del convenio interadministrativo.

James enrique fernández Pordoba RECTOR

ROSEMBÉRG CARDONA GARZÓN TESOPERO

Proyectó: AHOM



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DEL AÑO 2002

Yo JOHN HERLEY GUTIERREZ MONTOYA; identificado con cedula de número 93.375.371 expedida en la ciudad de Ibagué Tolima, en mi calidad de CONTADOR PUBLICO, del CONSERVATORIO DE TOLIMA identificado con 890.700.906-0, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la institución ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y con los aportes para fiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato laboral, por lo que declaro que se encuentra a PAZ y SALVO con la empresas promotoras de salud –EPS-, Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgos profesionales –ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

La presente certificación se firma en la ciudad de Ibagué a los veintiún (21) das del mes de Octubre del año 2021.

JOHN HERLEY GUTTERREZ M. Contador Público Titulado T.P. 95517 – T James Enrique Fernandez corboba Representante Legal
